


อภินันทนาการ
จากท่าร
พุธศกราช ๒๔๘๑



NATIONAL LIBRARY

313
670
5461

NATIONAL LIBRARY OF THAILAND



31111004529598

รายการสร้างโรงงานทำกระดาษกาญจนบุรี (สังเขป)

เครื่องจักร

ชนิด ได้เลือกซื้อเครื่องจักรทำเยื่อวิช “ชัลเฟท” (การทำเยื่อทำได้หลายวิช) ทั้งรวมการเลือกวิชน โดยจดประสงค์ให้ญี่ปุ่นอย่างดี
๑. เป็นวิชาที่เข้าทำสำเร็จและได้ผลดีมาแล้วหลายแห่ง เช่น อินเดีย
๒. เป็นวิชาใช้วัสดุดีบซึ่งมีและหาได้ในประเทศไทย อาทิ เช่น ไม้ไผ่,
แป้ง, คากา, กลู, ปูนขาว, ตินขาว, ยางสน, แบ็ง, ราม ฯลฯ
เป็นต้น

สัญญา ได้ทำการซื้อขายกัน ระหว่างบริษัทกระดาษสยามจำกัด กับ
บริษัท เจ. เอม. ฟอยท์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
คือห้างบี. กวิมแอนโกล เซ็นสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๗๔ และผู้ซื้อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐบาล ฯ มอบ
ให้กระทรวงคลาให้ดำเนินการ ได้ทำสัญญาแปลงหนี้ และโอน
สิทธิ์เรียกร้อง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๔

โดยความรับผิดชอบของฟอยท์ตามสัญญา ฟอยท์ได้จัดส่ง
เครื่องจักรของลีบีริชท์มา คือ

เครื่องทำเยื่อ ทำกระดาษ เป็นของบริษัทฟอยท์
เครื่องทำไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องทำโคลริน เป็น
ของบริษัทเม็นล์ชุดเกต

หม้อน้ำและเครื่องประภากอบ เป็นของบริษัทไบร์ลิก

เครื่องทำโซดาแกลลอนเป็นของบริษัท แอกเกินลัน เอ็นซีบเนอร์

ราคาน้ำเส้น ราคาเครื่องจักรเมืองเซ็นล์ปูญาซูล 98.195 ปอนด์ คิดเป็น
เงินสปายน 1,070,325.50 บาท (เทียบราคแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์
= 10.90 บาท) ราคาน้ำเส้นรวมภาษี รวมทั้ง
การติดตั้ง และม่านยช่างควบคุม การทำเยื่อ—ทำกระดาษ—และแนะ
นำ ๒ นาย อุปกรณ์ ๖ เดือน นับแต่วันติดตั้งเสร็จ

โดยคำแนะนำของฟอยท์ให้ตัดเครื่องจักรบางชนิดออก คิดเป็น
ราคาน้ำเส้น 608 ปอนด์ ๑๗ ชิลลิง ๙ เพนน์ เพรำะนั้นราคาน้ำเส้น
จะเป็น 97,586 ปอนด์ ๒ ชิลลิง ๓ เพนน์ หรือ 1,063,688.63 บาท
(๑ ปอนด์ = 10.90 บาท)

จ่ายเงิน งวดแรกจ่ายเมืองเซ็นล์ปูญา ๒๕ %. ของราคารวม
(98,195 ปอนด์)

$$= \underline{\underline{24,548 \text{ ปอนด์ } 15 \text{ ชิลลิง}}} = 267,424.68 \text{ บาท}$$

งวดที่ ๒ จ่ายตามคราวที่สองมาถึงน้าน้ำสปายน ๒๕ %. ของ
ราคารวม แต่เพรำะได้ตัดเครื่องจักรบางส่วนออกตามคำแนะนำของ
ฟอยท์ซึ่งบอกมาภายหลัง ฉบับนี้การจ่ายเงินงวดที่ ๒ จึงเป็นดังนี้

จ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ราคา 8,099-05-00 ปอนด์

	= 88,230.13	บาท
” ” ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๔ ” 8,009-11-06	ปอนด์	
	= 87,253.24	บาท
” ” ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ” 3,514-16-07	ปอนด์	
	= 38,289.20	บาท
” ” ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ” 4,620-13-01	ปอนด์	
	= 50,335.64	บาท
รวม 24,244-06-02	<u>ปอนด์</u>	= <u>264,108.21</u> บาท

งวดที่ ๓ จ่ายตามราคาวัสดุแลกเงินหลังจากของมาถึงแล้ว
๑๙ เดือน ๔๐ %. ของราคารวมหักด้วยราคากิจกรรมออกเดิน คือ

ตัวครบที่จ่ายวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๐ ราคา 12,958-16-00 ปอนด์

	= 141,368.73	บาท
” ” ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ” 12,815-06-05	ปอนด์	
	= 139,803.50	บาท
” ” ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ ” 5,623-14-06	ปอนด์	
	รวม 61,350	บาท
” ” ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ ” 7,636-12-00	ปอนด์	
	รวม 85,744	บาท
รวม 39,034-08-11	<u>ปอนด์</u>	<u>รวม 428,745</u> บาท

จำนวนที่ ๔ จ่ายตามราคากัวแลกเงินหลังจากจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว	
๓๐ เดือน ๑๐ %. ของราคารวมหักด้วยราคากัวที่ตัดออกแล้ว คือ	
ตัวครบจ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๙๗ ราคา 3,239-14-00 ปอนด์	รา 36,376 บาท
„ „ ๑๐ มีนาคม ๒๕๙๗ „ 3,203-16-07 ปอนด์	รา 35,973 บาท
„ „ ๖ เมษายน ๒๕๙๗ „ 1,405-18-07 ปอนด์	รา 15,786 บาท
„ „ ๒๗ เมษายน ๒๕๙๗ „ 1,909-03-00 ปอนด์	รา 21,436 บาท
รวม 9,758-12-02 ปอนด์ รา 109,571 บาท	

รวมเป็นราคากล่องจักร 97,586 ปอนด์ ๒ ชิ้น ลิ๊ง ๓ เพ็นนี
หรือในรา 1,069,370 บาท

ค่าประกัน ค่าค้ำประกันตัวแลกเงินต่อธนาคารสยามกัมมาจล จำกัด
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๔.๖๓ บาท

ติดตั้ง ใน การติดตั้งเครื่องจักร บริษัท เจ. เอม. ฟอยท์ ไಡส์
ช่างมากยูโรป ๓ คน คือ นายอีเบอร์ฮาร์ท ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๙๐ นายเวลล์ ออยเลอร์ กับนายพัม โรล์ เก ถึงกรุงเทพฯ เมื่อ

พฤษจิกายน ๒๕๘๐ ทั้ง ๓ นายผู้ทำการติดตั้งเครื่องจักร โรงทำเยื่อ,
โรงทำกระดาษ, โรงบดไม้ไผ่, โรงกรองน้ำ และโรงทำโซดากลับคืน

บริษัทชีเมนล์ชุคเกิตส์งนายช่างมากยกไป ๒ นาย คือ นาย
มาเลอร์ ถึงกรุงเทพฯ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๘๐ นายบูมัน ถึงกรุงเทพฯ
เมื่อ กันยายน ๒๕๘๐ นายช่างทั้ง ๒ นี้ ทำการติดตั้งเครื่องจักรใน
โรงทำโคลรินและคิดลายไฟฟ้าตามโรงต่างๆ กับส่วนนายเบอร์กاد
(ทราบว่าเดินทางมากจากประเทศจีน) ถึงกรุงเทพฯ เมื่อ มีนาคม ๒๕๘๐
เป็นนายช่างติดตั้งเครื่องกังหันไอน้ำ

บริษัทบอร์ลิก ส์งนายลิปซ์(ทราบว่าเดินทางมากจากประเทศตุรกี)
ถึงกรุงเทพฯ เมื่อกันยายน ๒๕๘๐ นายช่างผู้ทำการติดตั้งเครื่อง
หม้อน้ำในโรงทำไฟฟ้า

นอกจากนี้มีนายช่างในกรุงเทพฯ อีก ๒ นาย คือ นาย
ลัคไนเออร์, หลวงปู่พิพารณ์ (ข้าราชการเบย์บ้านญี่ปุ่น)
เป็นผู้ช่วย
นายช่างผู้ทำเยื่อและทำกระดาษบริษัทยังไม่จัดส่งมา

ก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างที่ทำสัญญา

การตรวจสอบจะนัดเดือน, ของแบบและค่าบุญรับผิดชอบการก่อสร้าง ได้แก่บริษัทคริสตี้นีลและนิตชัน(สยาม)จำกัด จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท แยกเป็นราคาก่อสร้างตามด้านล่างนี้ อีกแบบ ๑๗,๐๐๐ บาท ค่า ควบคุมการก่อสร้าง ๔,๐๐๐ บาท แต่รายได้บริษัทคริสตี้นีลรับ ประมาณลักษณะก่อสร้าง ได้ ๔ ห้องค่าควบคุมรายนั้นออก ประมาณบริษัท คริสตี้นีล คงได้ค่าควบคุมเพียง ๓,๕๐๐ บาท นอกนั้นโอนไปเบี้ยน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่กรมยทธโยธาท์หารบกเบ่นผู้ควบคุม

สัญญาทำกันเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๘

ขึ้นนี้ การควบคุมการก่อสร้างในงานนี้ รู้มั่นตร่าว่าการ กระทำการใดๆ ให้ตั้งกรรมการชนคนละหนึ่งคน ให้มีหน้าที่ พิจารณาราคาประมาณก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่าง ควรตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของบริษัทคริสตี้นีล และเจ้าหน้าที่กรมยทธโยธา ทั้งหมดก็จะน่นหนัก

การสร้างที่ก่อสร้าง บริษัทคริสตี้นีล ประมาณได้ ในราค สำหรับ ๔๙,๕๐๐ บาท สัญญาทำเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๘ การสร้างที่ก่อไฟฟ้า, ตึกบดไม่ไฟ, ตึกทำโคลริน, ตึกทำโซดา กลับคัน, ตึกกรองน้ำ, ถังน้ำขุ่น, ถังน้ำใส, ถังน้ำสูง บริษัทยุนิเวอร์ แซลติสต์รานาเคนซ์ รวมกับนายคันบังหยินประมาณได้ในราคานี้ ๓๕,๓๐๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๙

การสร้างห้องเยื่อ, ปล่องไฟ กับถังเก็บตะกอน บริษัทคริส
เตียนฯ ประมาณได้ในราคาน่าวาย ๑๓๐,๔๘๗.๗๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๙

การสร้างโรงสูบน้ำขันจากแม่น้ำ นายอิน ยีห้ออินกีประมาณได้
ในราคาน่าวาย ๔,๐๔๖.๓๔ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

การซั่งทำปล่องระบายอากาศ บริษัทคริสเตียนฯ รับซั่งทำใน
ราคากำกັດ ๑,๗๔๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ค่าสร้างถังเหล็ก ๑ ใบ นายยง อุซินกีเชียงโว กี ประมาณได้ใน
ราคากำกັດ ๓,๔๕๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ค่าสร้างคลังเก็บกระดาษทรายชนบุรี นายชุ่นยัน ลูกุล ยีห้อ
เอ็งยอง ประมาณได้ในราคากำกັດ ๔,๙๐๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ค่าสร้างวังคอกนกรต ๔ ใบ บริษัทคริสเตียนฯ ประมาณได้ในราค
ากำกັດ ๑,๓๔๓ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ค่าสร้างร่างท่อคอนกรีต นายอิน ยีห้ออินกี ประเมูลได้ในราคาร
จำนวน ๗,๐๓๓ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าสร้างถังเก็บน้ำ นายอิน ยีห้ออินกี ประเมูลได้ในราคาร
จำนวน ๑,๖๖๗ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าสร้างสะพานลาด เพื่อนำพื้นที่ให้เตาของโรงไฟฟ้า นายอิน
ยีห้ออินกี ประเมูลได้ในราคาร ๗๘๓ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าสร้างถังเหล็ก ๕ ถัง นายหลิจัน อุยอบไหหัว ประเมูลได้
ในราคาร ๗,๖๖๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าย้ายและสร้าง盛米สู (โรงคั่รวงข้าวเกราทรับซื้อไว้ ได้ย้าย^{ชื่อ}
และปลูกสร้างดัดแปลงเบื้องหลังมิสู) นายเตงคิวเซ็ง ยห้อเตงย่งยัวด
ประเมูลได้ในราคาร ๑,๗๔๕ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าสร้างท่อระบายน้ำ นายอิน ยีห้ออินกี ประเมูลได้ในราคร
จำนวน ๒๖๐ บาท

ลัญญาทำเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๘๐

ค่าสร้างชานยกพื้นในโรงบดไม่ไฟ บริษัทญี่เวอร์เนลฯ และ
นายคันบังหิน รับทำตามราคาน่าวายในวงเงินไม่เกิน ๔๐๐ บาท
ตามหนังสือของแผนกทำกราดชาชี ๒๐๘๖/๘๐ ลง ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๗๐

รวม - ๔๑,๒๕๕.๐๕ บาท = ณ

ค่าก่อสร้างที่มีอยู่ให้กรมยุทธ ไปหาทหารบกสร้างให้

ค่าสร้างโรงเก็บวัตถุคิบ ๑ หลัง	ราคา ๑๐,๓๒๕.๖๓ บาท
คารอและสร้างสถานที่สำรวจ (ขอแล้วสร้างให้ใหม่ เพราะ อยู่ในพื้นที่โรงงาน) ๑ หลัง	" ๔,๐๐๐.๐๐ "
ค่าสร้างทางลาด ๑ แห่ง	" ๔,๘๔๗.๕๑ "
ค่าสร้างบ้าน (ชันนายพัน) ๒ หลัง	" ๑๙,๘๔๔.๕๓ "
กับ	
(ชันนายร้อย) ๓ หลัง	" ๑๙,๖๔๑.๘๓ "
ค่าสร้างห้องแควรสำหรับพนักงาน	
๒ ແຕ	" ๑๙,๖๔๑.๘๓ "
ค่าสร้างห้องแควรสำหรับคนงาน ๑ ແຕ	" ๖,๗๕๐.๐๐ "
ค่าสร้างคลังพักราดชาชีบ้านโบ่ง	
๑ หลัง	" ๔,๖๔๕.๐๐ "

ค่าสร้างสะพานไม้ข้ามทางลาด

ค่าสะพาน ราคากล่องละ ๑,๖๔๙.๘๖ บาท

ค่าสร้างลานทิวังไม้ไผ่ ๑ แห่ง	ราคากล่องละ ๑,๗๔๕.๖๓
ค่าดัดแปลงที่ทำการ	๑,๐๕๙.๗๓
ค่าสร้างล้อม ๑๙ ที่	๑,๓๖๙.๐๗
ค่าสร้างโรงเก็บรายน้ำ ๑ หลัง	๒,๒๙๙.๔๔
ค่าสร้างที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ แห่ง	๕๐๐.๐๐
ค่าสร้างช่องระบายน้ำลดอุตสาหกรรม ๑ แห่ง	๑,๙๐๐.๐๐
ค่าสร้างรั้วลวดหนามและประตูรวม	๒,๑๔๙.๖๖
ค่ารอกอน	๑,๕๖๙.๔๗

รวม = ๔๙,๗๓๐.๒๙ บาท = ๙

ค่าก่อสร้างที่แน่นก่อกระดับมาตรฐานภายนอก

ค่าสร้างที่รักษาพยาบาล ราคากล่องละ ๖๓๙.๔๖ บาท

ค่าสร้างบ่อ涵์ใช้๒ บ่อ ในราว ๒,๕๐๐

ค่าสร้างโรงขายอาหาร (สหกรณ์) ๑,๐๐๐

ค่าสร้างคลังเก็บของ ๑,๗๑๐

ค่าสร้างแพเก็บเรอยน์ต์ ๖๐๐

ค่าสร้างรั้วลวดหนามเลาคอนกรีต ๔๗๗

ค่าสร้างหลังคาหัวล้ำหรับผู้แพไม้ไผ่ ๒,๖๐๐

รวม = ๔๙,๖๗๙.๔๖ บาท = ๑

ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้สร้าง

ค่าสร้างห้องແถวสำหรับคนงาน ราคากลาง ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าสร้างบ้านสำหรับเจ้าพนักงาน " ๖,๐๐๐ "

ค่าสร้างที่ทำการแผนกทำกราดชาที่

สามเณร " ๖,๐๐๐ "

ค่าสร้างคลังเก็บกระดาษที่สามเณร " ๔,๐๐๐ "

ค่าสร้างบ้านสำหรับเจ้าพนักงานที่

สามเณร " ๒,๐๐๐ "

ค่าสร้างประตูเข้าโรงงานทำกราดชาที่

กาญจนบุรี " ๑,๕๐๐ "

ค่าสร้างที่ทำการที่โรงงานทำกราดชา

กาญจนบุรี " ๑๐,๐๐๐ "

ค่าสร้างบ้านและห้องແถวให้เจ้าพนักงาน

และคนงานรักษาแพไม้ไฟ (คนละฝังกับ
ท้องโรงงานทำกราดชา) อาร์ย " ๑,๐๐๐ "

ค่าสร้างหลังสำหรับกองพัน " ๑,๐๐๐ "

รวม = ๘๘,๕๐๐ บาท = ๙

គោគរីងប្រភពនក្ខារកំសរាយទីនឹងដោយធាំសូម្បា

គោគរីងបង្គាល់ ១ លំ	៥,០០០	បាត
„ ពេខណាគ ១៦ ឬ	៥,៣២៤	„
„ ឡើរធនទោ	១,៦៣៨	„
„ តុងតាមតារសំ ឬ	៣៣០	„
„ តុងកែបន់កាលី ១ ឬ	២៦៦	„
„ តាមគេប់ល ៣៤ ម.	៤០០	„
„ រងមិនិតតិចគោគរីងក្រងយ័ន តាំរាងកកទរាយ		
ឃុបនាតក	៩៥៥.៨៥	„
„ រងមិនិរាយនាក់ចាំ ៣ រង	១៤១	„
„ ឃុបកែបីយ៉ែខាគតេករេង	១៣២	„
„ ឃុបក្រងយ័ន ៣ រង	៣៣១	„
„ ឃុបក្រងយ័នហាំ ឱះឱះអាគ	១៤០	„
„ មិតគុំ ឬ ២៤ លំ	១,៥៥៦	„
„ កេនមិនិវនក្រោបាយ ៤០ ឯុំ	១៥៥	„
„ ពេខិត្តិក	៩៥០	„

រាយ = ១៦,៣២៤.៨៥ បាត = ៩៥៥

ค่าเครื่องประภากองการก่อสร้างที่ซื้อและทำไปแล้ว โดยไม่ได้ทำสัญญา

ค่าพิมพ์แบบและแผนผัง (จักรนัมแผนที่พิมพ์) ๑,๖๔๙ บาท

,, แรงงานปูน ๒๕๙ ,,

,, เหล็ก กองน้ำกล้ำหัวรับถัง ๑๙ ,,

,, ชื้อไม้ทำฝ้าบีดซ่องต่าง ๆ ๓๓๖.๓๓ ,,

,, ไม้ลักษณะเดียวกันในโรงงา ๒,๐๐๐ ,,

รวม = ๔,๐๔๕.๓๓ บาท = ๗

ค่าเครื่องประภากองการก่อสร้างที่จัดซื้อเอง (ซื้อแล้ว)

ค่าซื้อซีเมนต์ ลูกไนรา ๔๐,๖๑๐ บาท

,, กรวด " ๑๕,๘๖๘.๕๐ ,,

,, ทราย " ๗,๘๑๙.๓๙ ,,

,, ปูน " ๑๕,๔๔๙.๔๐ ,,

,, ไม้หมอน " ๖๔๑.๘๐ ,,

,, เศาเข็ม " ๒๒๐.๔๐ ,,

,, ปูนขาว " ๕๗.๕๐ ,,

,, หิน " ๒,๓๗๕.๐๐ ,,

รวม = ๑๖๒,๕๗๗.๔๙ บาท = ๘

ค่าเครื่องประดับการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ซื้อ

ค่าเครื่องหุ้มห่อท่อ	ราคainราว	๓,๖๐๐ บาท
„ เครื่องประดับการไฟฟ้า	„	๖,๐๐๐ „
„ ท่อน้ำประปา	„	๑๐,๐๐๐ „
„ เครื่องแยกนาอุบากจากเยอ	„	๔,๘๓๕ „
„ เครื่องกว้านข้าวตัด ๗.๕ ตัน	„	๓,๐๐๐ „
„ ท่อเหล็กติดต่อระหว่างโรงงาน	„	๑๔,๐๐๐ „
„ ช้อนชี้บังบัวทอง	„	๔,๐๐๐ „
„ ช้อนช์เมนต์	„	๒,๕๐๐ „

$$\text{รวม} = \underline{\underline{๔๔,๘๓๕}} \text{ บาท} = \underline{\underline{๔๔,๘๓๖}}$$

ก+ข+ค+ช+ง+จ+ฉ+ช = ราคาก่อสร้าง = ๔๔,๘๓๖ บาท

เงินเดือน

ก่อนเบ็ดโรงงาน ค่าใช้สอยแบ่งเป็น ๒ ประเภท
๒๐,๕๔๐ บาท

ค่าใช้สอย

ก่อนเบ็ดโรงงาน ค่าใช้สอยแบ่งเป็น ๒ ประเภท

๑. ค่าชื้อวัสดุภาวร ได้แก่ กระถินต์ รดเข็น ถังเหล็ก เครื่อง
กว้าน สูบกึงอัตโนมัติ เครื่องดับเพลิง เลื่อนสำหรับยกของ โต๊ะ

ເກົ້າ ດີອອງຫັນໜ້າທັກ ເຊື່ອມື່ອດີອອງໃຫ້ລຳຮັບໂຮງງານ ໧ ລ ໭
ກັບສິ່ງຂອງເບີດເຕີດຕໍ່າງ ໆ

รวมທັງລັນໃນຮາວ ๖๗,๐๔๙.๘๓ ປາທ

ໜ. ດຳເນັດຕຸໄມ່ດາວ ໄດ້ແກ່ຄ່າເຊື່ອງເຂົ້າ ດຳຕົວຕາ
ໄປປະນີຍແລະຄ່າໂທຣເລຂ ດຳອໍານເຊັມຮອຍນຕົກ ດຳໄປດູກາຣຕໍ່າງ
ປະເທດ ດຳບໍ່ວຍກາຣ ດຳປະກັນ ດຳເບີຍເດີຍເດີນທາງ ໧ ລ ໭ ກັບ
ຄ່າສິ່ງຂອງເບີດເຕີດຕໍ່າງ ໆ

รวมທັງລັນໃນຮາວ ๔๖,๓๐๑ ປາທ

รวมເບີນຄ່າໃຫ້ລົຍກ່ອນເບີດໂຮງງານໃນຮາວ ๑๓,๓๔๐.๘๓ ປາທ

ຄ່າຊ່ວຍສັນກາຣະແລະວັດຖຸດິນກ່ອນເບີດໂຮງງານ

รวมທັງລັນໃນຮາວ ๖๕,๐๔๙ ປາທ

ໂສຫຼີຍແລະທຸນແທ້

ເນື້ອເບີດໂຮງງານແລ້ວ ຈະຕອງຈ່າຍເງິນເບີນຄ່າໂສຫຼີຍແລະທຸນແທ້ດັ່ງນີ້

១. ບ.ກ. ແຜນກຳກະຕາຍ

ນີ້ ບ.ກ. ກຽມເທິງ, ບ.ກ. ກາງູນບຸຮີ, ກອງພັດທຸ (ກຽມເທິງ)
ໜມວັດພັດທຸ (ກາງູນບຸຮີ)

ໂສຫຼີຍ

១. ເງິນເດືອນ ຮາວ ๖,๓๓๐ ປາທ

ໜ. ດຳເນັດຕຸ „ ๑๕๐ „

๓. ค่าเช่าโทรศัพท์	ราว	๑๐ บาท
๔. ค่าน้ำประปา	"	"
๕. ค่าไฟหนังสือ	"	๒๕๐ "
๖. ค่าไปรษณีย์โทรศัพท์	"	๒๐ "
๗. ค่าเชื้อเพลิง	"	๖๐๐ "
๘. ค่าของใช้และเครื่องใช้	"	๕๐๐ "
๙. ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	"	๖๘๐ "

รวม = ก = ค่าโดยทั่วไป แผนกทำกราดราษฎร ราว ๔,๕๔๕ บาท

ต่อ ๑ เดือน

๒. โรงพยาบาลสามเสน

นักงานทำกราดราษฎร กองที่ ๑

ใบหัก

๑. เงินเดือน	ราว	๓๓๔ บาท
๒. ค่ากระถางไฟฟ้า (แสงสว่าง)	"	๕๐ "
๓. ค่าใช้สอย	"	๕๐ "

รวม = ข = ค่าโดยทั่วไปของโรงพยาบาลสามเสน ราว ๓๓๔ บาท

ต่อ ๑ เดือน

ทุนแท้

๑. ค่าวัสดุคิบ (เดชกรະดาษ, เย้อ, พนฯ ลฯ) ราว ๑,๓๙๐ บาท
 ๒. ค่าวัสดุอะล้ม (ดินขาว, กาวสัน, ปูนขาว,—
 เกตอฯ ลฯ) " ๔๐๐ "
 ๓. ค่าวัสดุใช้กับเครื่องรองน้ำ (กรวด,—
 หราย) เนลย " ๓๐ "
 ๔. ค่าวัสดุใช้กับเครื่องยนตร์ (ตะแกรงลวด,
 สายพาน) " ๖๐ "
 ๕. ค่ากระแสร์ไฟฟ้า (เดินเครื่องยนตร์) " ๒,๕๐๐ "
 ๖. ค่าน้ำประปา " ๖๐ "
 ๗. ค่าน้ำมันหยดเครื่อง " ๓๐ "
 ๘. ค่าแรงงาน " ๑,๔๘๐ "

รวม = ทุนแท้ของโรงงานทำกรະดาษสามเล่น ราว ๖,๘๑๐ บาท

ต่อ ๑ เกือน

๓. โรงงานทำกรະดาษกาญจนบุรี

มีกองช่าง, กองทำเย้อ, กองทำกรະดาษที่ ๒, กองแม่

ไสห์ย

๑. เงินเดือน ราว ๒,๗๓๔ บาท
 ๒. ค่าใช้สอย " ๑๕๐ "

๑๙

รวม = น = ค่าโดยทั่วไปของโรงงานทำกราดราษฎร์ ราษฎร์ ๒,๖๘๘ บาท ต่อ ๑ เดือน

ทุนแท้

๑. ค่าวัสดุคิบ (ไม้ไผ่, พื้นฯ ล.) รา ๑๔,๖๔๐ บาท
๒. ค่าวัสดุผู้ช่วย (แบงมัน, ดินขาว,
ปูนขาวฯ ล.) " ๗,๖๓๐ "
๓. ค่าวัสดุใช้กับเครื่องกรองน้ำ (กรวด,
ทราย) เนล็ด " ๑๓๐ "
๔. ค่าวัสดุใช้กับเครื่องยนต์ (ถ่ายพาน,
ผ้าสักหลาด) " ๔๔๐ "
๕. ค่าวัสดุใช้กับเตาไฟ (อิฐทนไฟ) " ๔๔๐ "
๖. ค่าน้ำมันหยดเครื่อง " ๔๔๐ "
๗. ค่าแรงงาน " ๔,๖๐๓ "

รวม = ง = ทุนแท้ของโรงงานทำกราดราษฎร์
ราษฎร์ ๓๖,๗๖๓ บาท

ต่อ ๑ เดือน

รวม = ก ข ค น ง = วงเงินทุนทำกราดราษฎร์
ของแผนกทำกราดราษฎร์ ๑ เดือน รา ๕๕,๖๐๐ บาท

ได้ตั้งทุนหมุนเวียนไว้๓เดือน ∴ วงเงินทุนจึง
 $= ๕๕,๒๐๐ \times ๓ = ๑๖๕,๖๐๐$ บาท

สรุป

๑. ค่าเครื่องจักร	ในราوا ๑,๐๖๔,๓๗๐	บาท
๒. ค่าค้าประภันต์วัสดุเด็กเงิน	"	๑,๐๑๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้าง	"	๗๗๘,๔๗๖ บาท
๔. เงินเดือนก่อนเบ็ดโรงงาน	"	๒๐,๕๔๐ บาท
๕. ค่าใช้สอยก่อนเบ็ดโรงงาน	"	๑๓,๓๙๐ บาท
๖. ค่าซื้อสิ่งของและวัสดุดิบก่อน เบ็ดโรงงาน	"	๖๕,๐๔๙ บาท
๗. โลหุยและทุนแท้หมุน ๓ เดือน รวมเป็นวงเงินในการสร้างและค่า ใช้จ่ายสำหรับโรงงานท่ากระดาษ	"	๑๖๕,๖๐๐ บาท
ภาษีน้ำ		
ภาษีน้ำ	<u>๒,๒๐๗,๔๗๖</u>	บาท

กำหนด . วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๘๐

ทดลองเดิน เรื่อง ขอต่อกำหนดคงเครื่องในสัญญา

เครื่องจักร จาก ผู้จัดการ ห้างบี.กริมแอนโกล

เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหารบก

ตามที่นายอีเบอร์ยาาร์ท, นายชไนเดอร์ และนายยันยาาร์ทได้เจรจา กับท่านเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนก่อนนั้น ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากตัวคุณจะสร้างเครื่องคิดเป็นเวลาประมาณ ๑๐ เดือนสำหรับกว่าเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเสียใจที่ไม่สามารถจะคงเครื่อง ให้เสร็จภายในสัญญา ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเสียใจที่ไม่สามารถจะคงเครื่อง ให้เสร็จภายใน ๗๓๐ วันนับแต่วันเซ็นสัญญา ตามที่ได้กำหนดไว้ใน สัญญา ถึงอย่างไรก็ ข้าพเจ้าก็พยายามโดยเต็มความสามารถเพื่อ ร่างให้งานเสร็จนไปเสียโดยเร็ว และหวังจะให้การคงเครื่องแล้วเสร็จ ประมาณวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๘๑ ถ้าหากว่า คุณคิดสำหรับ Soda Recovery Plant และ Filter House จะสร้างเสร็จใน วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถลงมือตั้งเครื่อง ในตัวคุณเหล่านี้ได้ในวันนั้น และถ้าหากว่า วัสดุค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผู้จัด หนนั้น ก็ได้จัดหาไว้พร้อมพร้อมและพร้อมที่จะส่งให้เช่นได้ทันทีในเมื่อ ต้องการ เพื่อการดำเนินงานของข้าพเจ้าจะไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวได้ใน สถานใด โดยเหตุนี้ ข้าพเจ้าคร่ำชื่อความกรุณาจากท่าน ขอได้โปรดผ่อนผันให้ยืดเวลาตั้งเครื่อง ตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนชี้แจงมาแล้ว

ข้างต้นไปเป็น๔๙๙วัน ก็ถ้าวคือจนถึงวันที่๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๘๗ โดยถือว่า ส่งที่เรียนมาแล้วข้างตนได้เป็นไปโดยเรียบร้อยและเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการติดต่อรวมทั้งการทดลองเครื่องโดยเรียบร้อยตามลัญญาข้อ ๑๑ กำหนดไว้ ๔๙๙ วันนั้นก็ขอได้กรุณาผ่อนผันไปอีก ๑๙๓ วันก็ยัง

โดยความพึงดีอย่างสูง

(ลงนาม) *B. Grimm*

ที่ ๔๙๙/๒๕๘๐

๑๙ มกราคม ๒๕๘๐

เร่อง รับทราบกำหนดวันติดต่อเครื่องจักร เสื้อ
หาก เจ้ากรรมแม่นที่

ถึง ผู้จัดการห้างบี.กริม ๑

ตามหนังสือของท่านนายบี.บลิง ๒๖ ธันวาคม ศกนี้ ระบุไว้ให้ข้าพเจ้าตอบยืนยัน เร่องกำหนดวันที่ต้องยืดไปจากกำหนดวันในสัญญาซื้อขายเครื่องจักรทั่วไป ข้าพเจ้ารับตอบยืนยันว่า เร่องนั้นบังคับบัญชาของข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า กำหนดการติด

ดังเครื่องจักรจะแล้วเสร็จภายใน ๙๙๔ วัน นับจากวันเข็นลัญญา และจะเริ่มทำการทดลองเครื่องจักรโดยประมาณอย่างช้าในราวกันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๘๑.

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) นายพันเอก ร่มเยื่อภิภาคกิจ

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๐

เรื่อง ขอขอบพระคุณค่ายนิยัณวนคิดตั้งเครื่องจักรเลร์
จาก ผู้จัดการ ห้างบี.กริมแอนโกล
เบียน เจ้ากรมแผนที่ทหารบก

ตามหนังสือของท่านที่ ๔๕๙๒/๒๕๘๐ ลงวันที่ ๑๗ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ กำหนดวันคิดตั้งเครื่องจักรสำหรับใช้
เป็น ๙๙๔ วันนั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ว ขอขอบพระคุณในความ
กรุณาเชื้อเพื่อของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง.

ล้วนการทดลองเครื่องจักรนั้น ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่า จะ
ได้ปฏิบัติการให้เป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา ข้อ ๙ ทุกประการ.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงนาม) B. Grimm

หมายเหตุ เพื่อกันความสงสัย ในรายการก่อสร้างที่แลสดงว่า สร้าง
 ที่ทำการແຜນກทำกระดาษ และบ้านข้าราชการ — สร้างคลัง
 เก็บกระดาษที่ wrong งานทำกระดาษสามเล่นนั้น ก็ เพราะว่า
 ແຜນກทำกระดาษดังขึ้นใหม่ ต้องสร้างที่ทำงานให้ และ
 ตั้งอยู่ที่สามเสน ก็เมื่อทำกระดาษที่กัญจนบุรีได้แล้ว
 ต้องล่งมาจ้างนายในตลาดกรุงเทพฯ ก็จำเป็นต้องมีคลัง
 พักกระดาษก่อนจ้างนาย และสร้างขึ้นภายใต้ใน wrong งานที่
 สามเสน เพราะเหตุนั้นจึงรวมอยู่ในวงทุนของ wrong งานทำ
 กระดาษกัญจนบุรีด้วย

พ.อ. มนต์ธรรม


รวม






งานผังราคตึก



ท่านสูปีไปในงานอโศกสารรถไฟฟ้าสถานกรุงเทพฯ




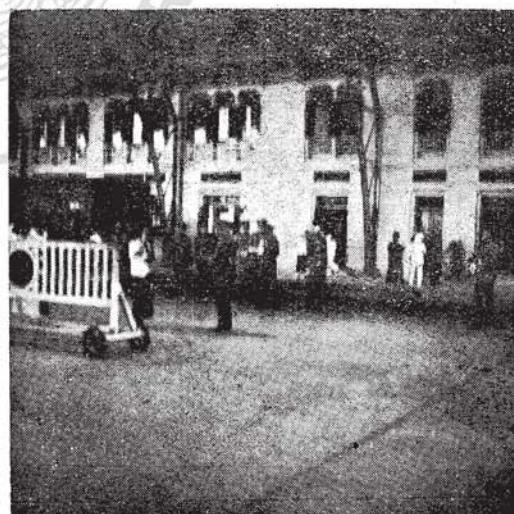


ແຄວນັກເຮືອນຕົງຮັບທິນຄຣປູມ (ໄປ)

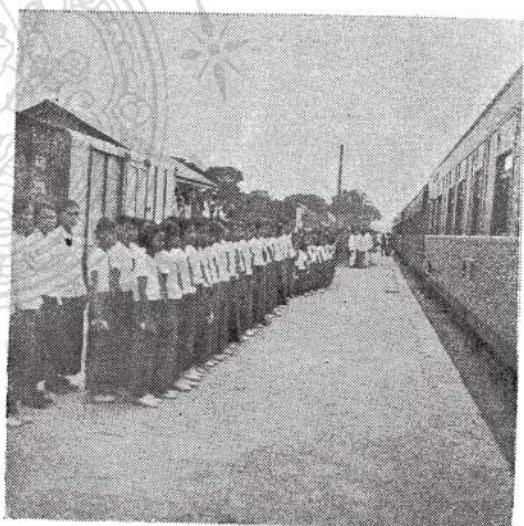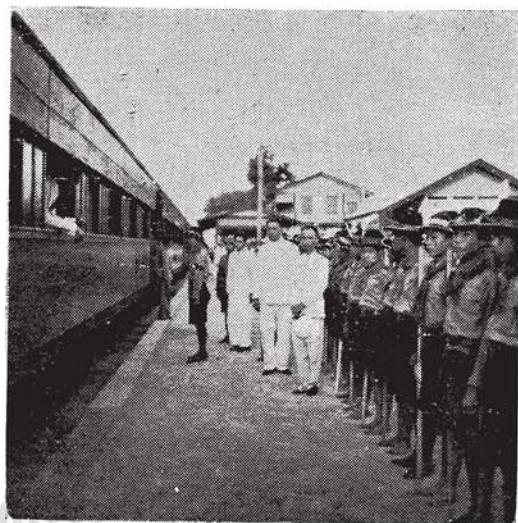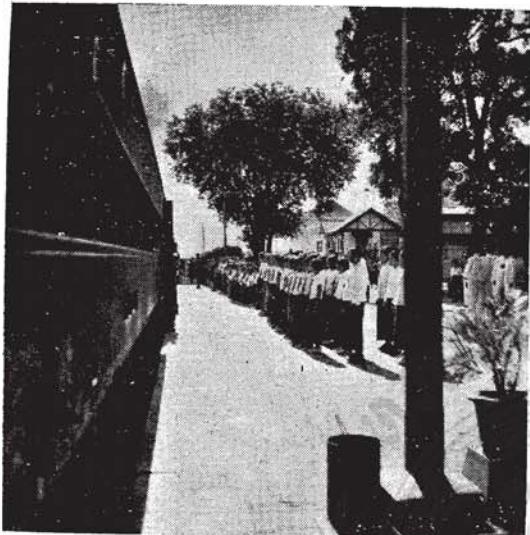






ແຄວນັກເຮືອນຕົງຮັບທິນຄຣປູມ (ກລັນ)




การต้อนรับท่านโน๊กเมืองอุดม

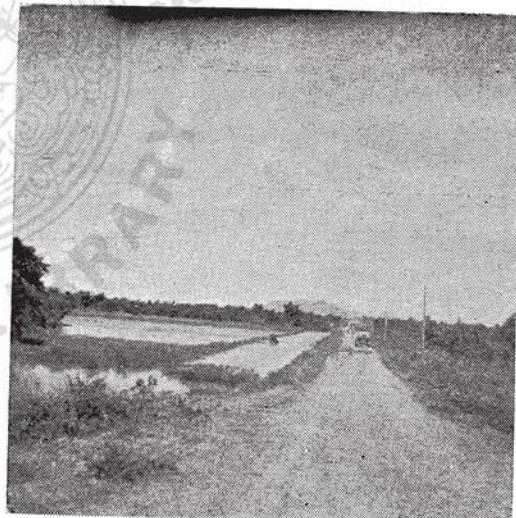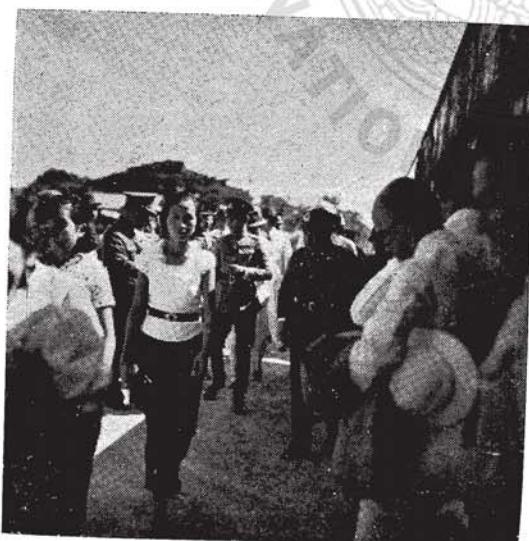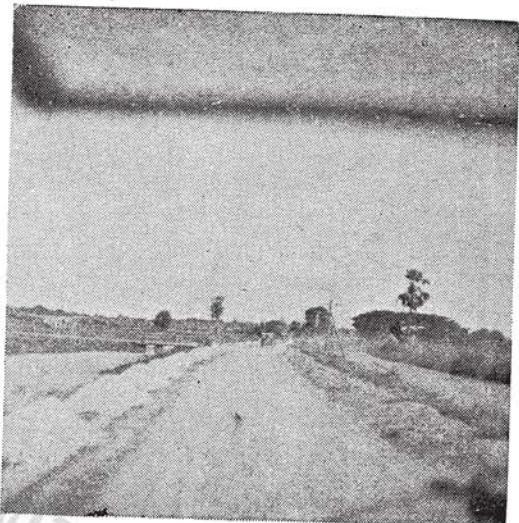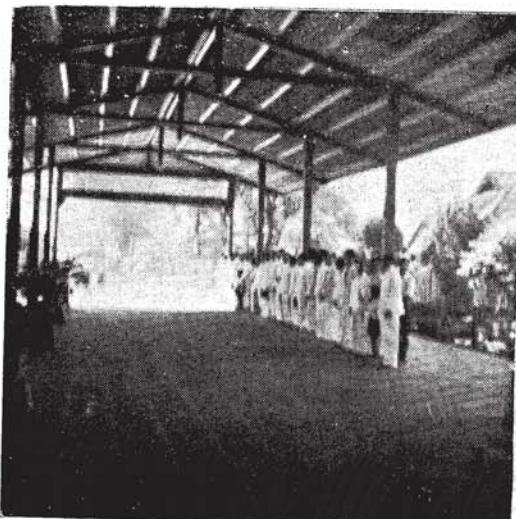

ถนนไปกาญจนบุรี

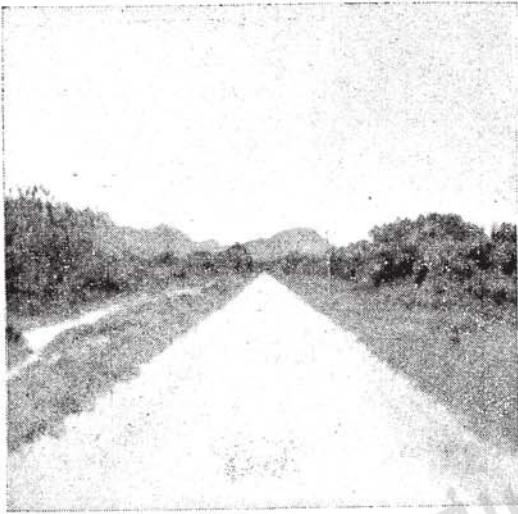

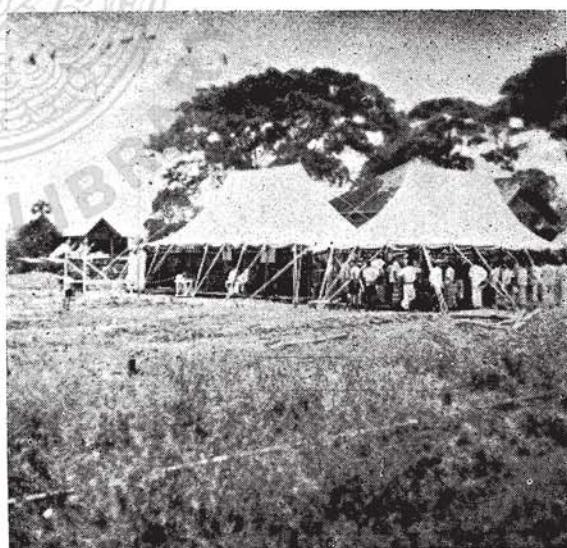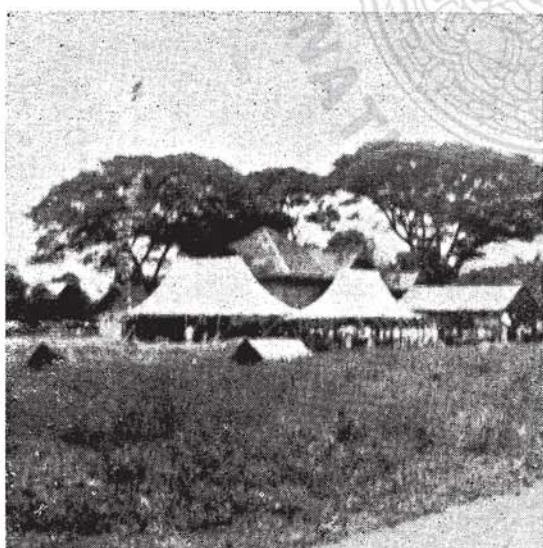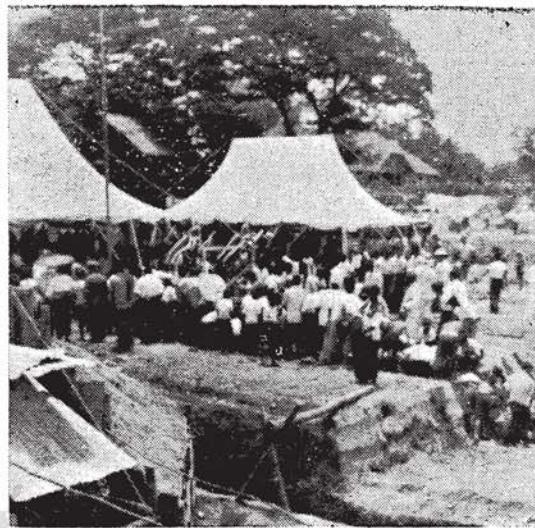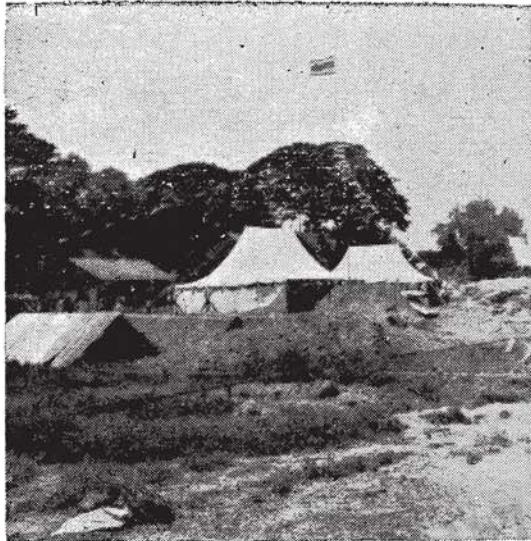

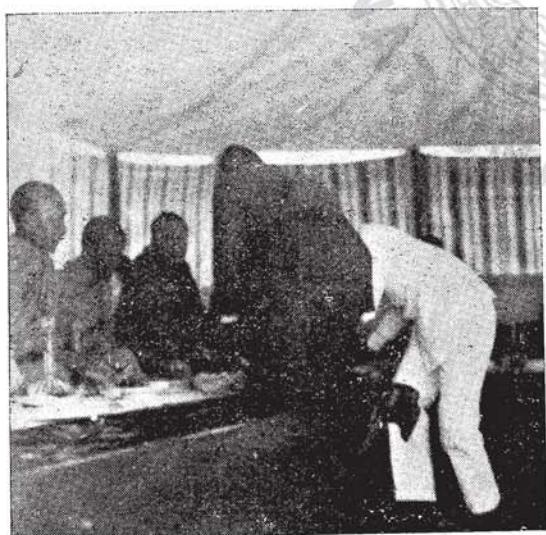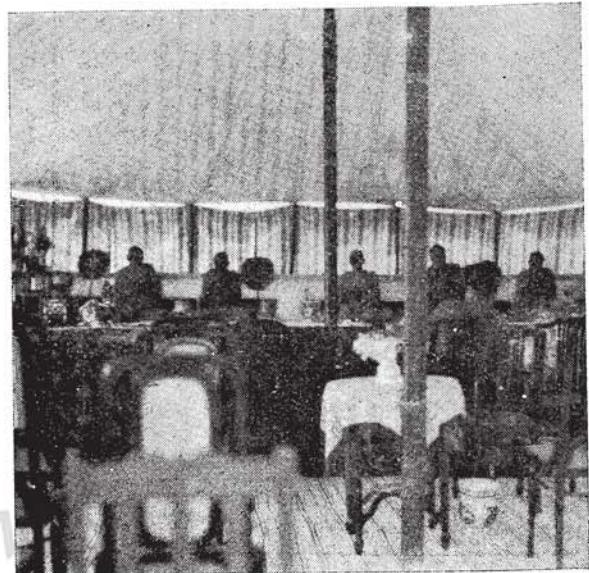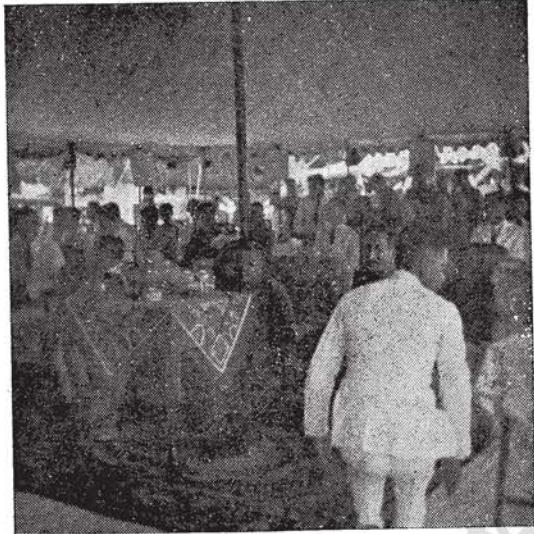




นายกรัฐมนตรีสั่งเวยเจ้าพ่อหลักเมือง









แท่งศิลาริถ—หลุมผึ้งแท่งศิลาริถ

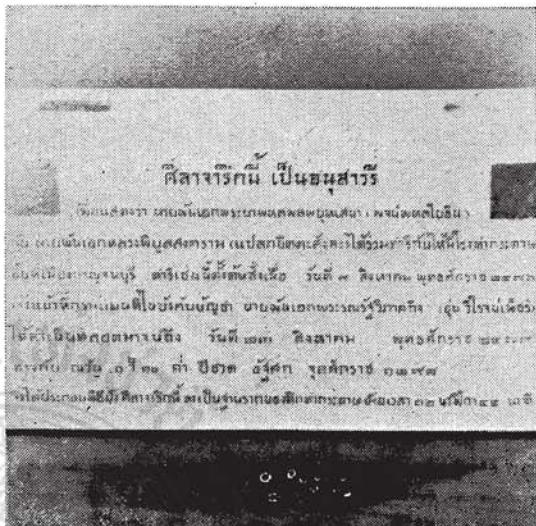




รัฐมนตรีฯ รายงาน, นายกฯ กล่าวตอบ

๔ ๗ ๕ ๖
เต้นทท เคียงอาหาร

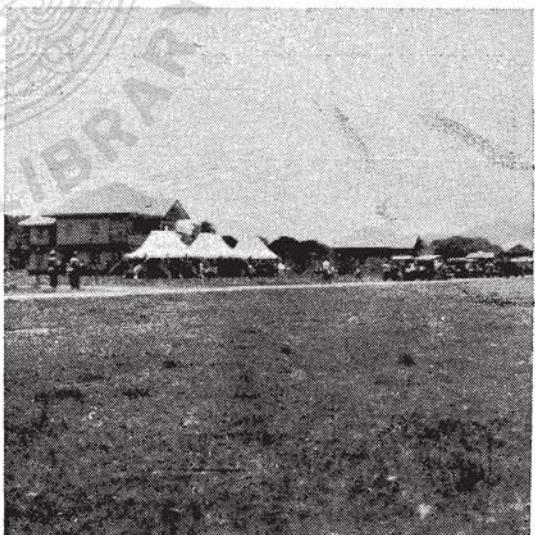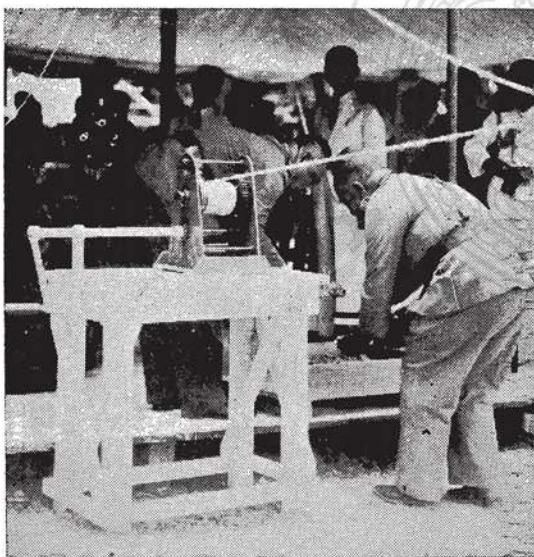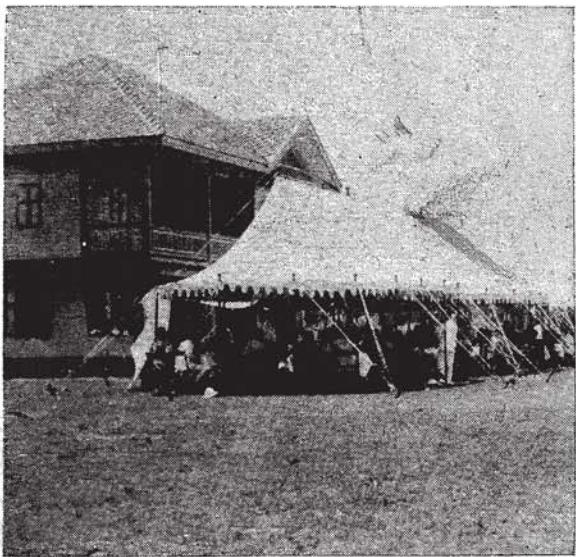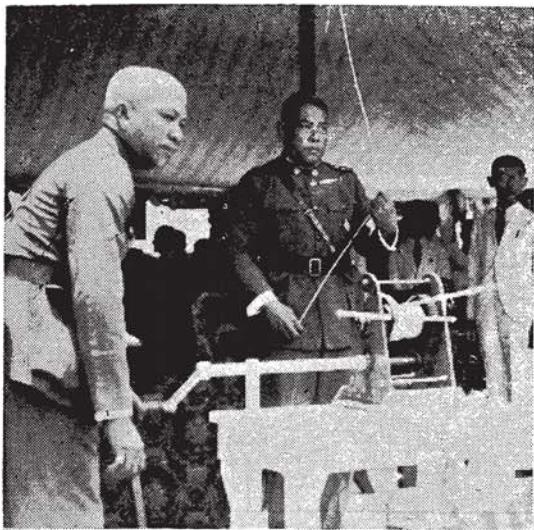


นายกฯ ปล่อยแห่งศิลปาลังหدمและกลุบ


ขบวนรถจอดหน้าเต็นท์

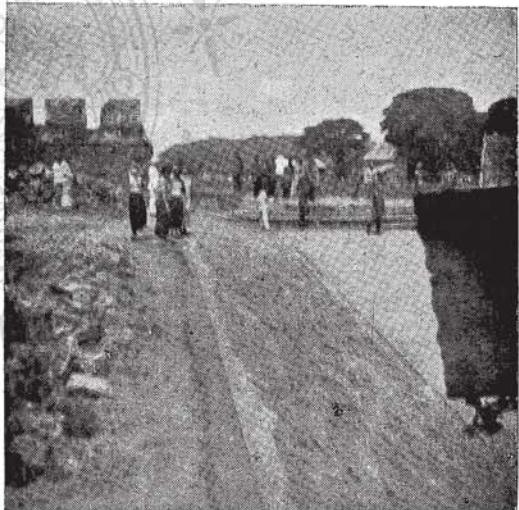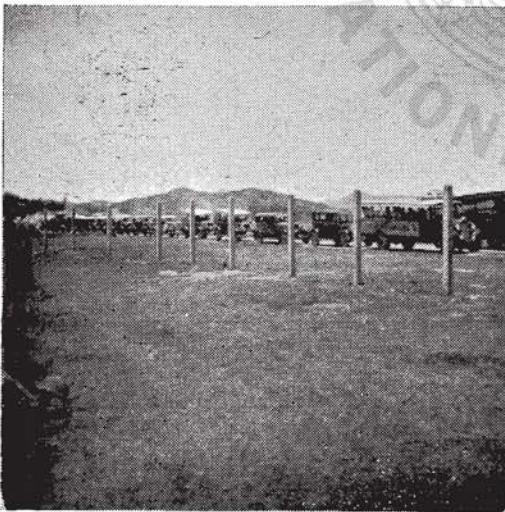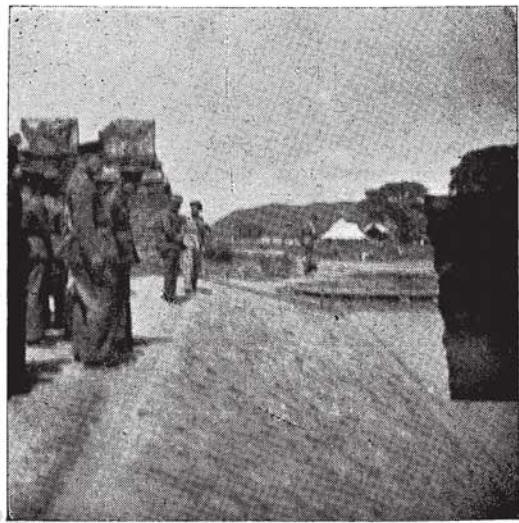



ชุมทางที่จะนำไม้ไผ่เขน





NATIONAL LIBRARY

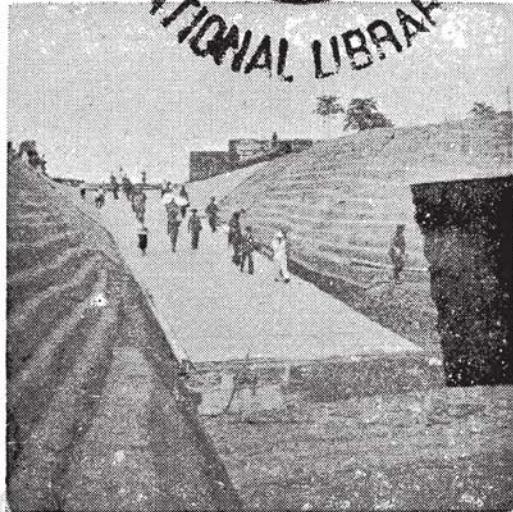

ชุมทางที่จะนำไม้ไปขึ้น

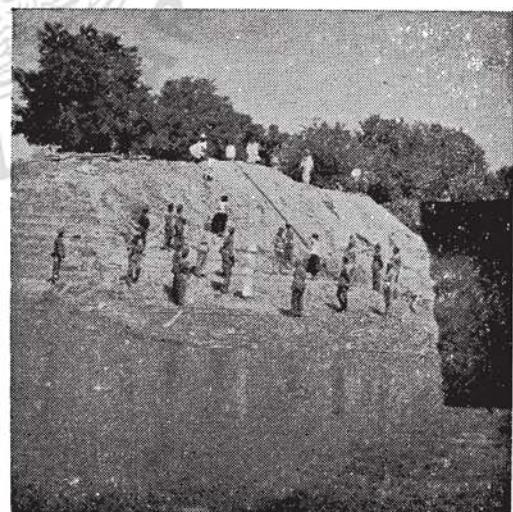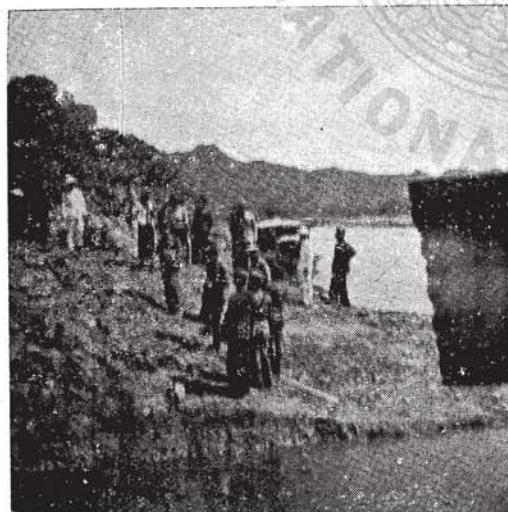

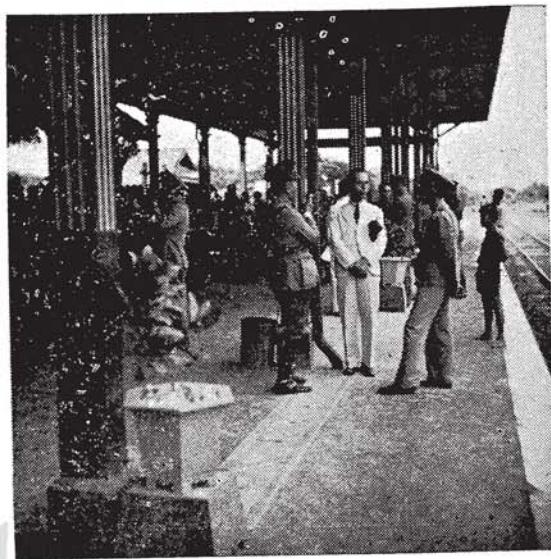
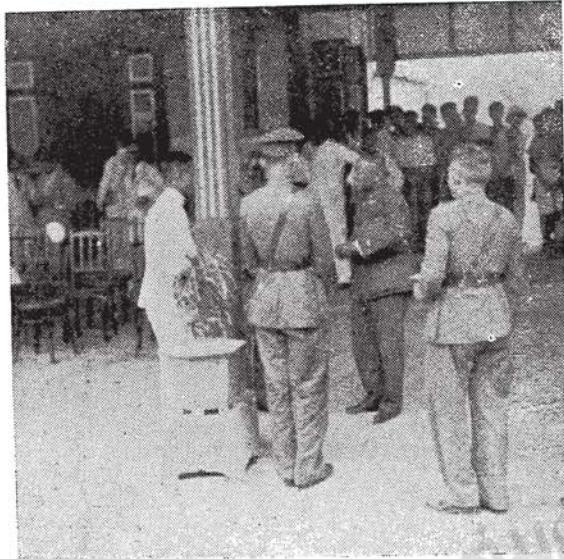


การต้อนรับที่สถานีน้ำตกโนงเมืองกลัน






การต้อนรับที่สถานีน้ำโน้นเจ่นเมืองอุบลฯ

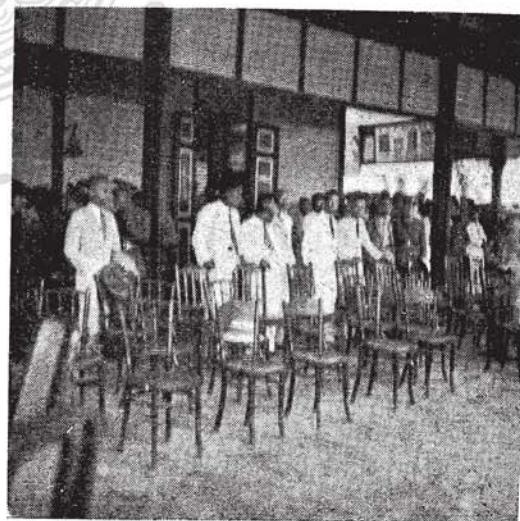
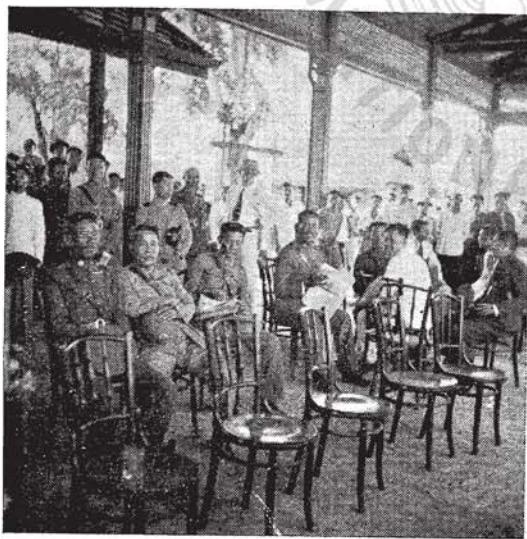


โครงการก่อสร้างและซ่อมโรงงาน







ผู้บัญชาการทหารบกตรวจสอบ

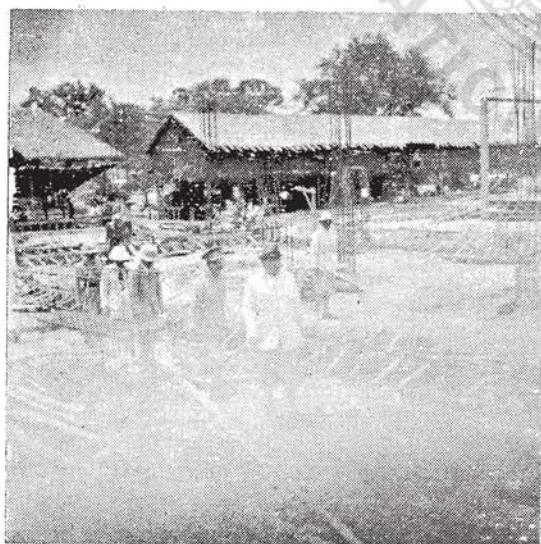

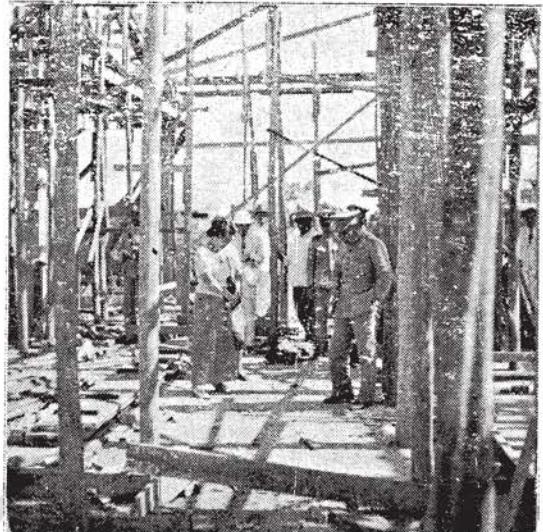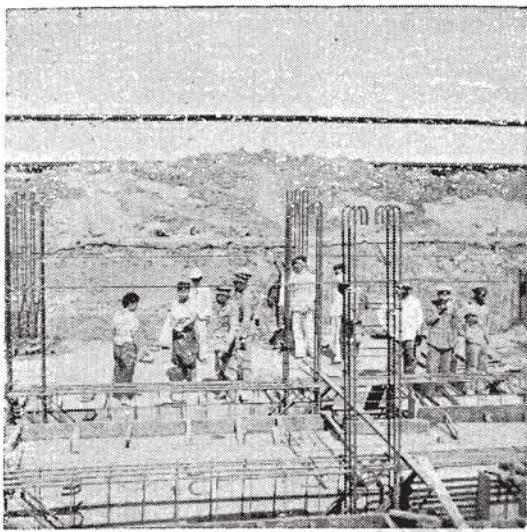




คณหสิจพหลพลพยุหเสนาชุมการก่อสร้าง

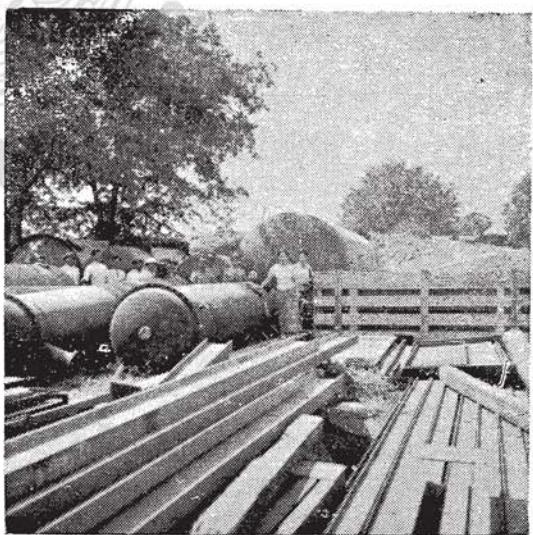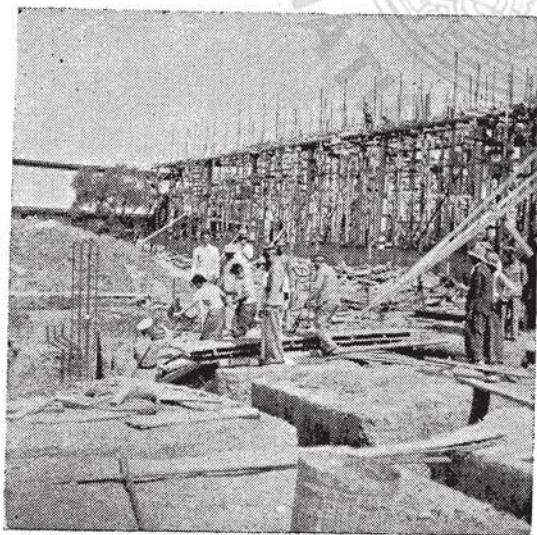

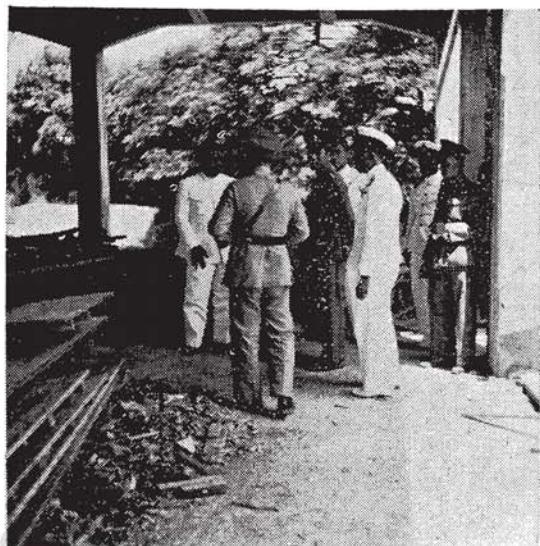
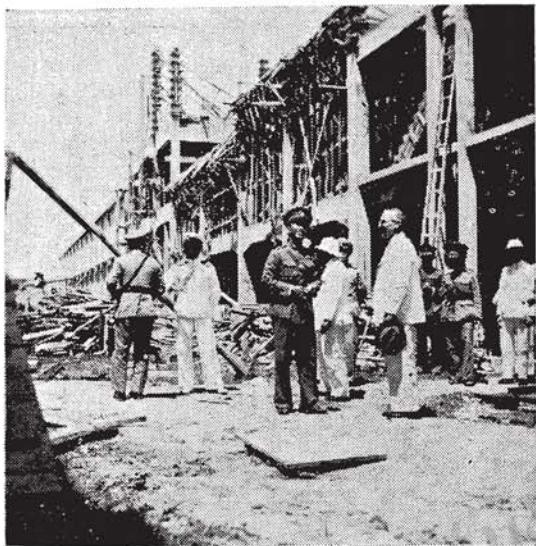




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจงาน

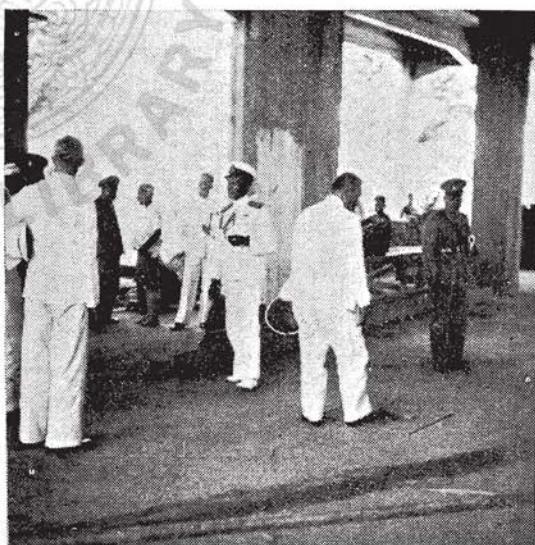

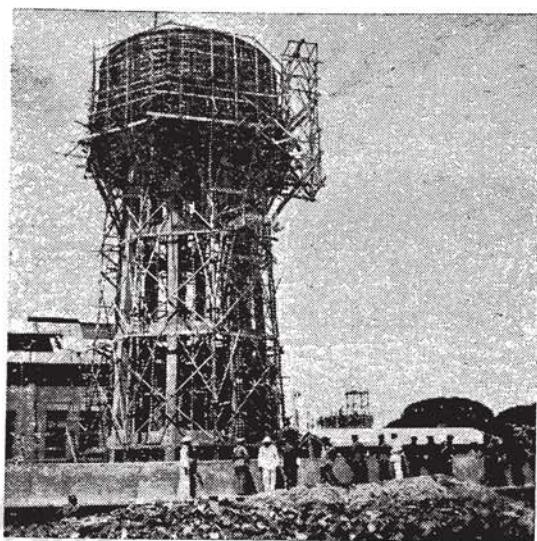
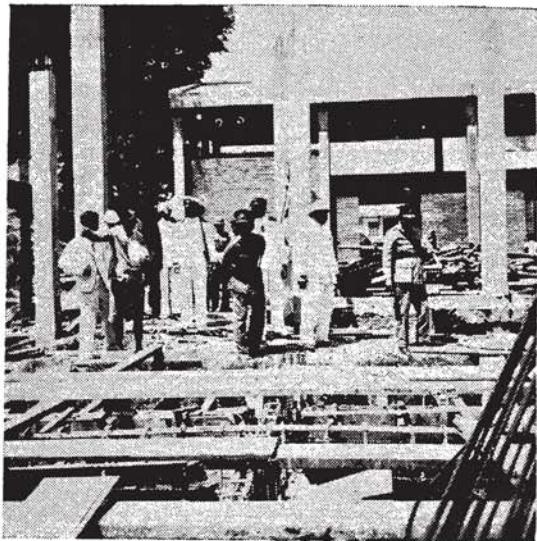




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจงาน

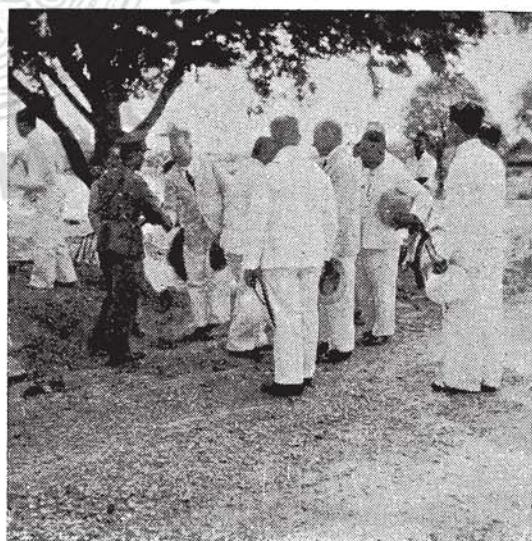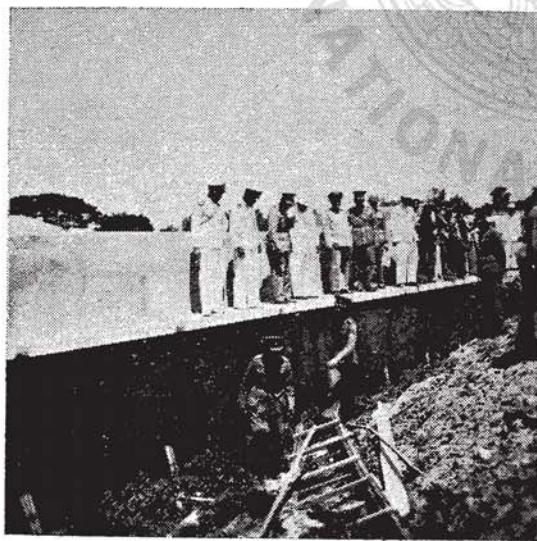

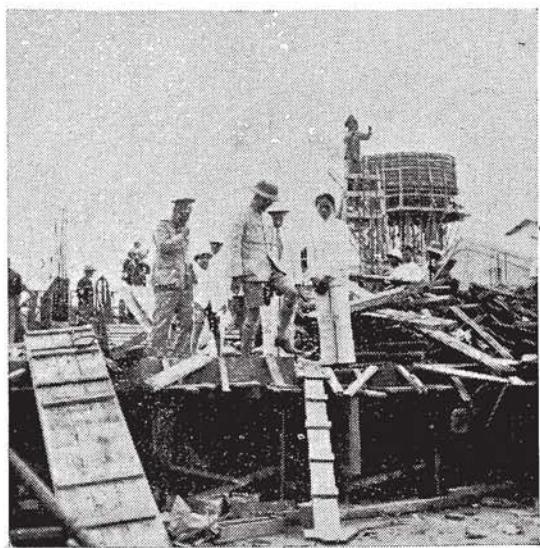
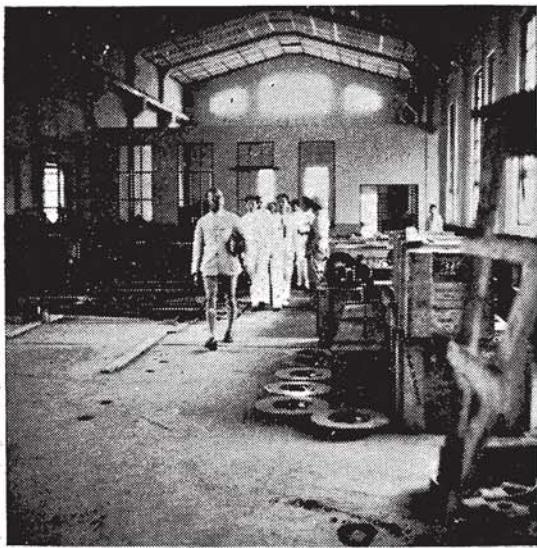




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูการก่อสร้าง

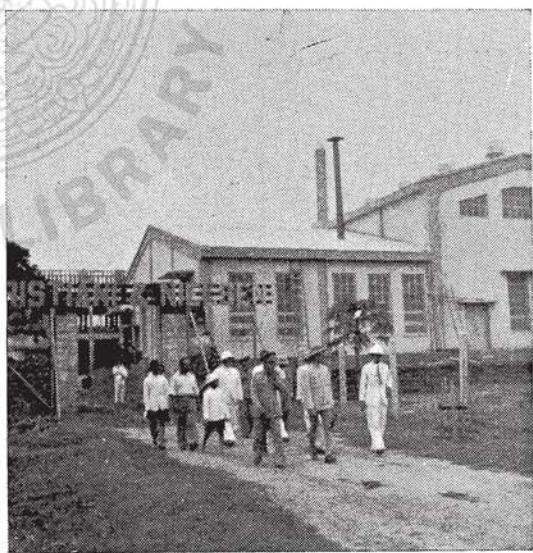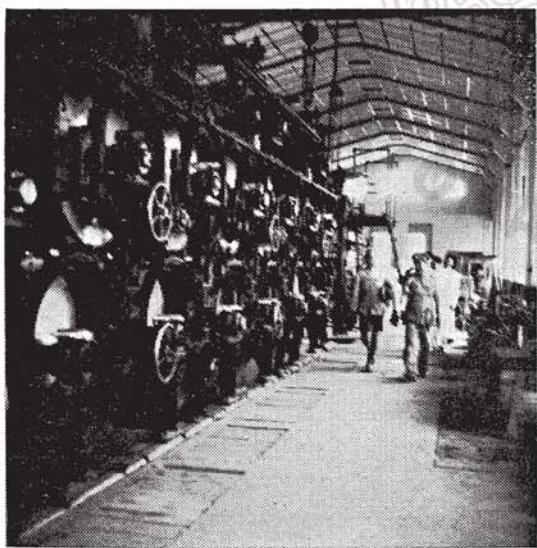

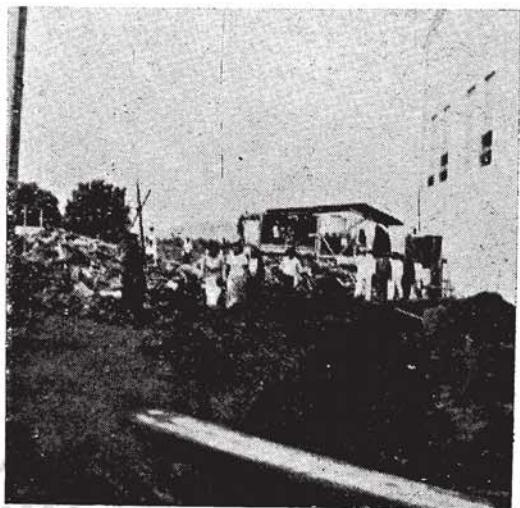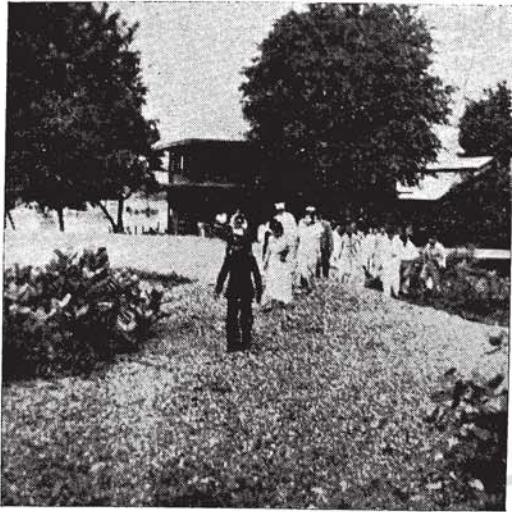




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชมโรงงาน

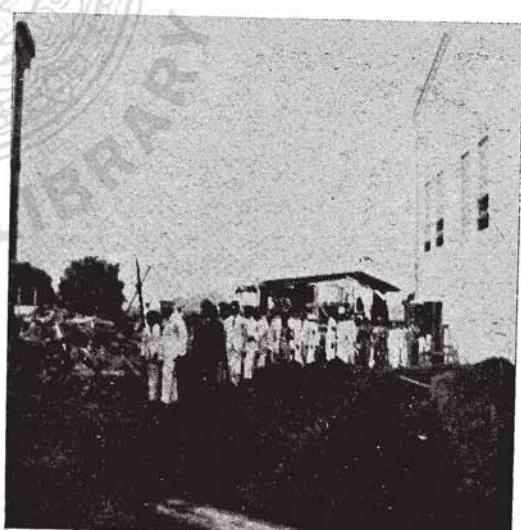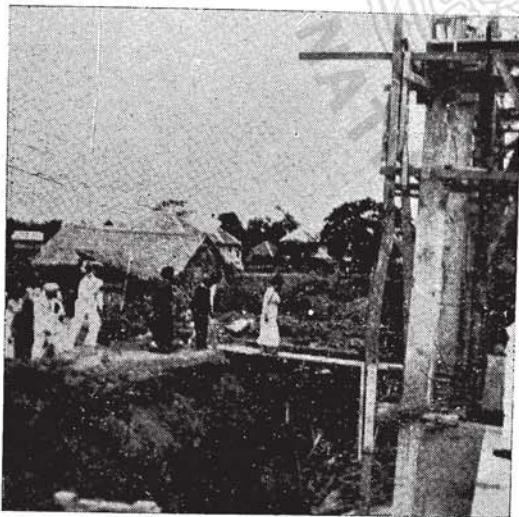

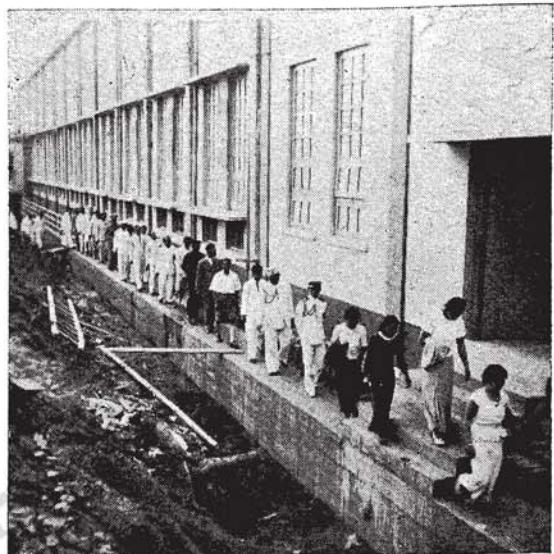
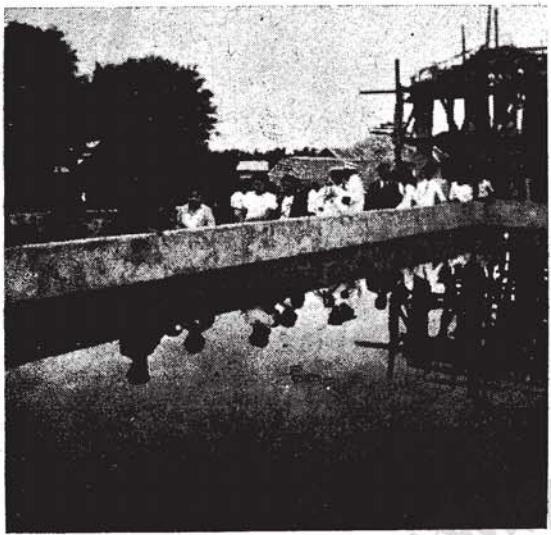




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชมโรงงาน

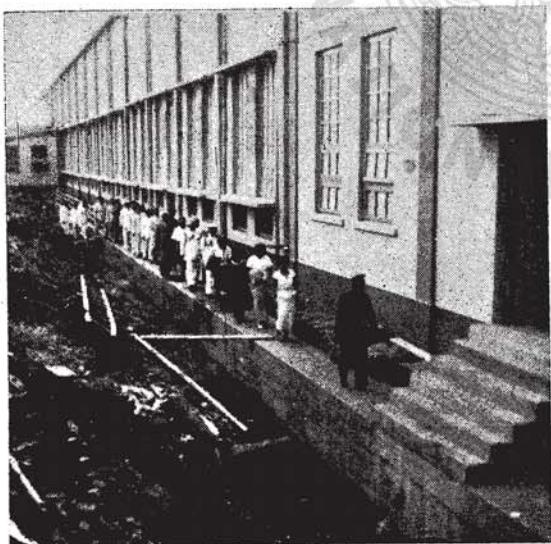

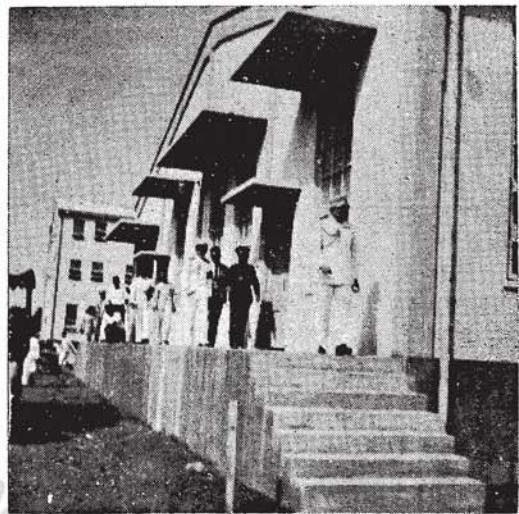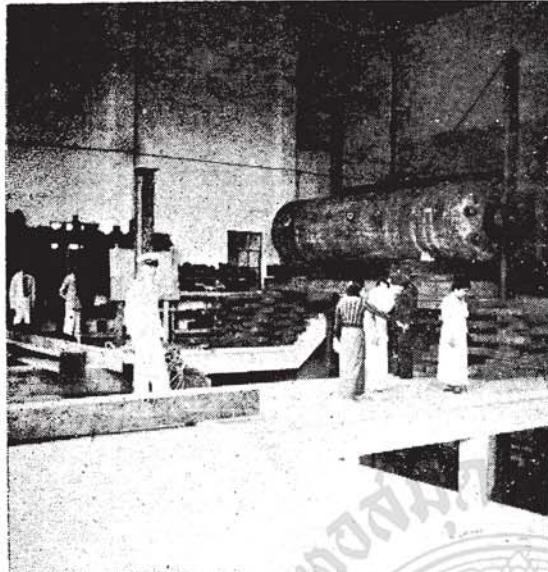






รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชมโรงงาน

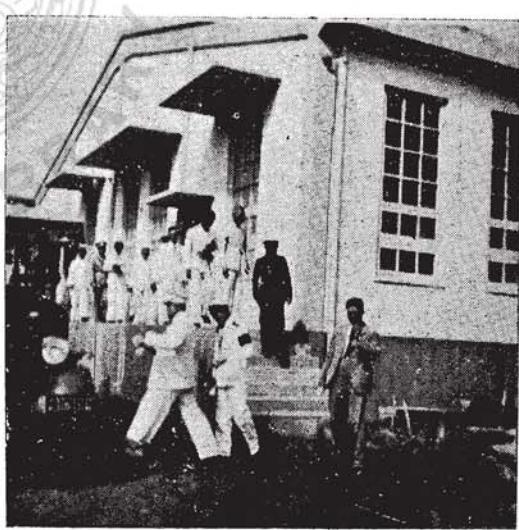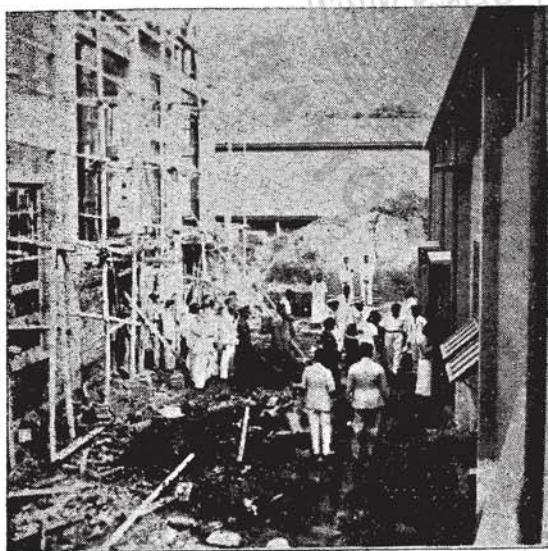


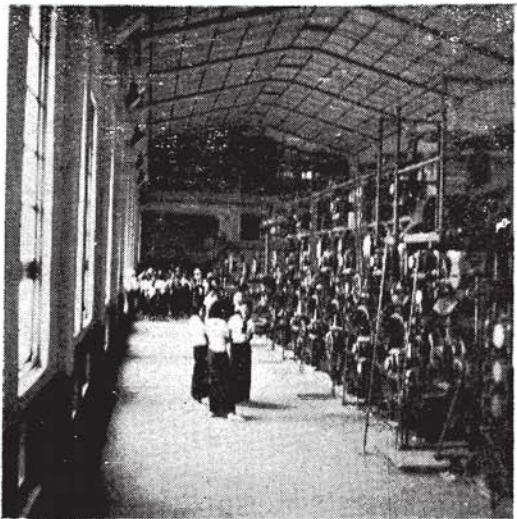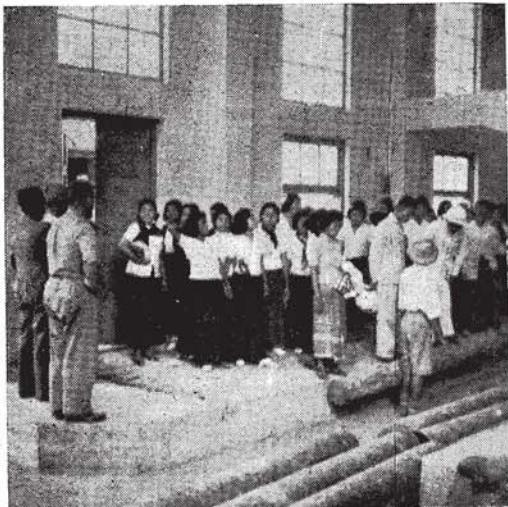

ครุและนักเรียนโรงเรียนสุนันทาชมโรงงาน


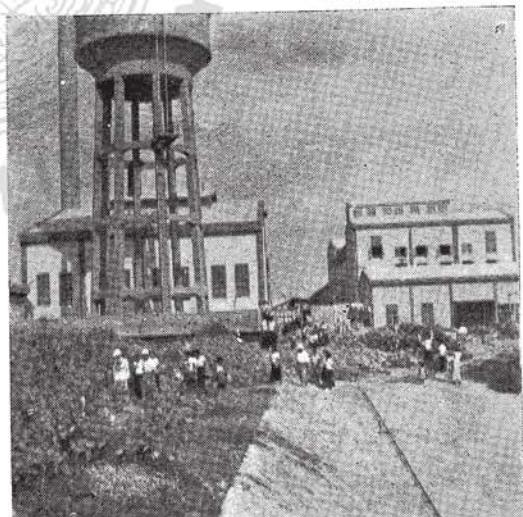


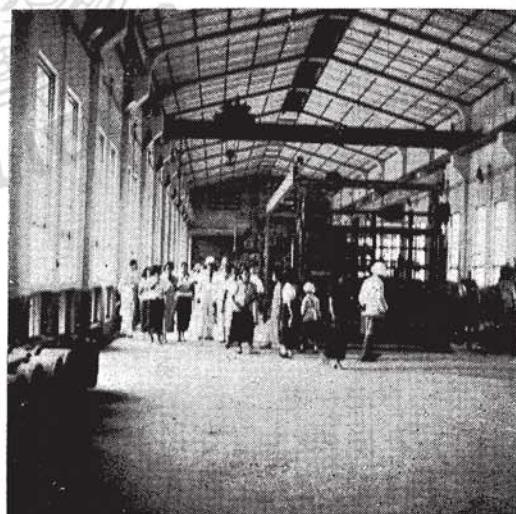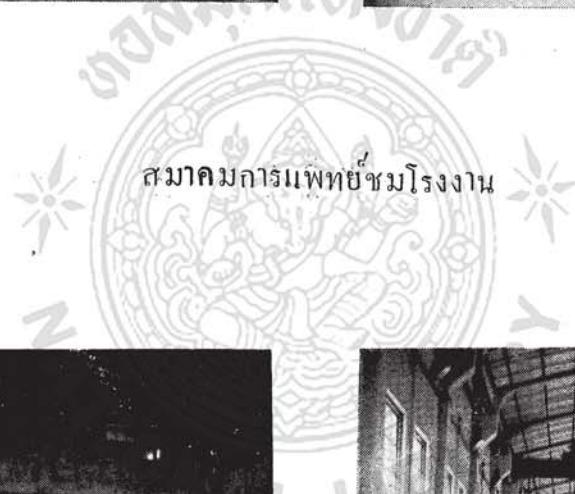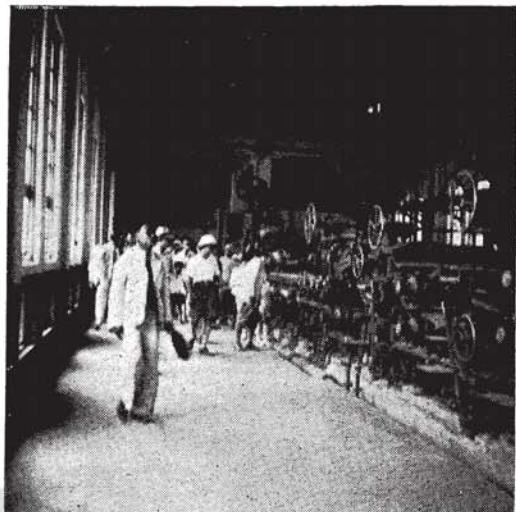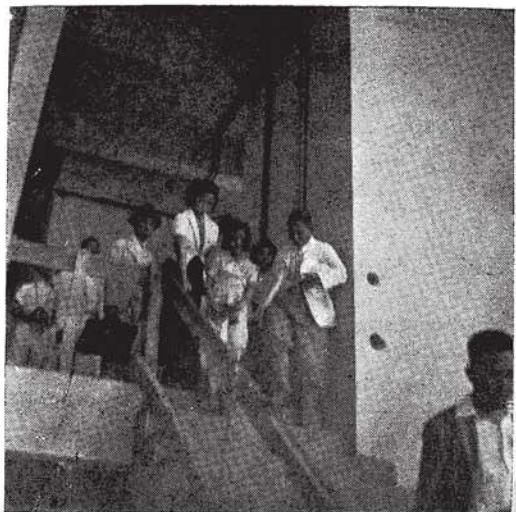


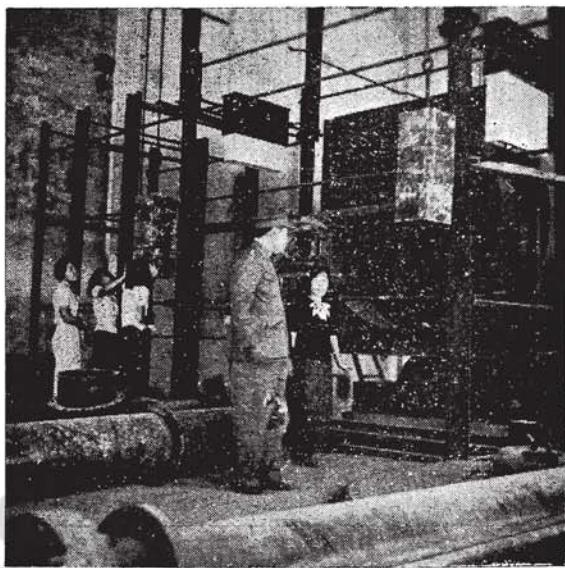


สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ทอดพระเนตร 逰งาน



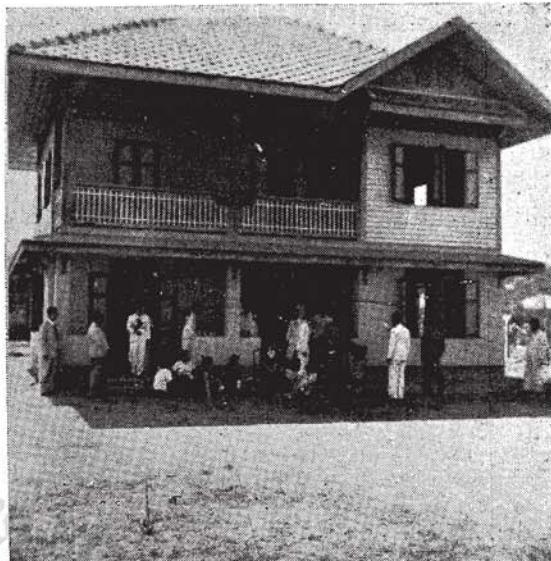
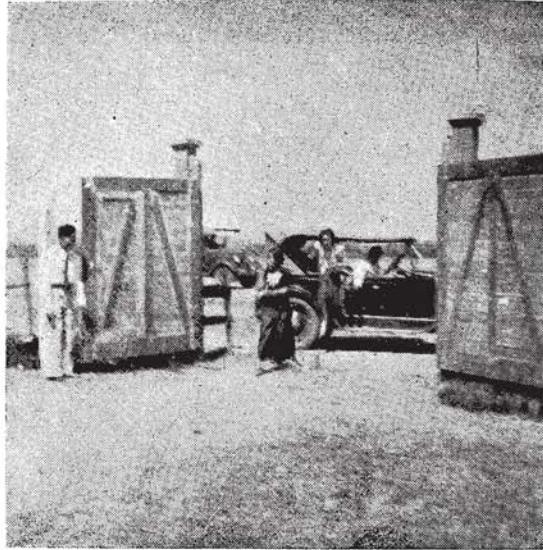




สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สหทอดพระเนตร 逰งาน

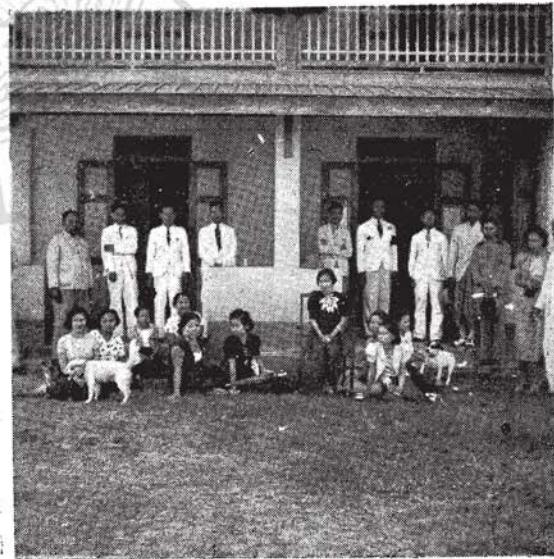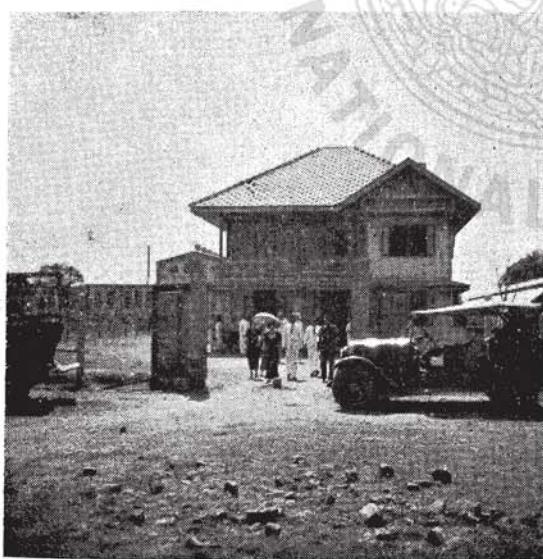








สมเด็จพระนางเจ้าอนทรงศักดิ์สิทธิ์ทอดพระเนตร โรงงาน


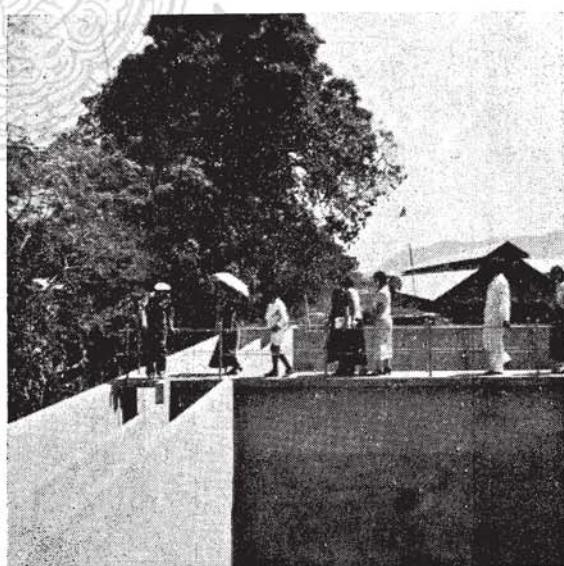
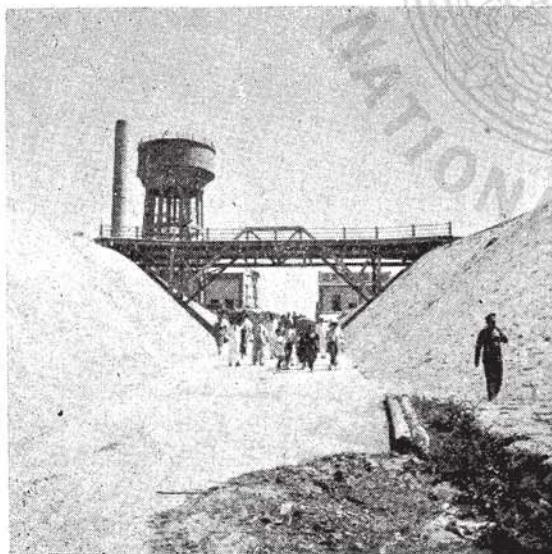


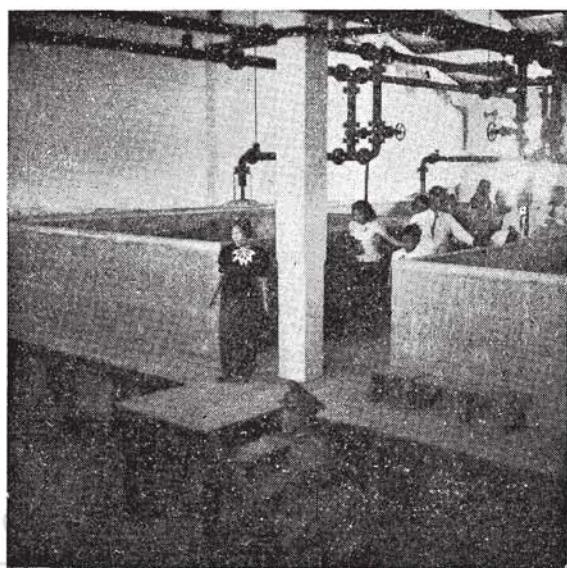
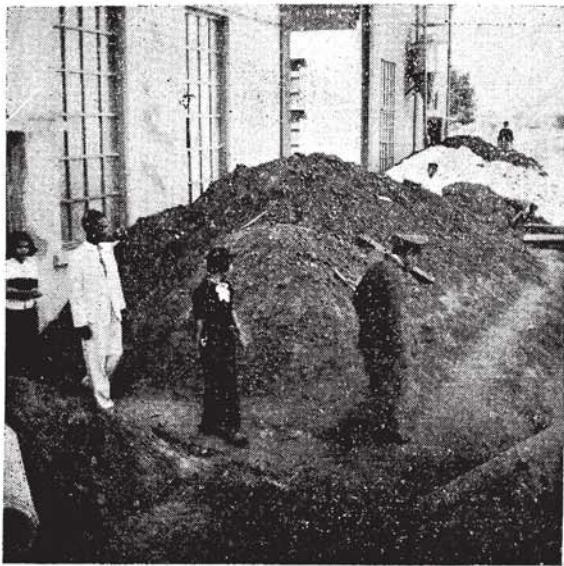


สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ฯ ทรงประนันตร์ โรงงาน

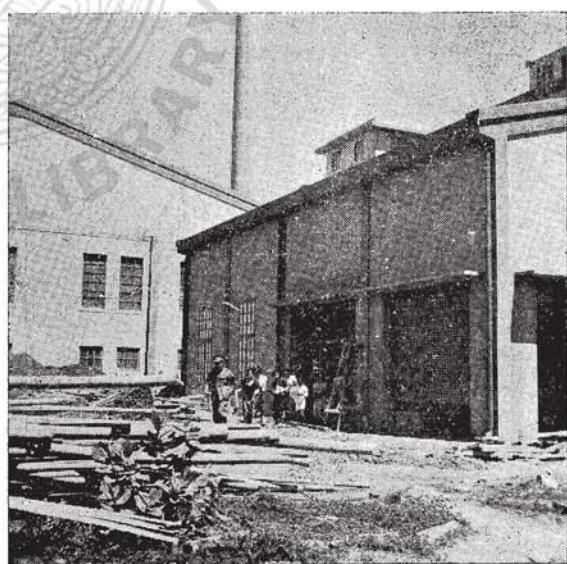
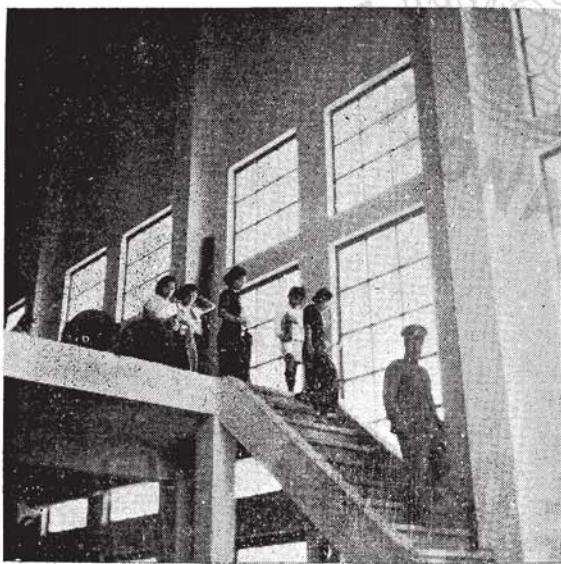


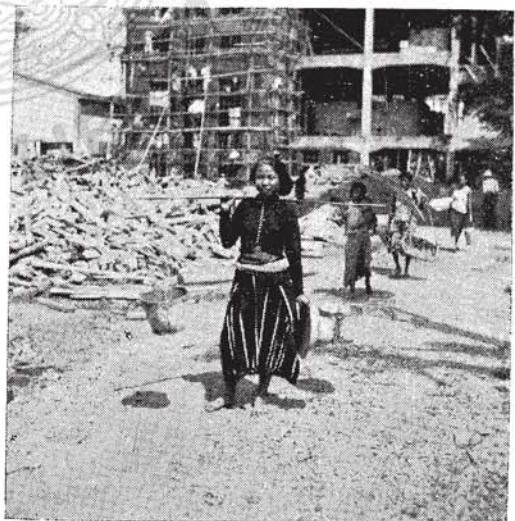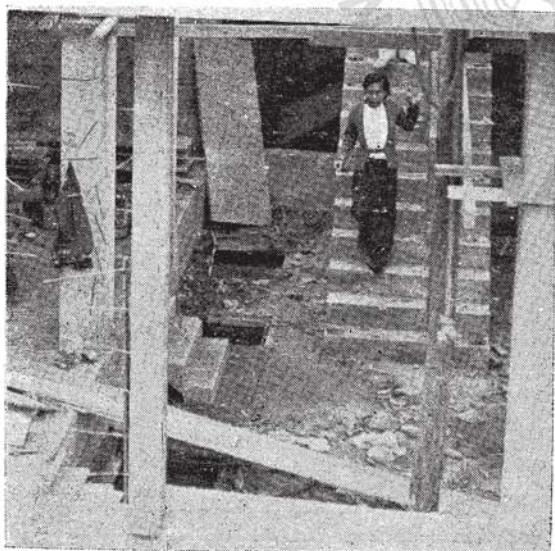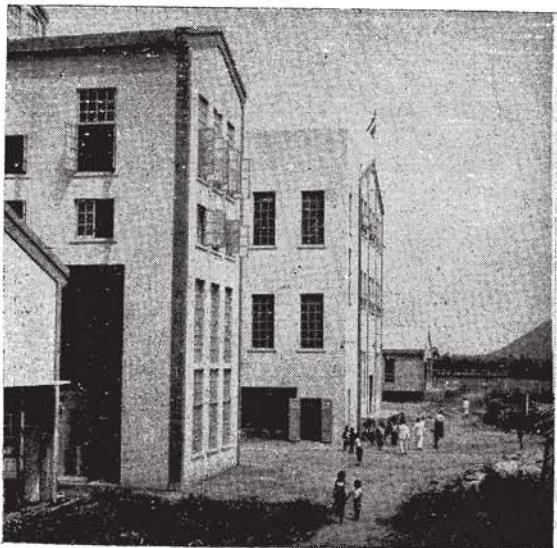

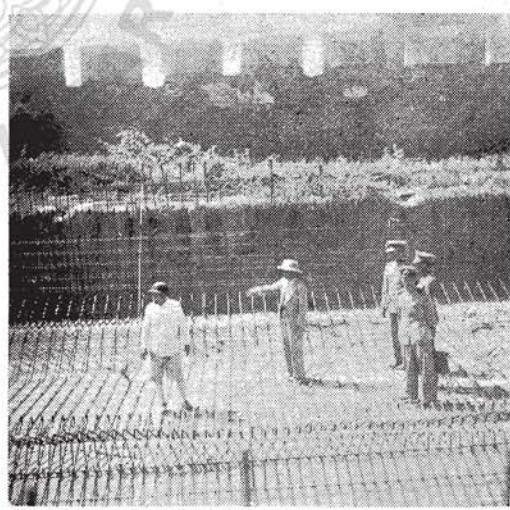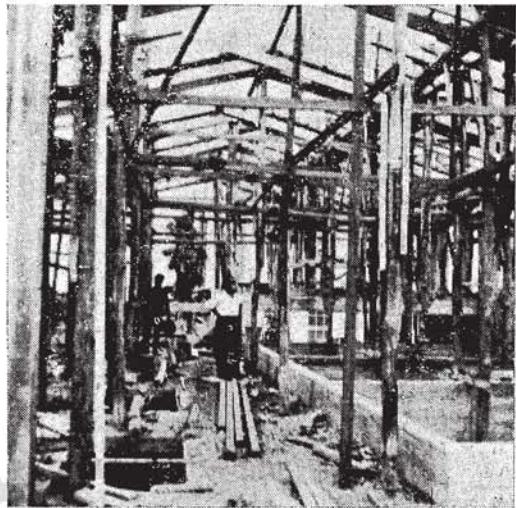
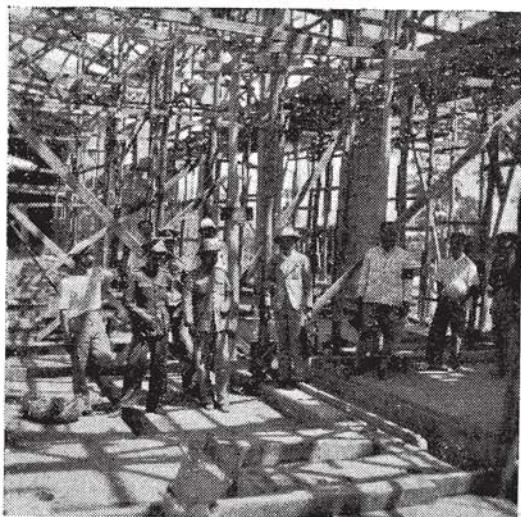


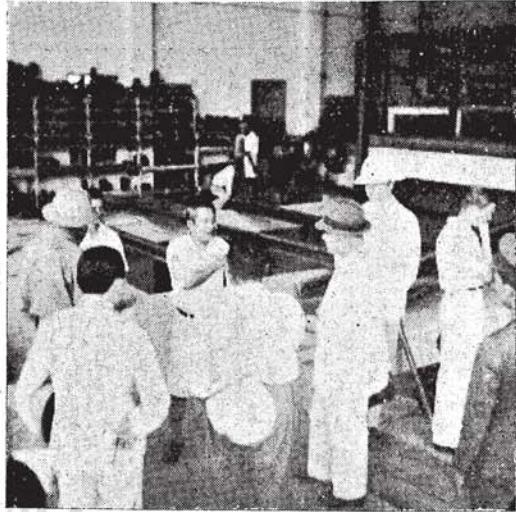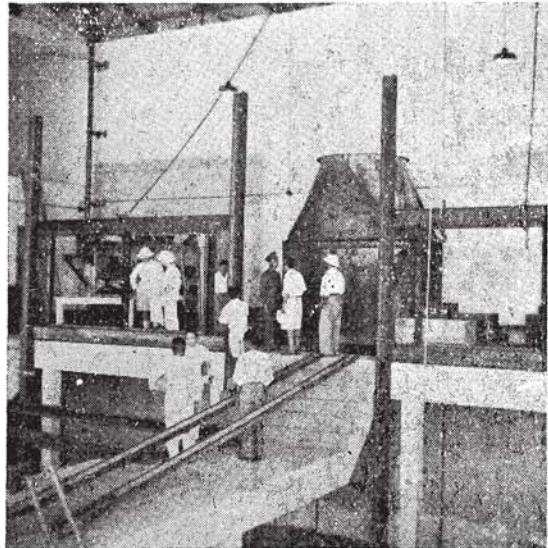


กรรมการตรวจการก่อสร้าง

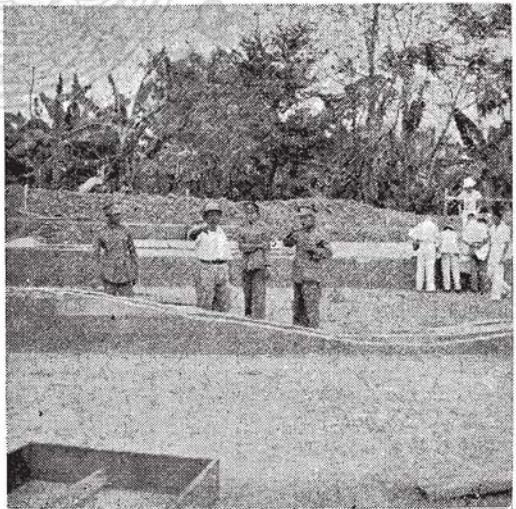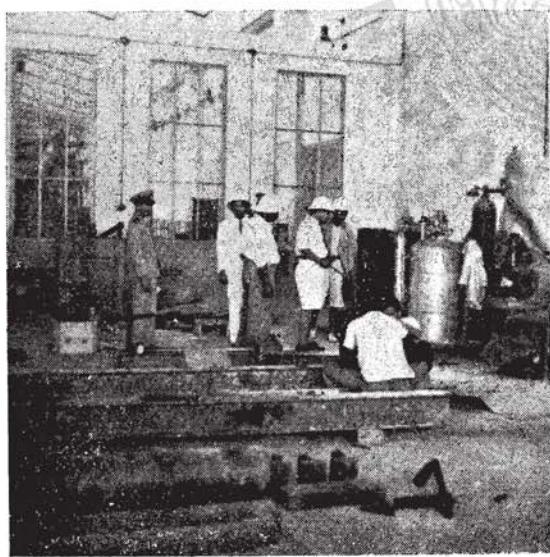


การก่อสร้าง

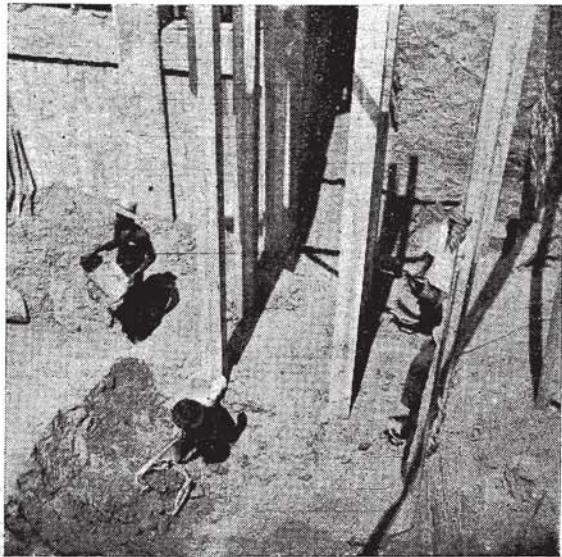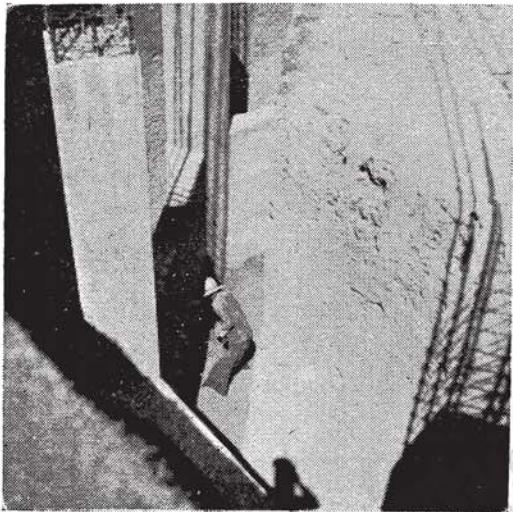



การขุดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)

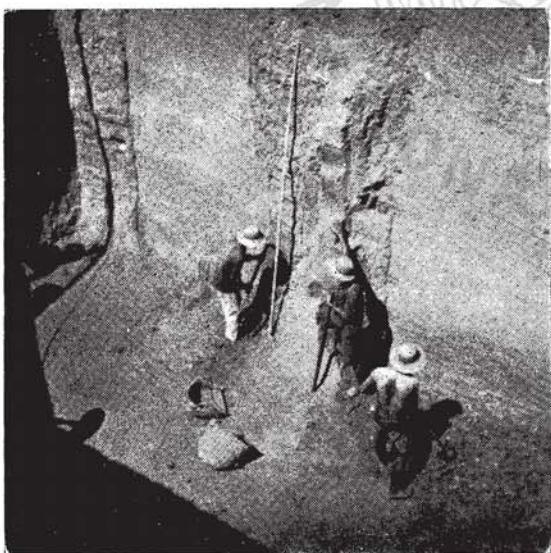


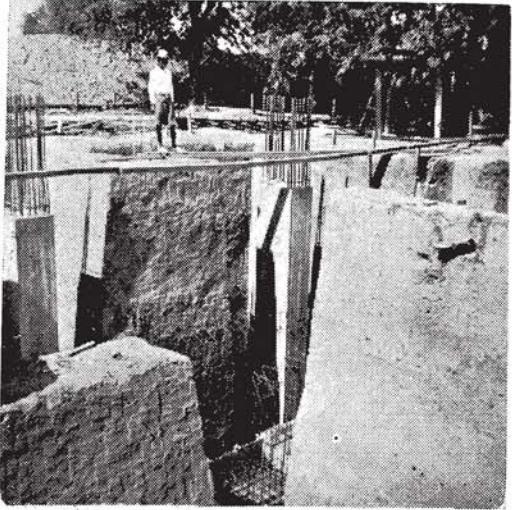




การขุดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)

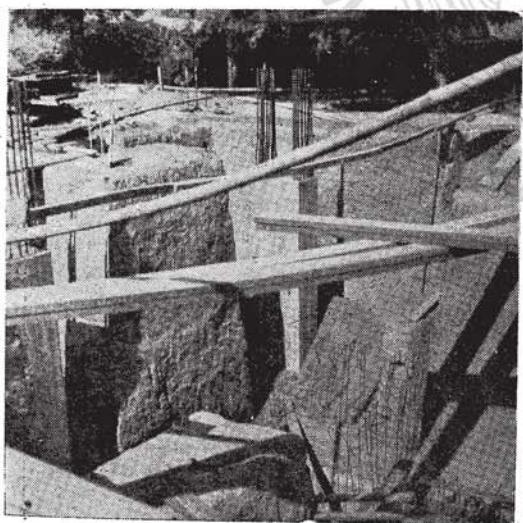

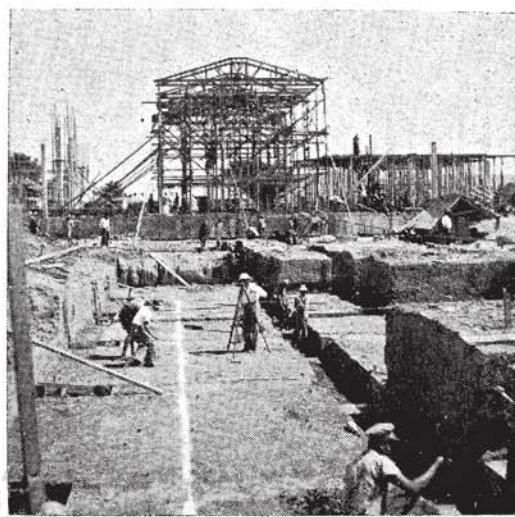


การขุดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)

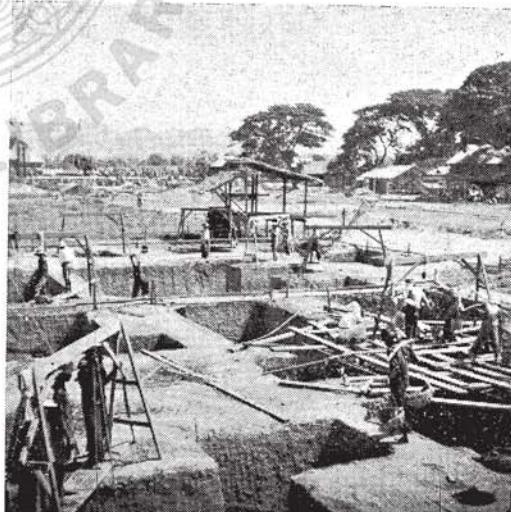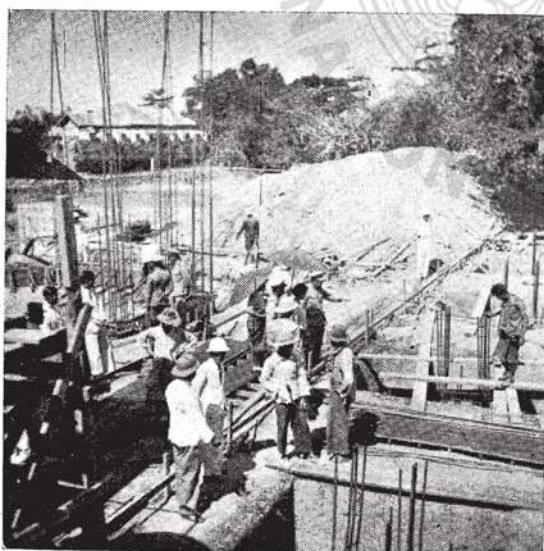

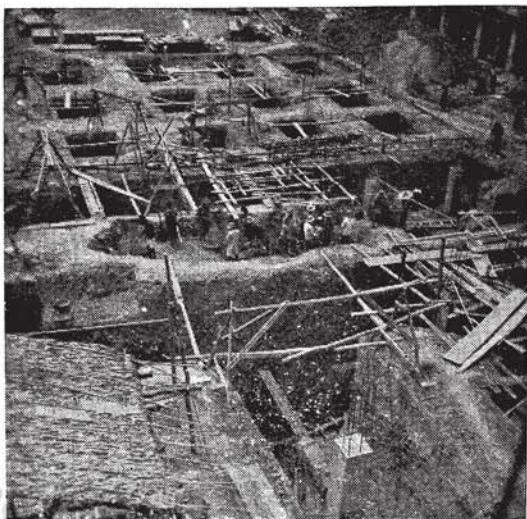
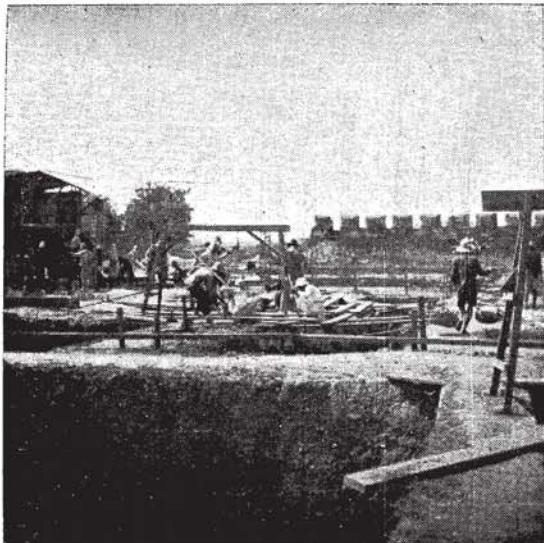



การขุดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)




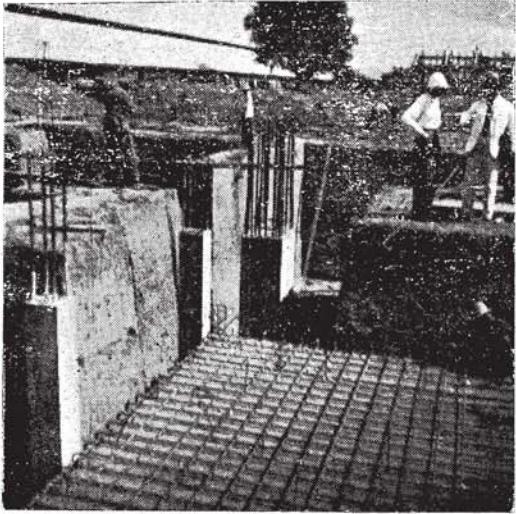






การขุดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)

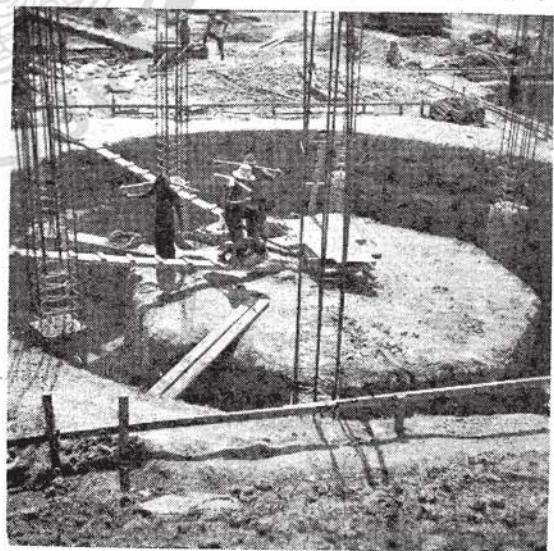
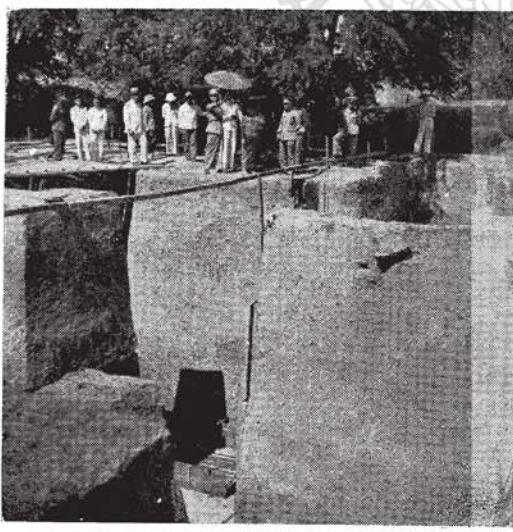


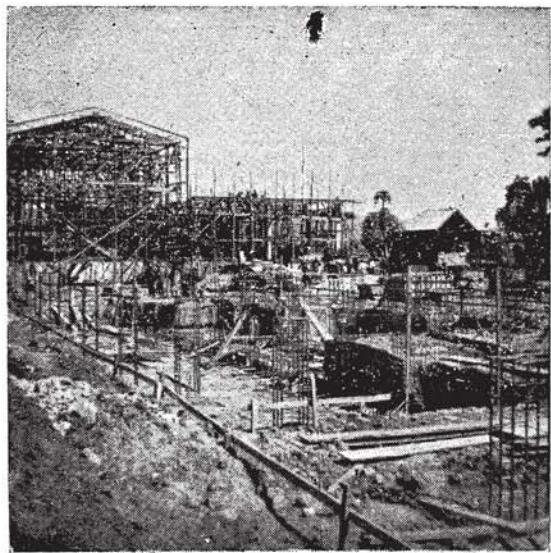



การขาดและสร้างรากฐาน (ลึก 5.50 เมตร)


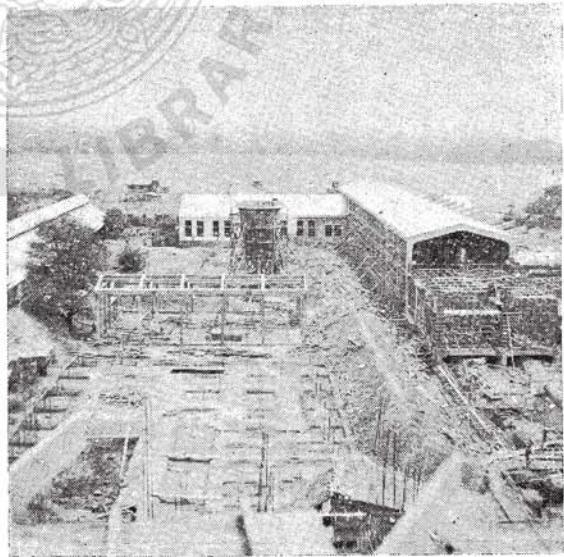
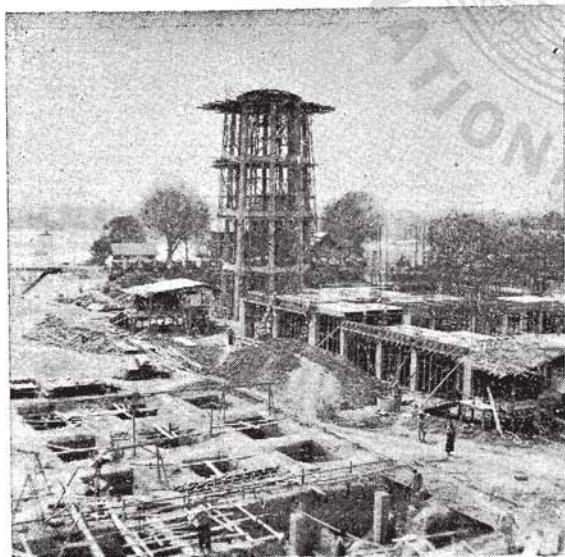


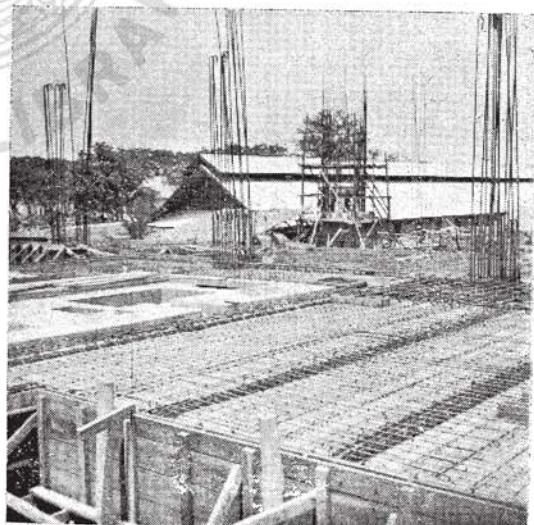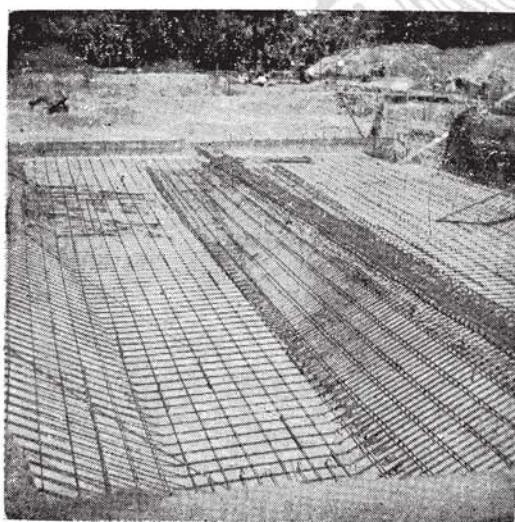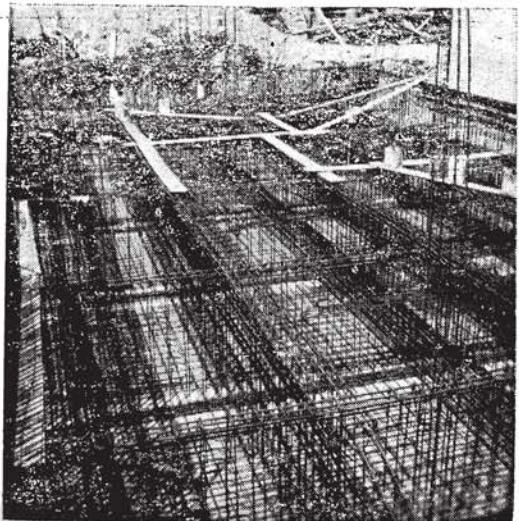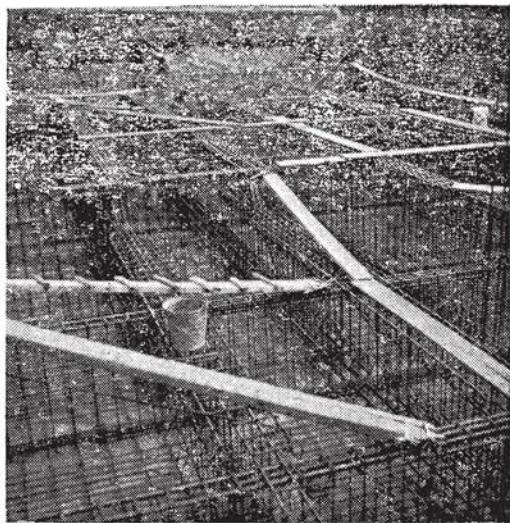


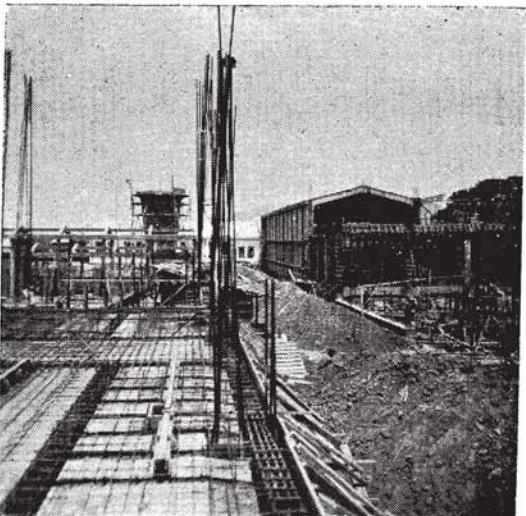
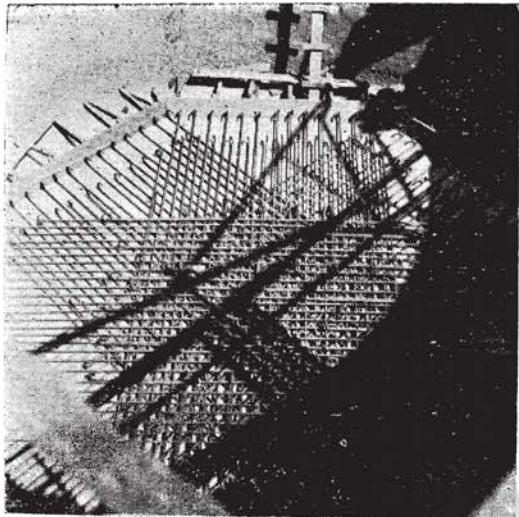



การผูกโครงเหล็ก

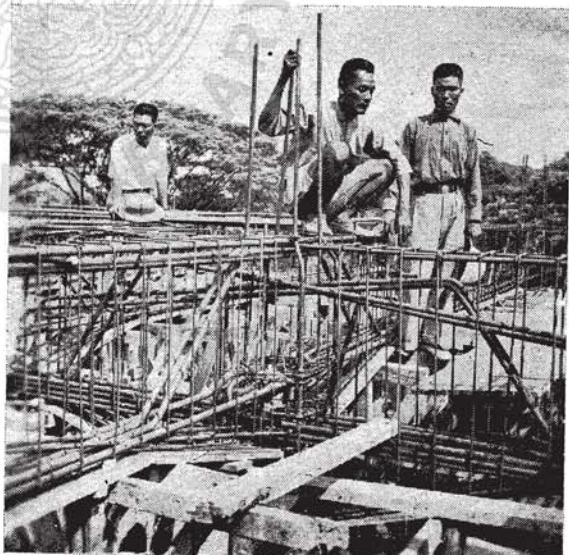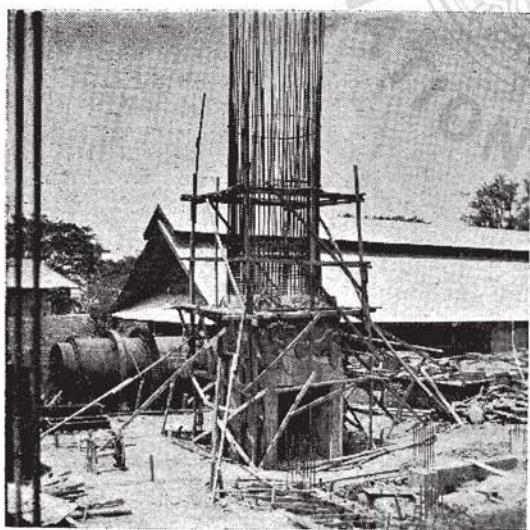

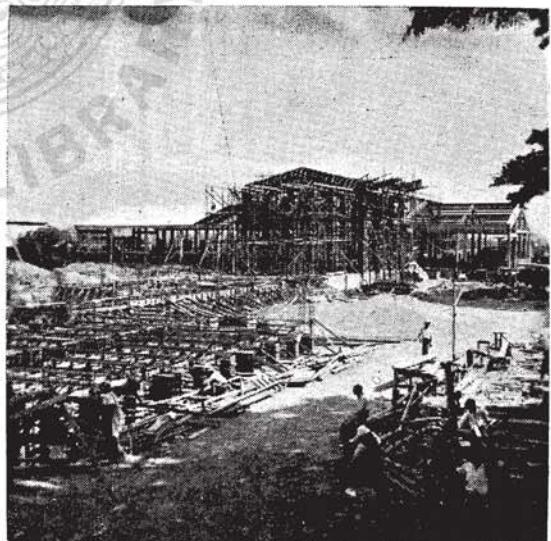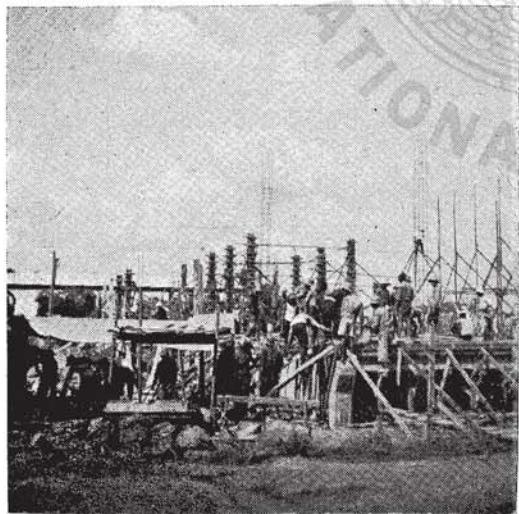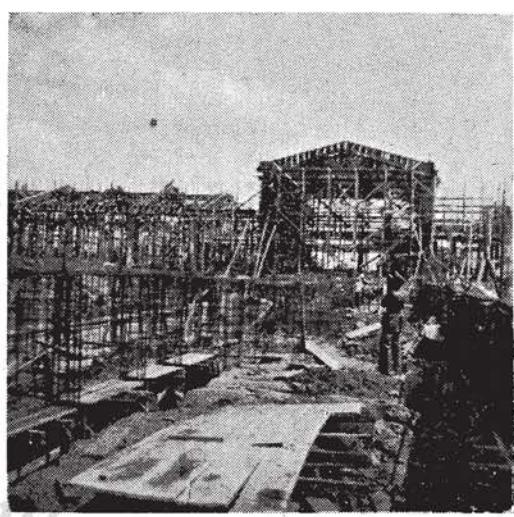






ព្រះរាជាណាចក្រ[®]

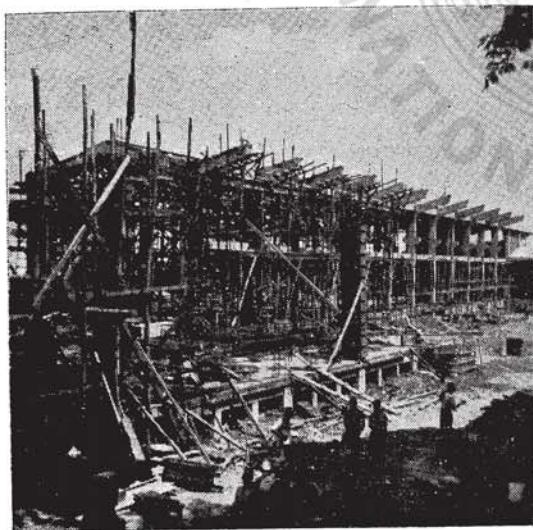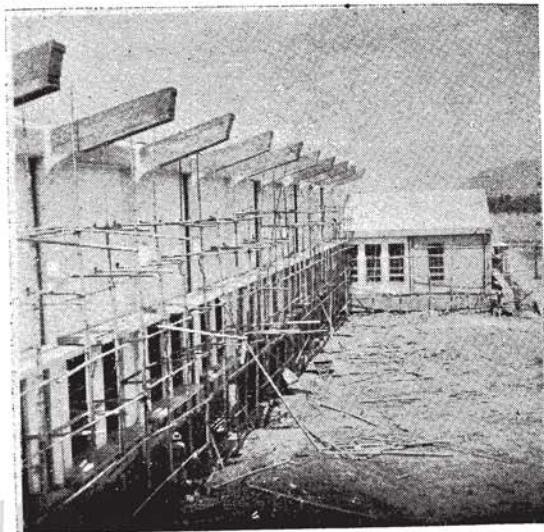
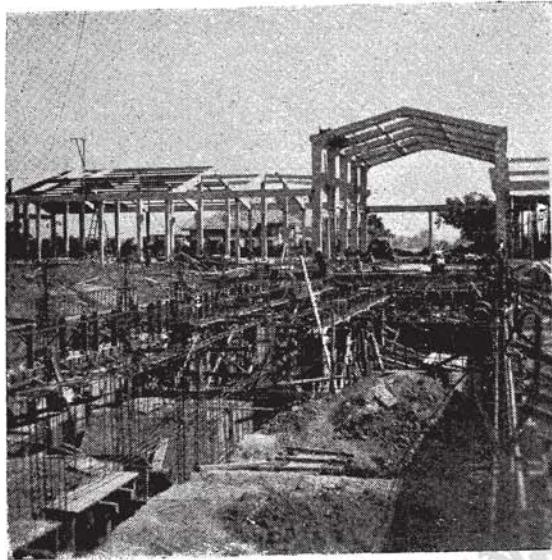


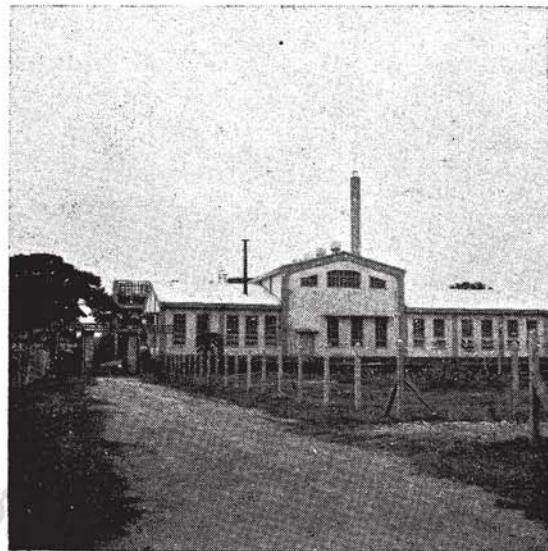



โรงทำกระดาษ


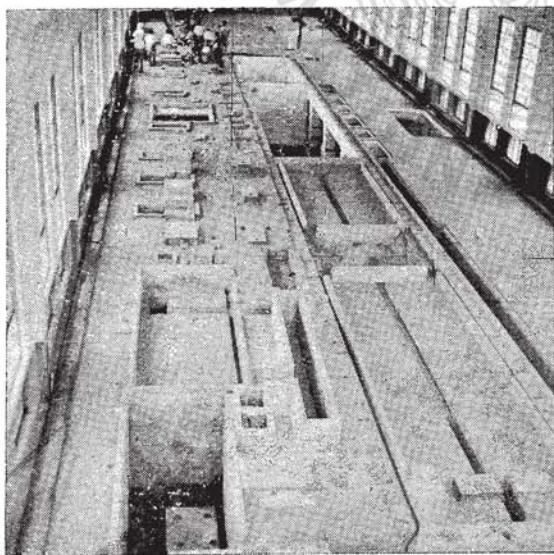


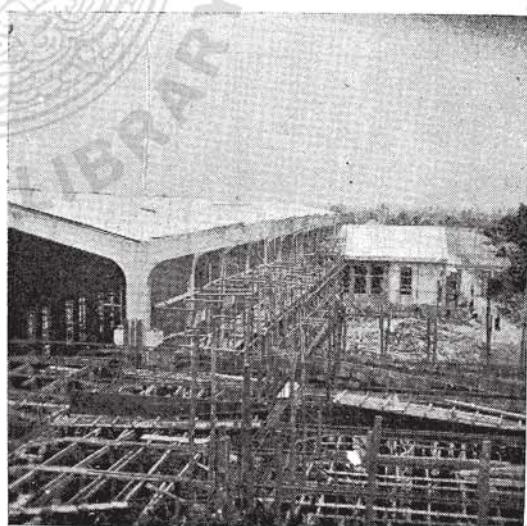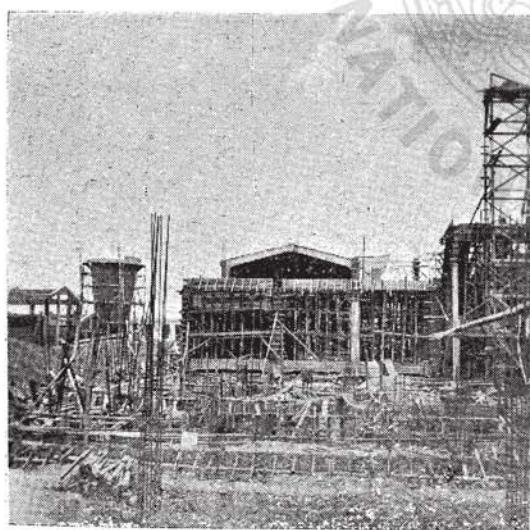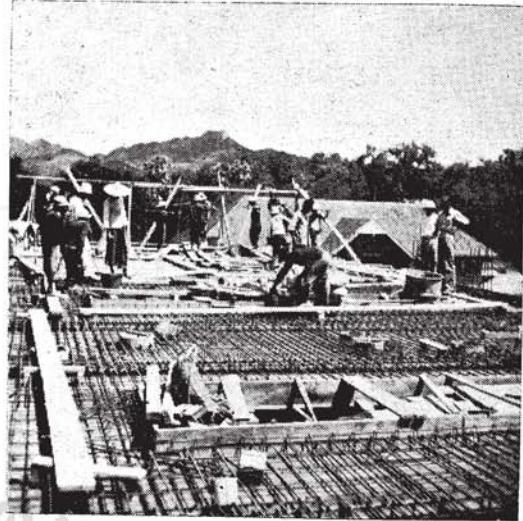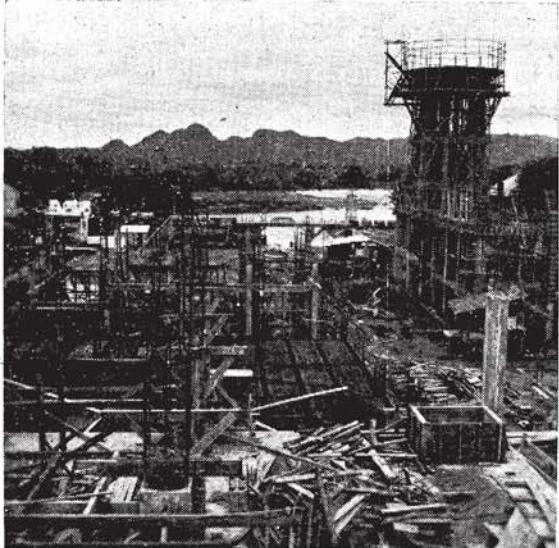

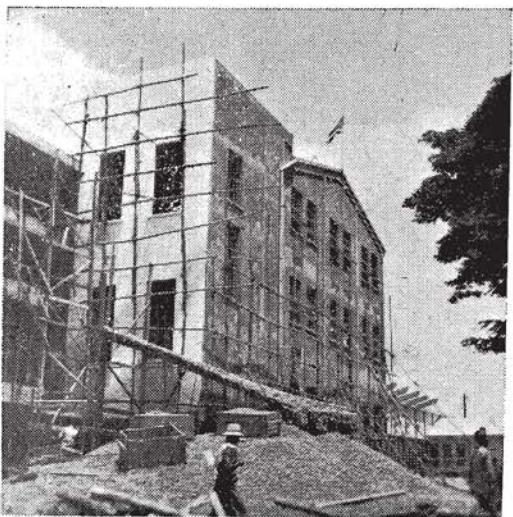
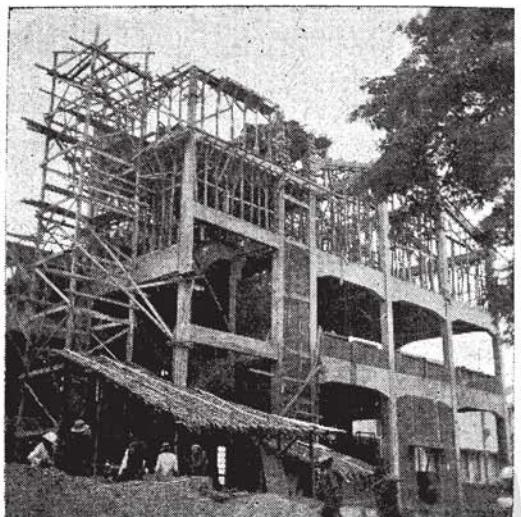




ໂຮງທ່າເບືອ

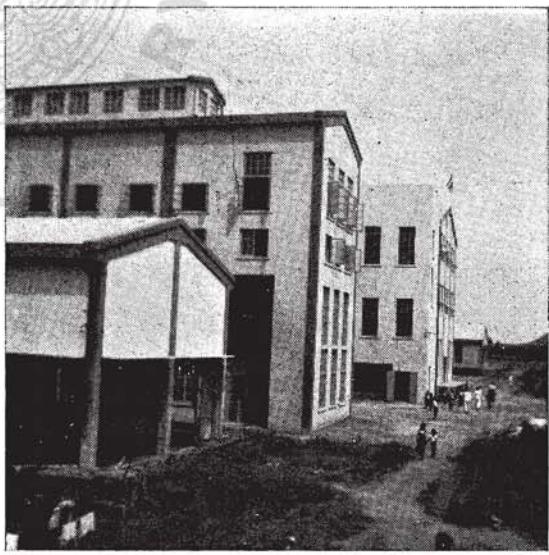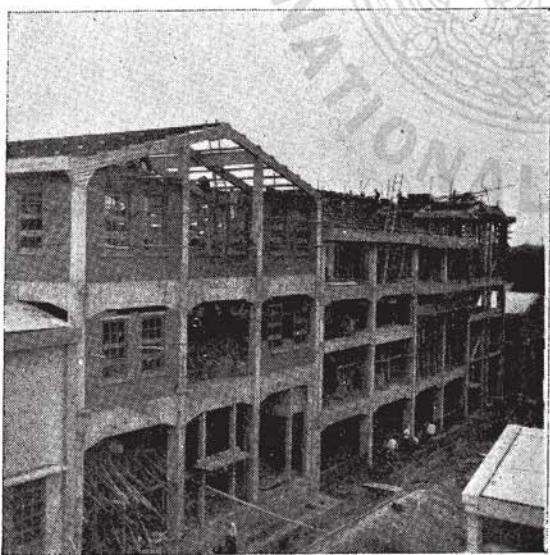

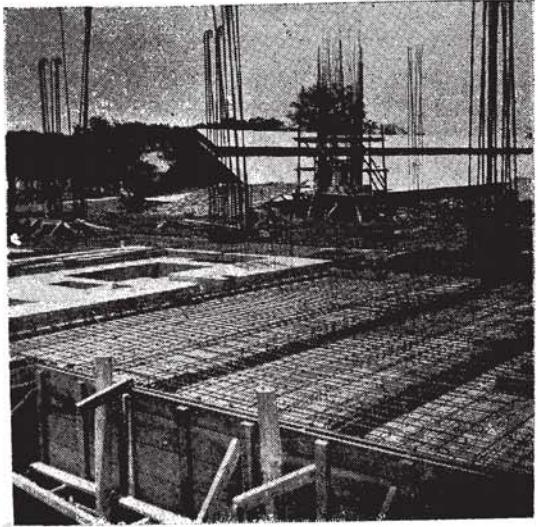
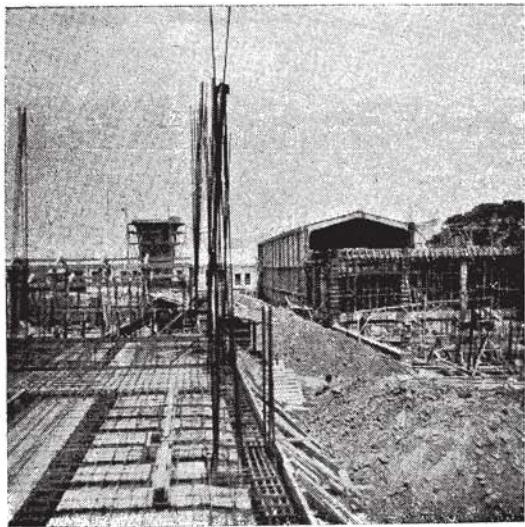




โรงทำไฟฟ้า

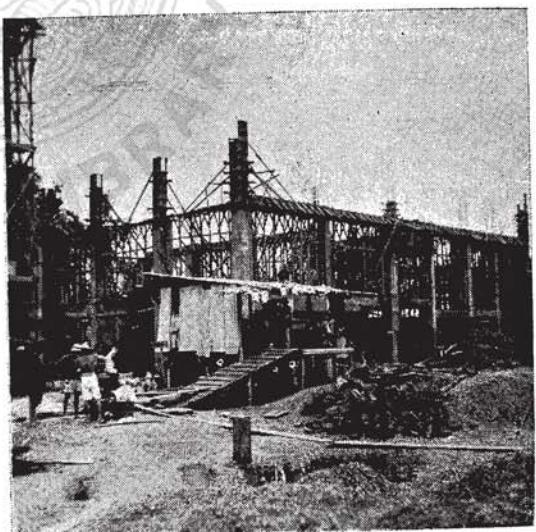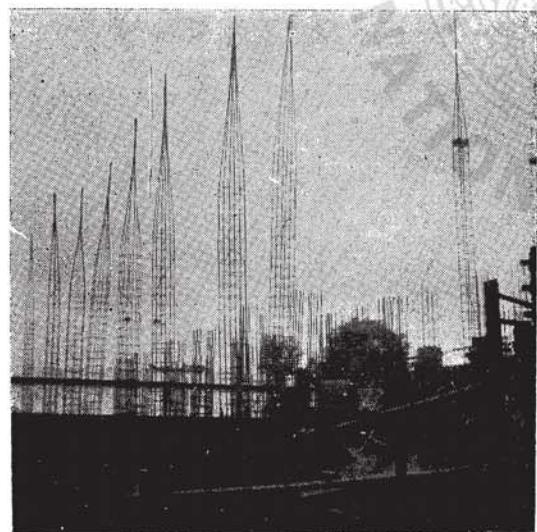

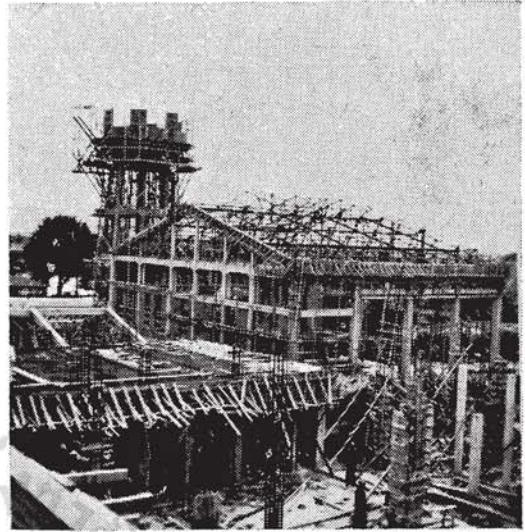
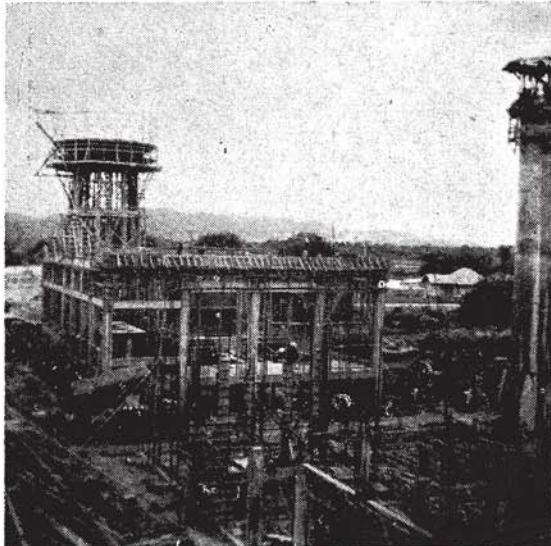




โรงทำไฟฟ้า

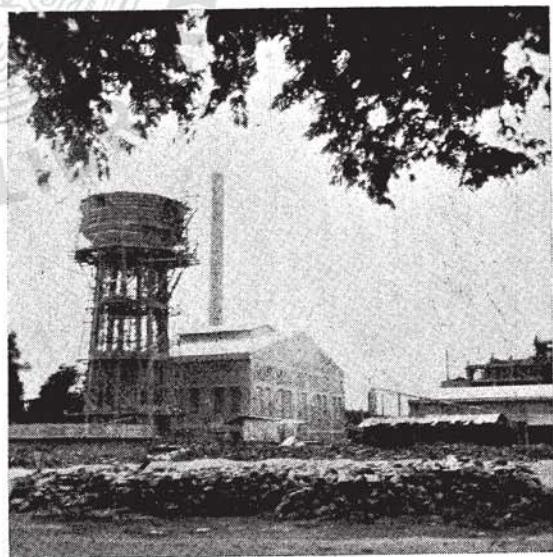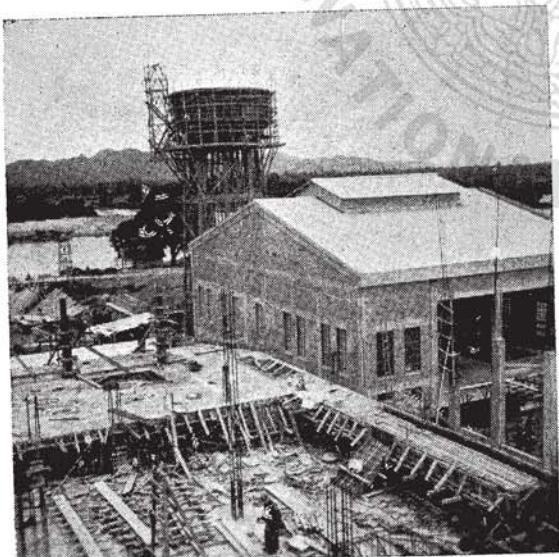

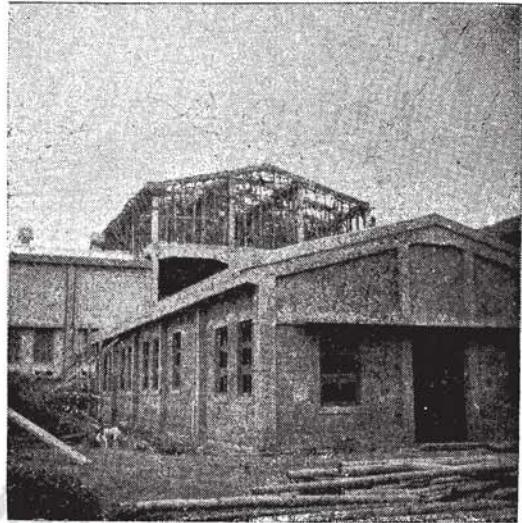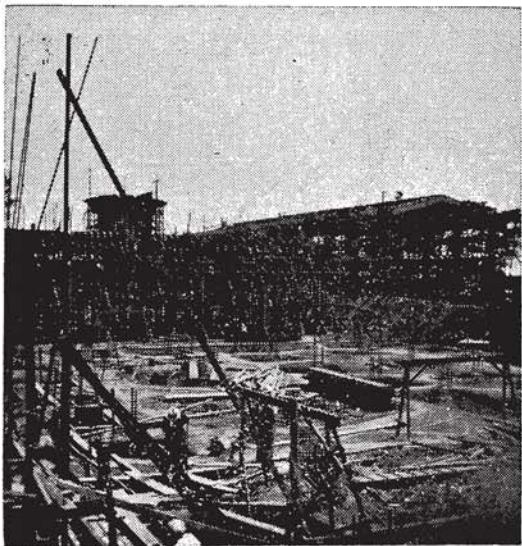





โรงทำโคลริน


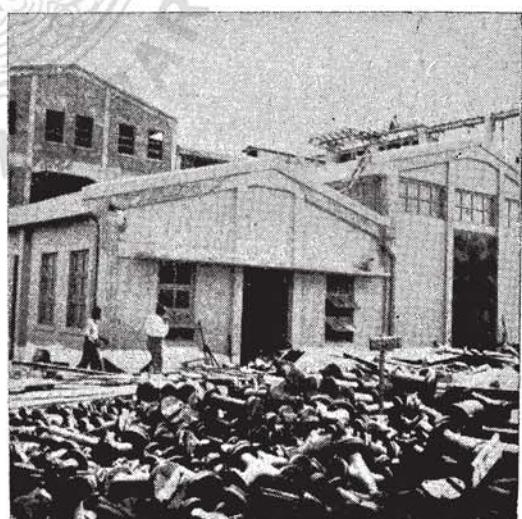
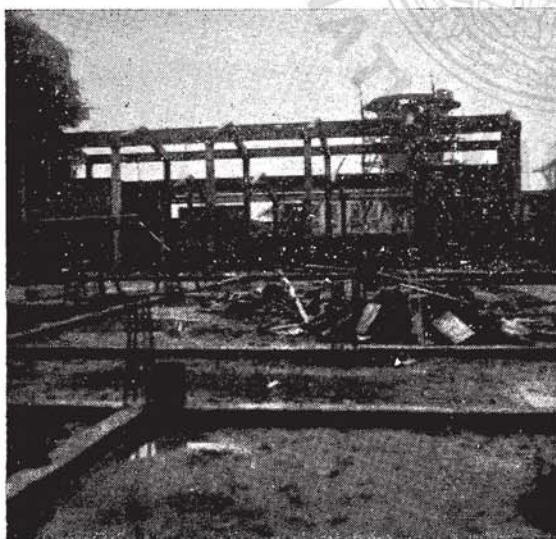


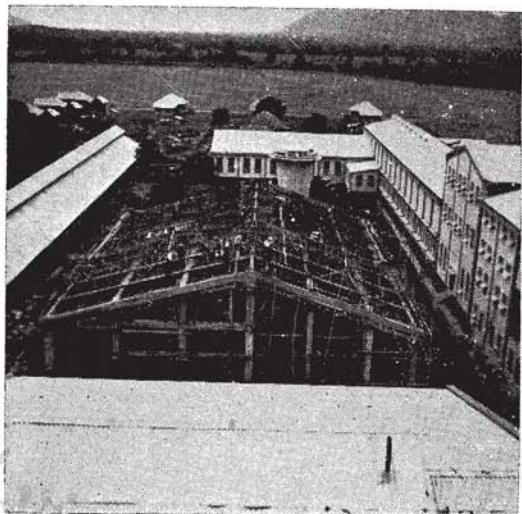
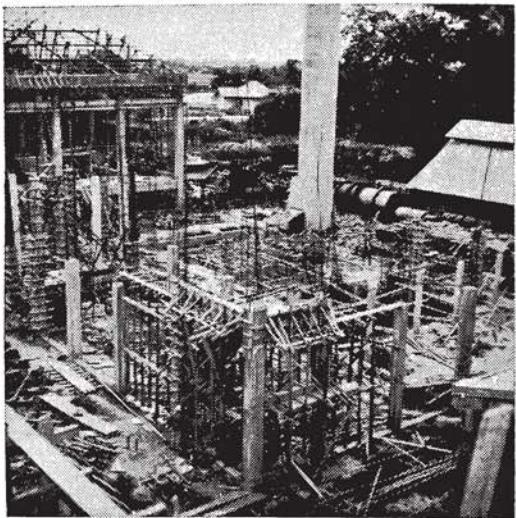





โรงทำโซดากรับคุน



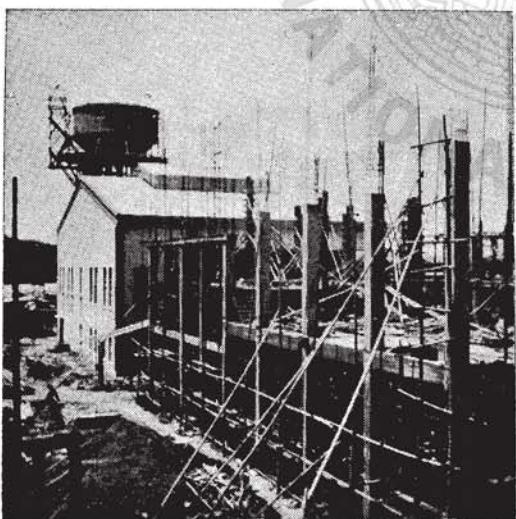



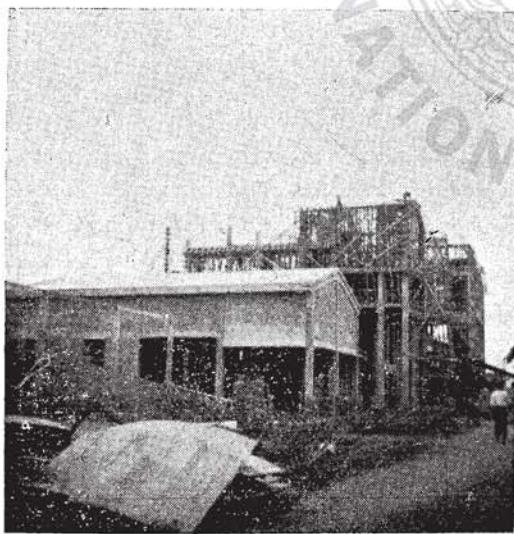
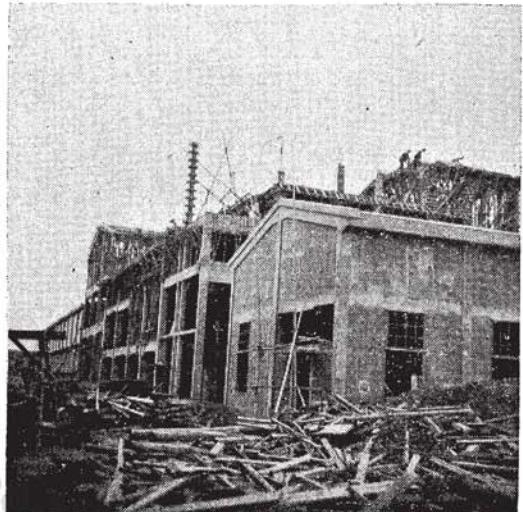
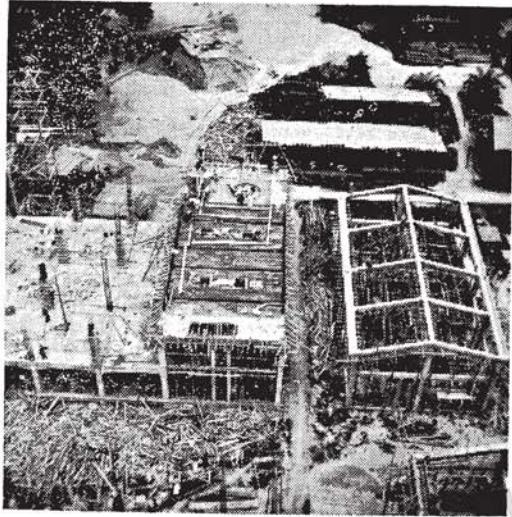



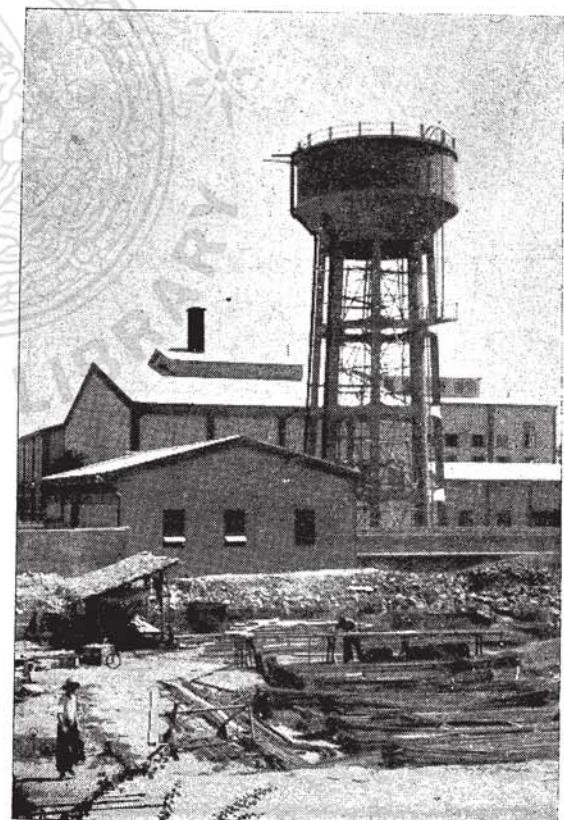
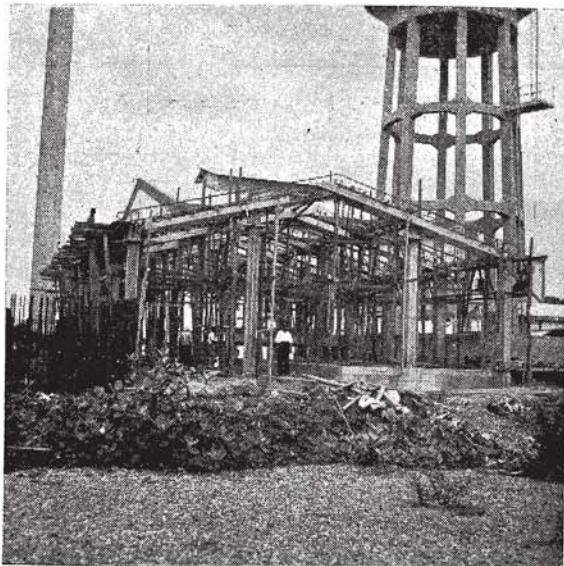
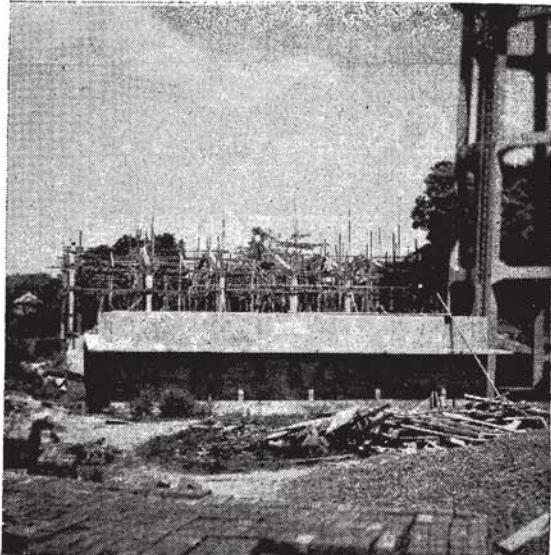


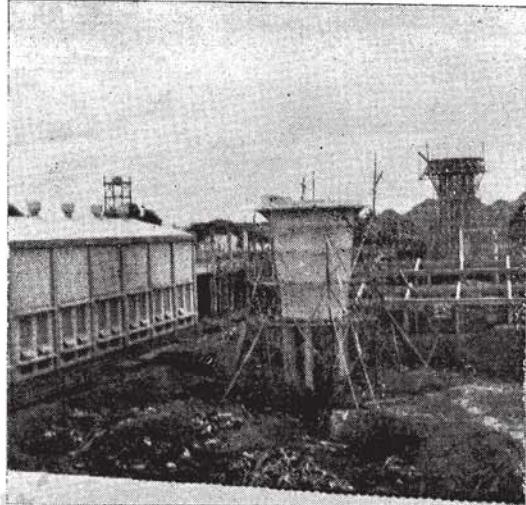
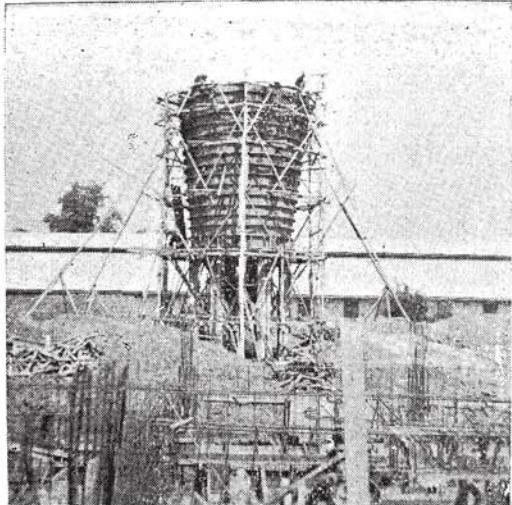


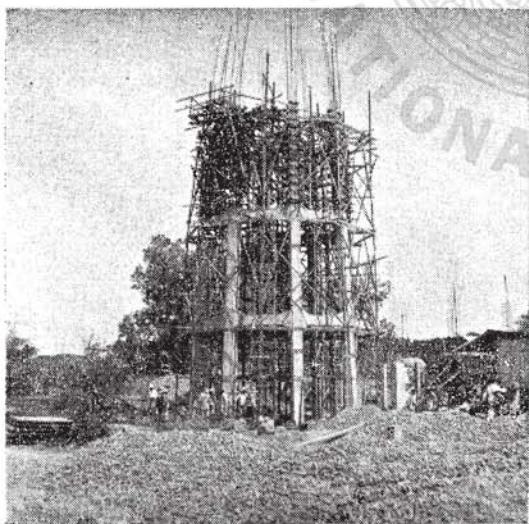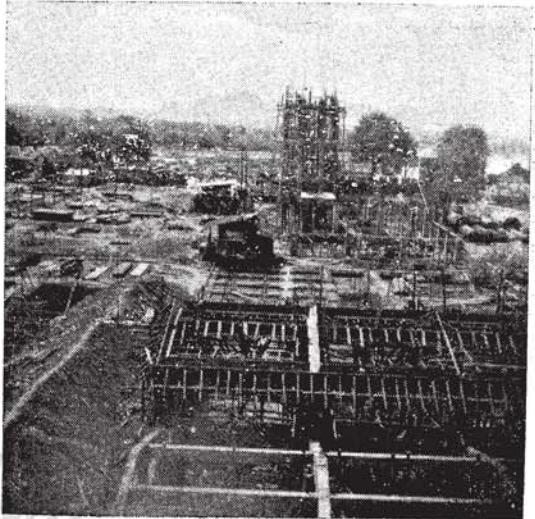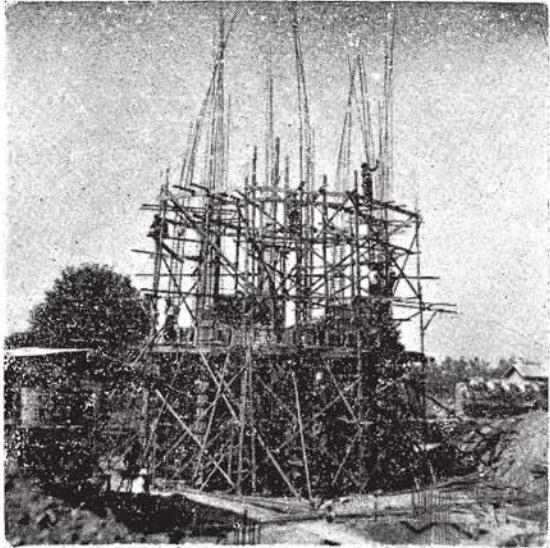

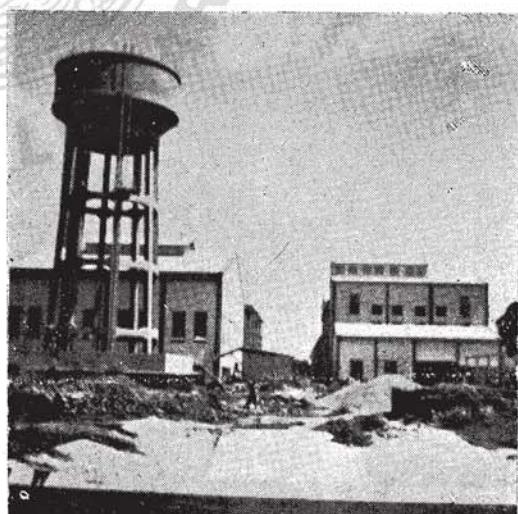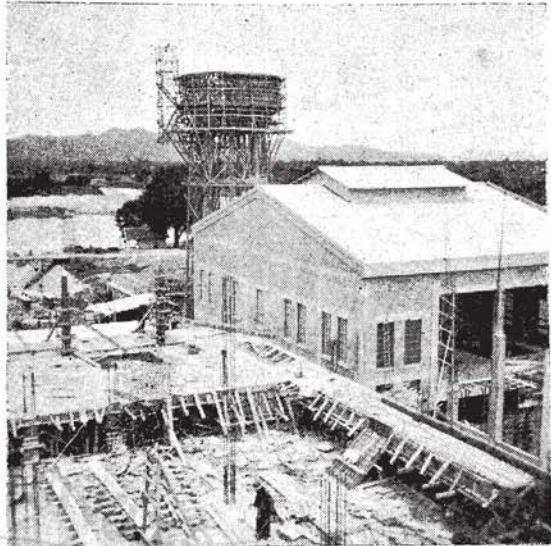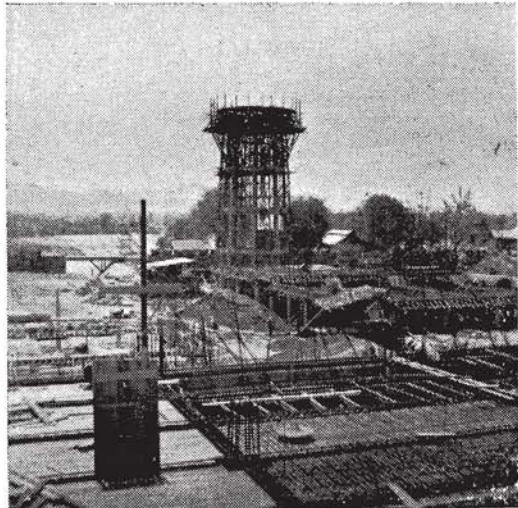

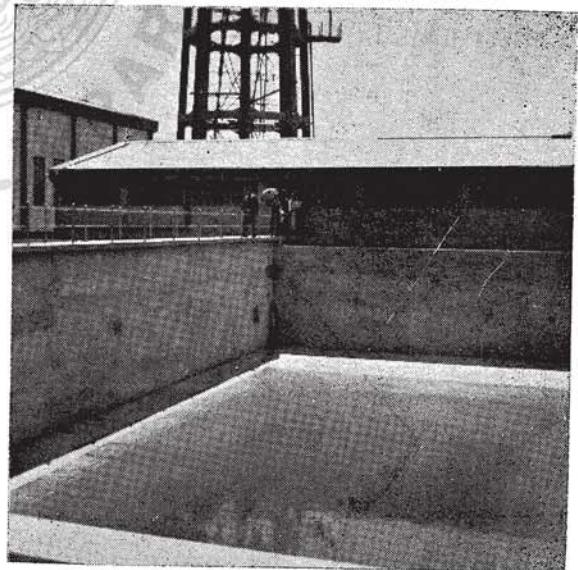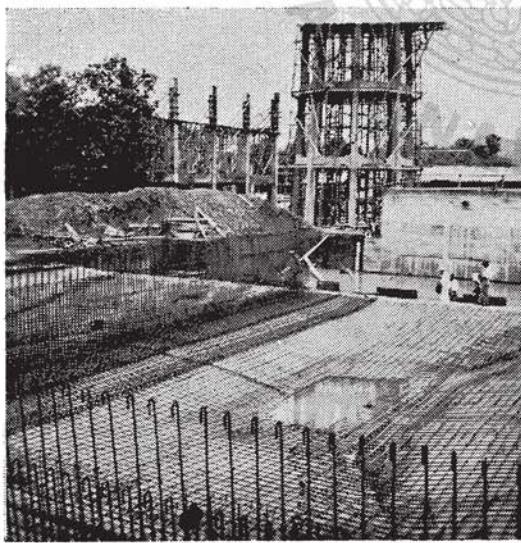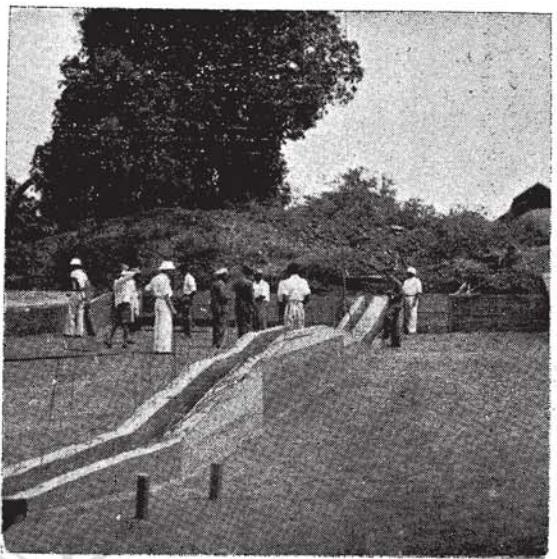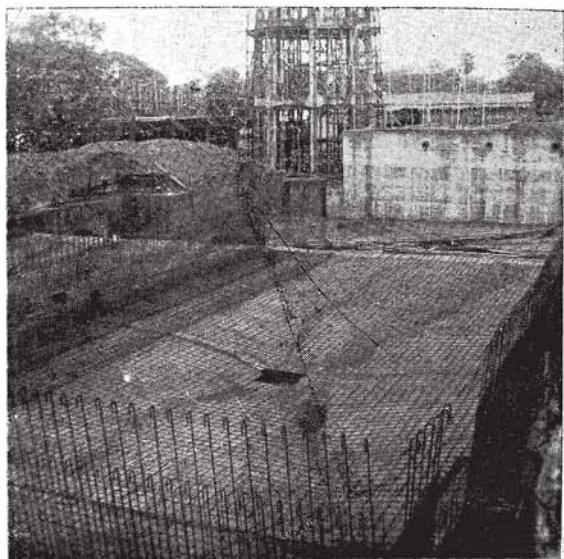


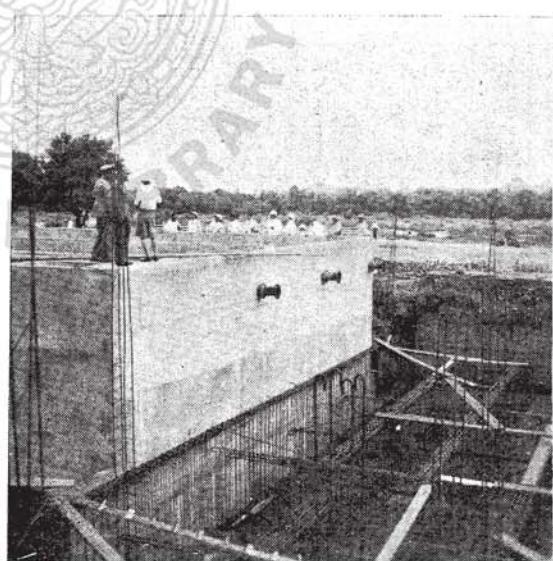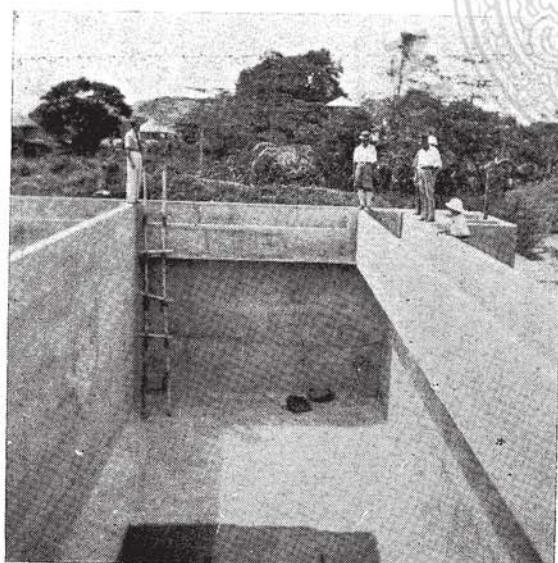
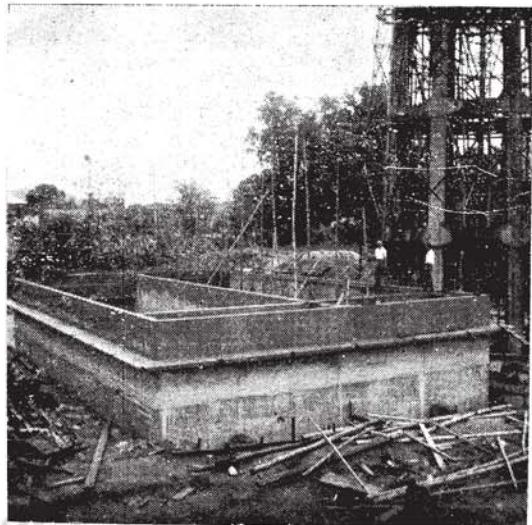
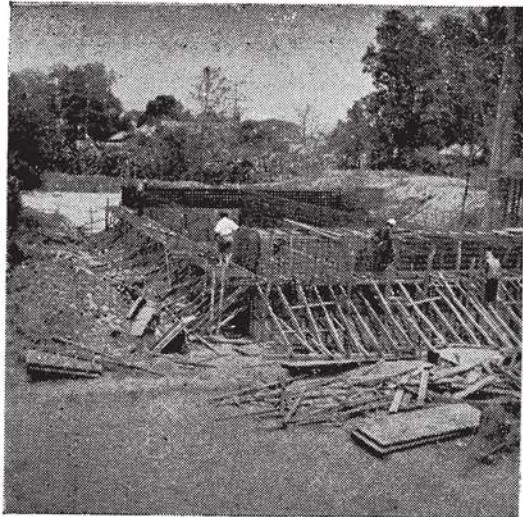


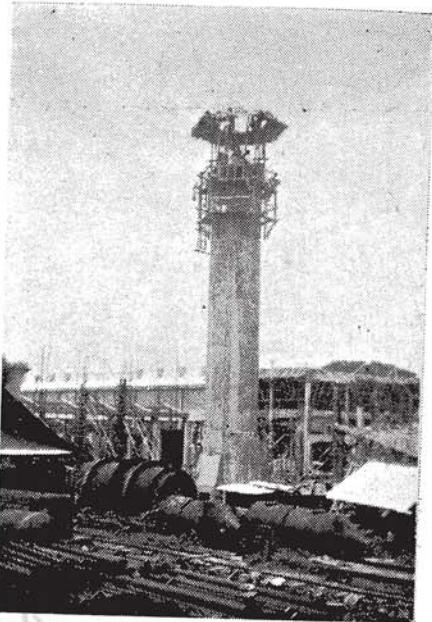
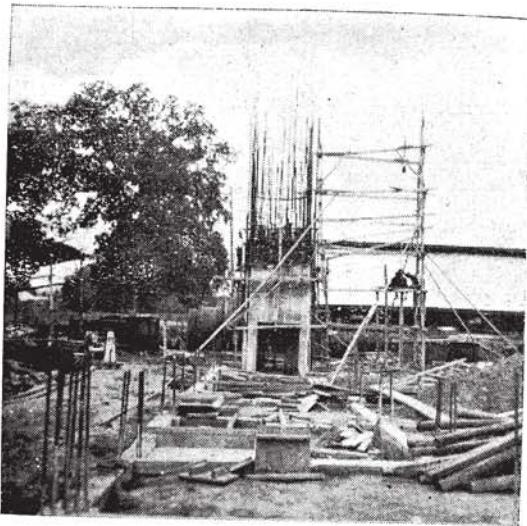


ห้องแม่แตงชาติ



ปล่องไฟ

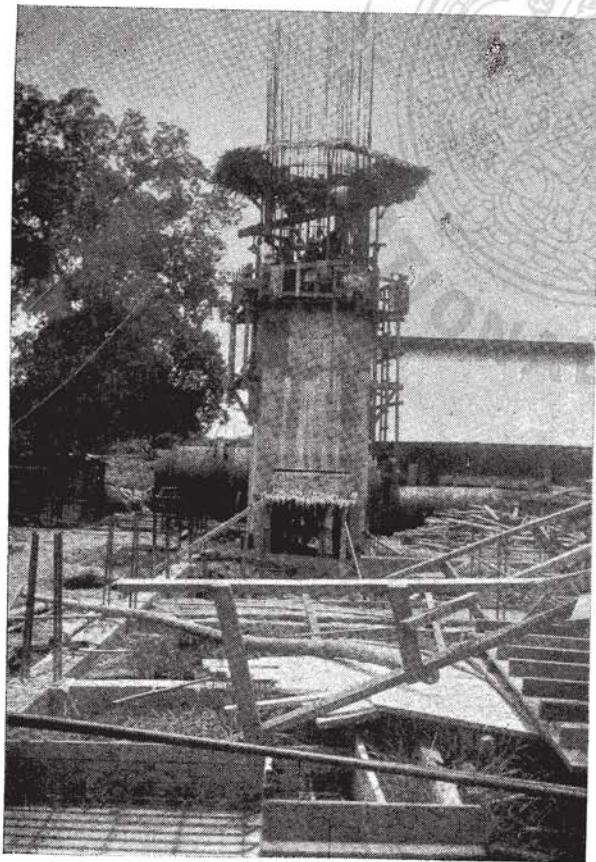

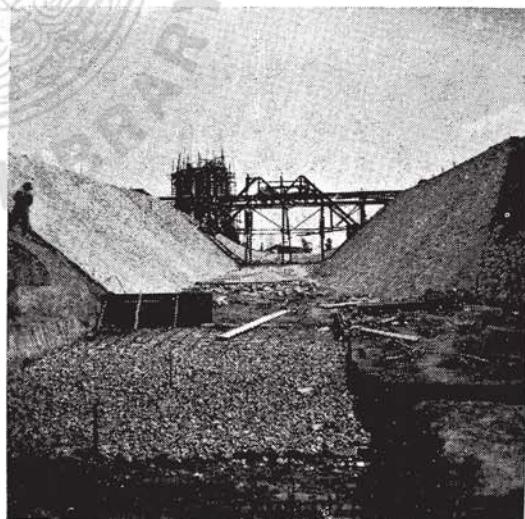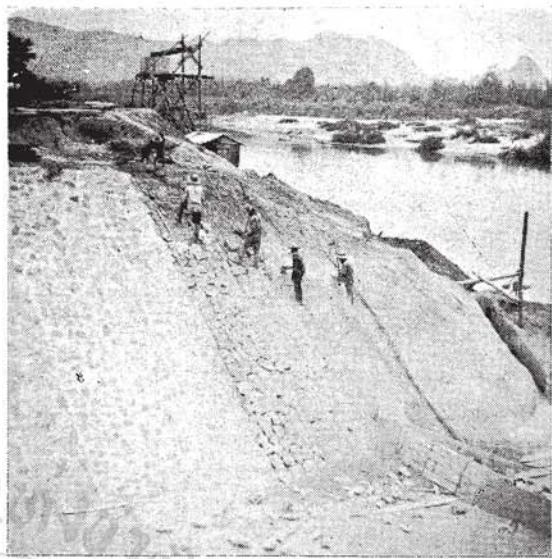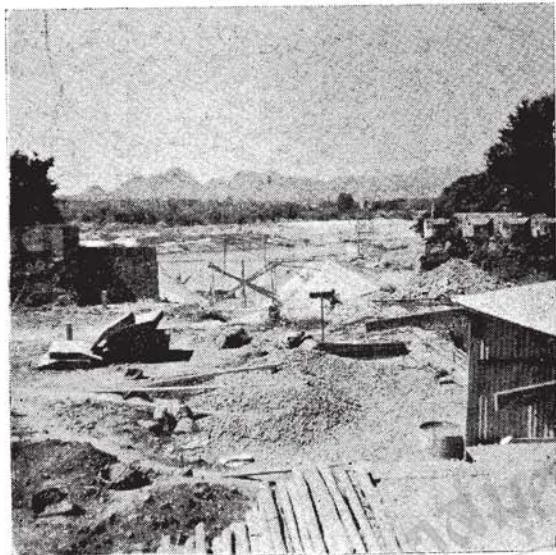

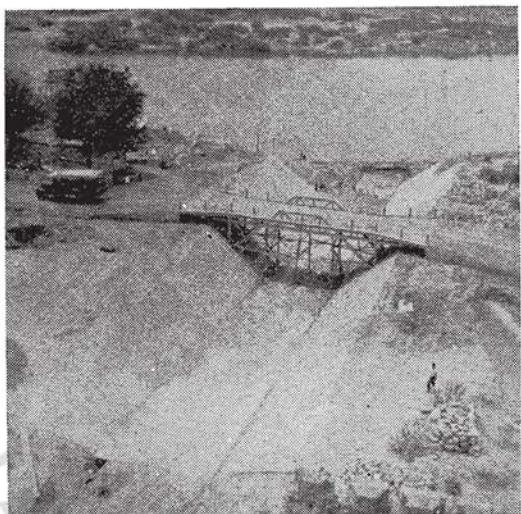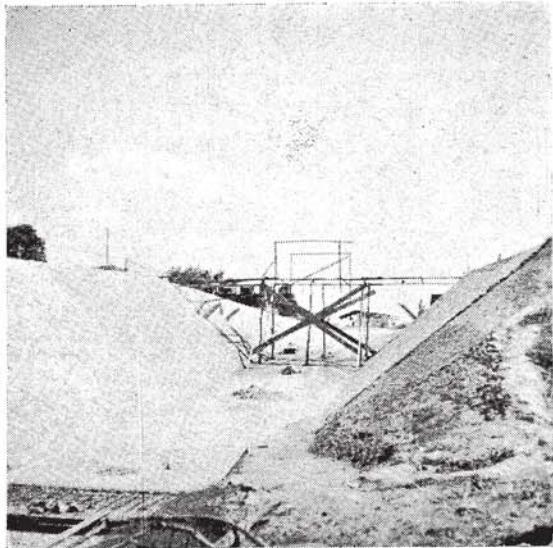


ทางน้ำมีชีวิต

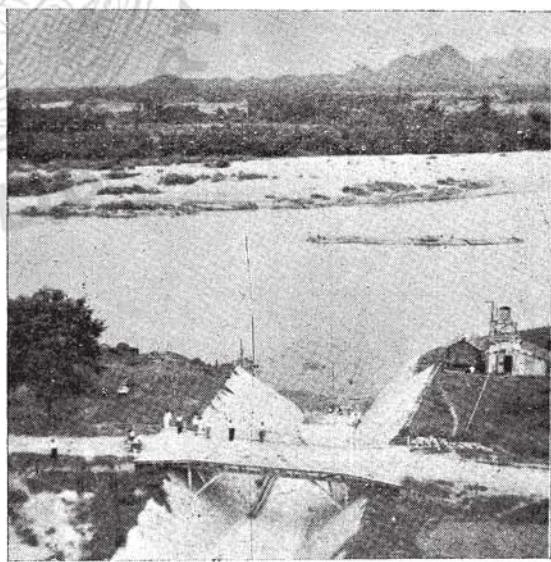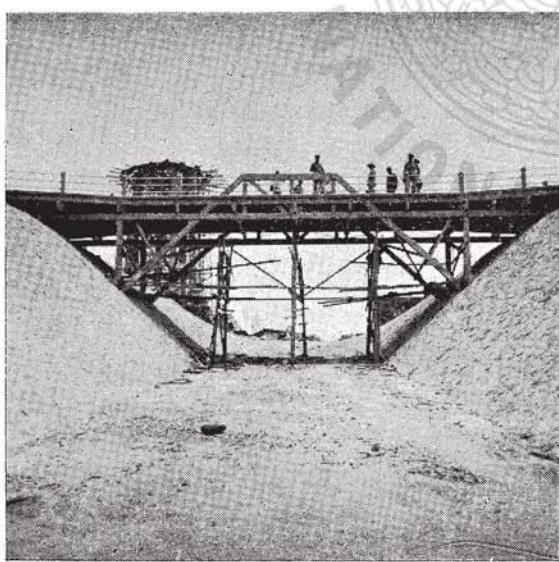




การสร้างโรงสูบน้ำจากแม่น้ำ (ลักษณะพนระดับบัน 14.50 เมตร)


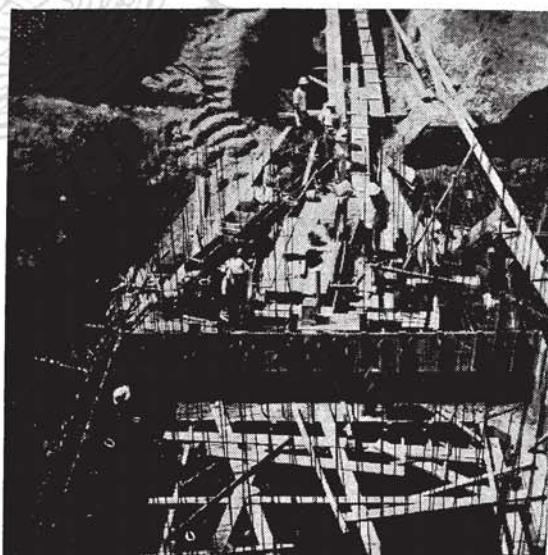


ເຄຣອງຈັກ

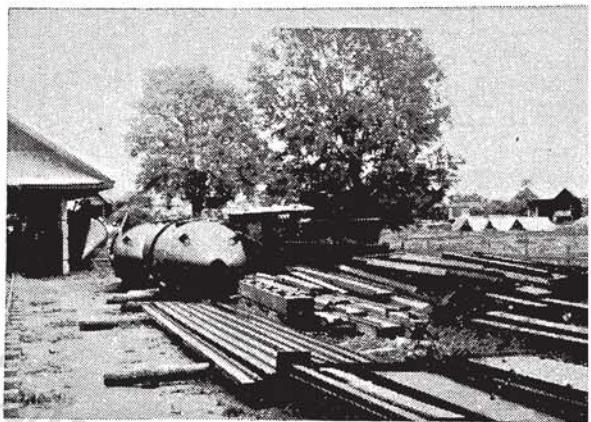



ຮ່ວມມານີ້ເຄຣອງຈັກ

ກອງເຄຣອງຈັກ

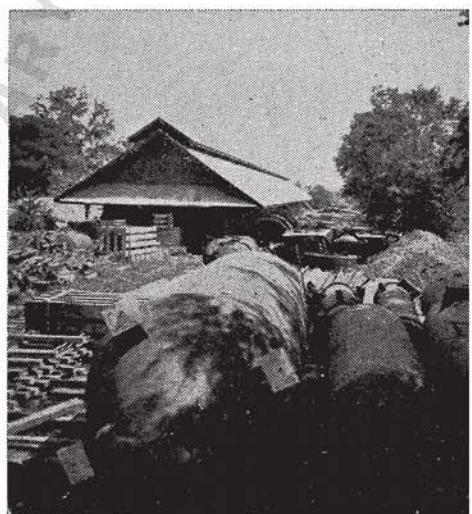
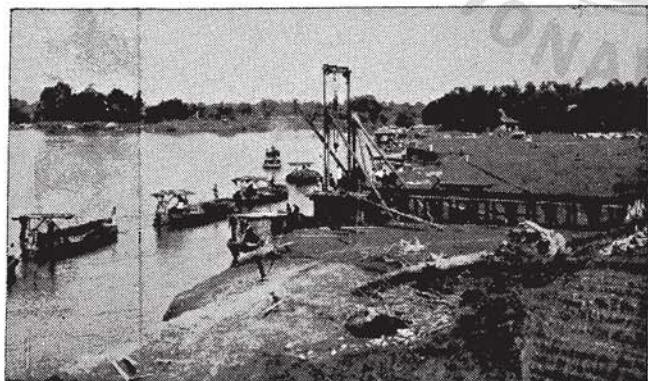




ທ່າງນາມເຄຣອງຈັກ

ທີ່ພົກເຄຣອງຈັກ

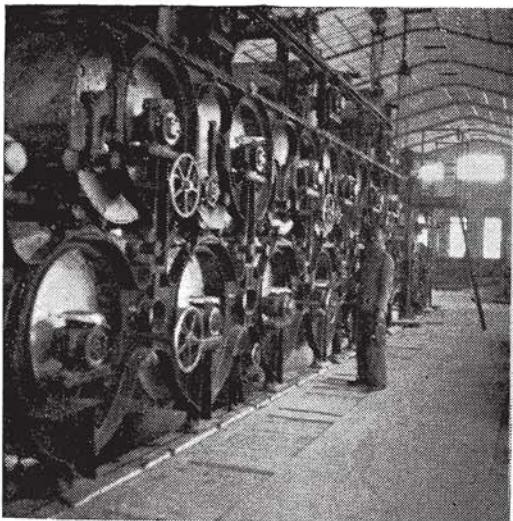
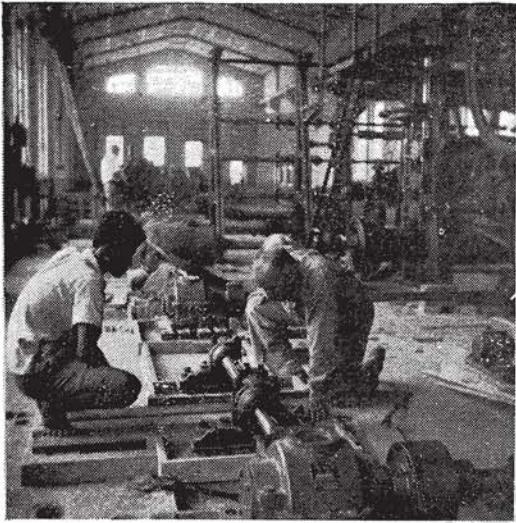



การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานกระดาษ

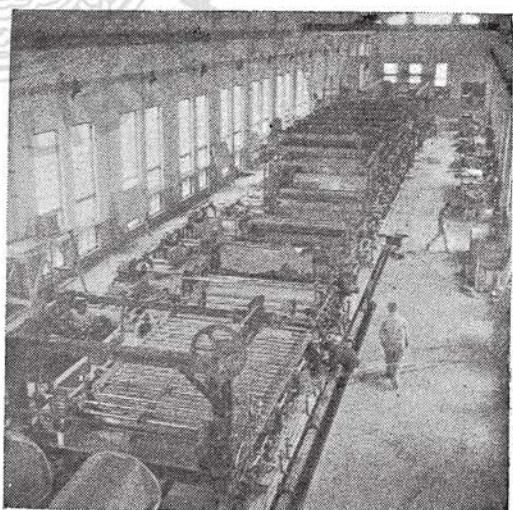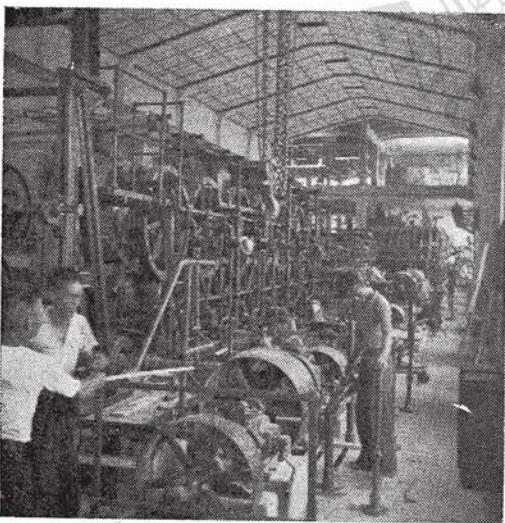

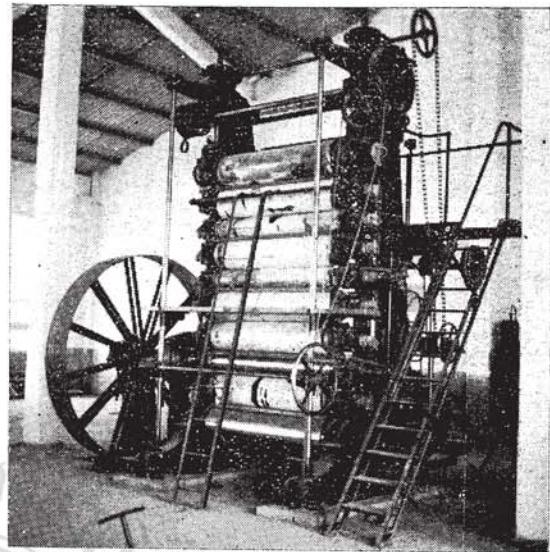
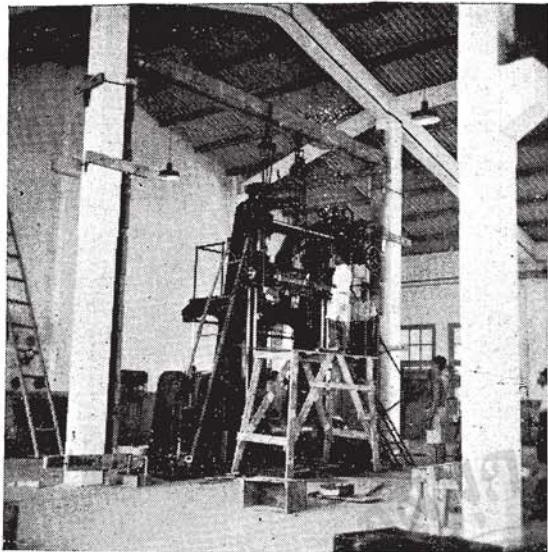




การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานข้าวและตัดกระดาษ

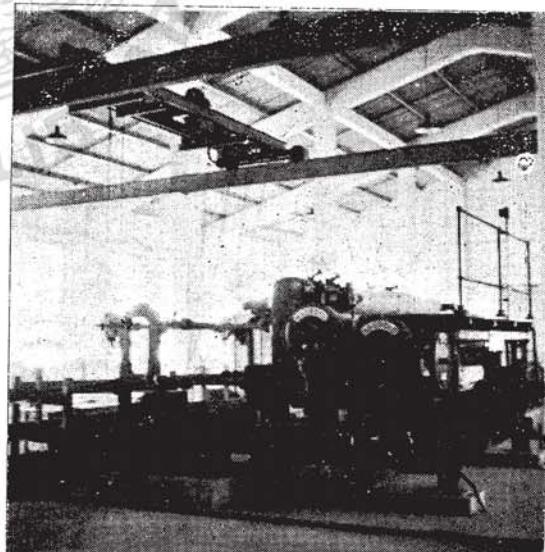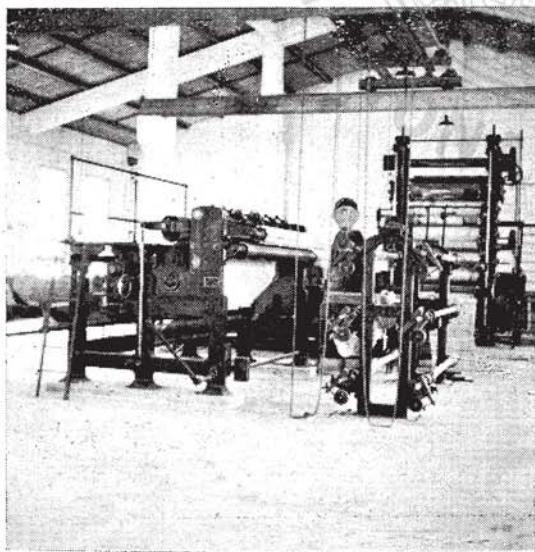


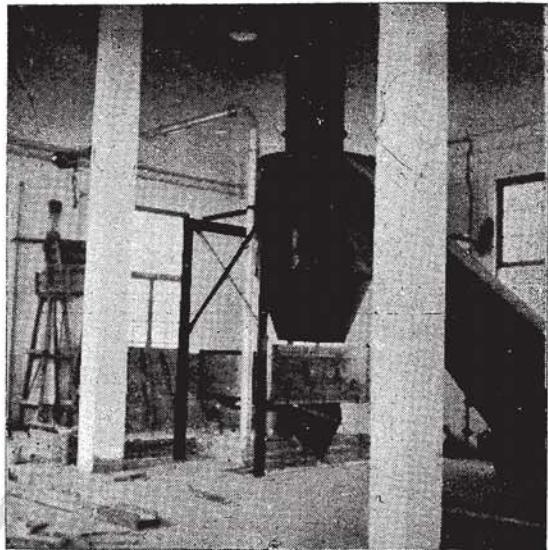




การคิดตั้งเครื่องจักร ในโรงงานไม้ไผ่

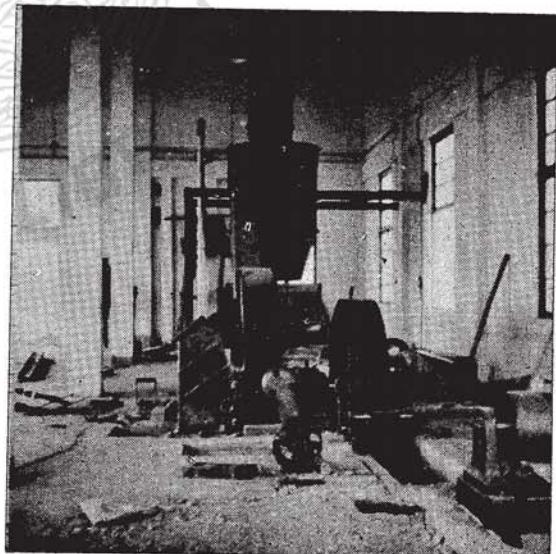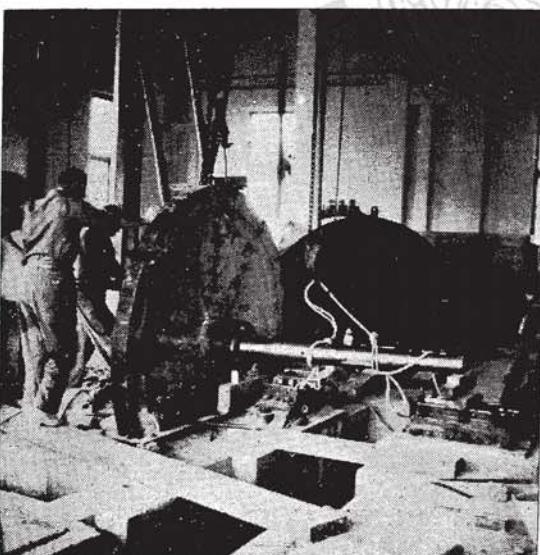

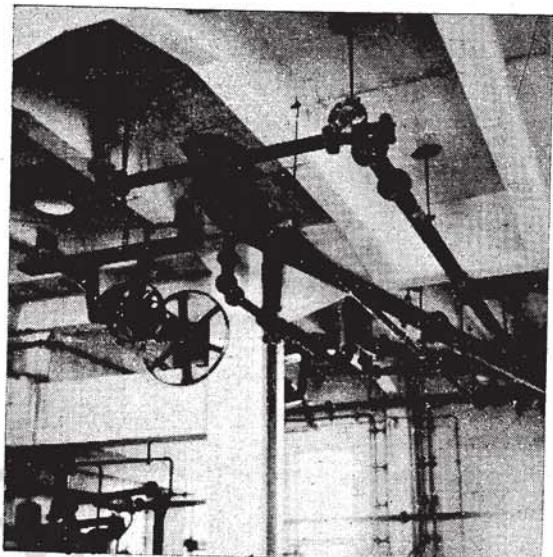
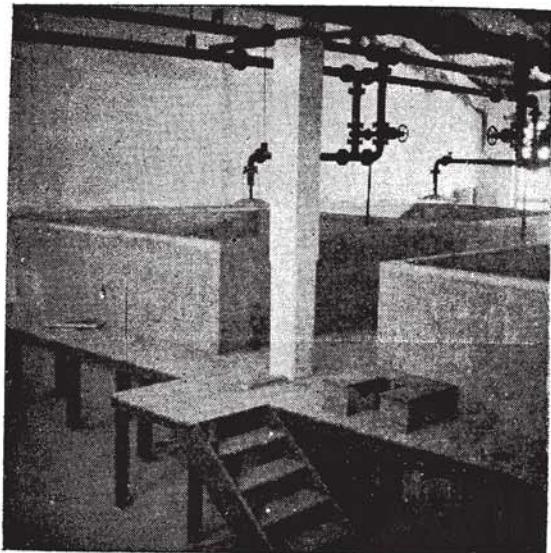






การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเยื่อ

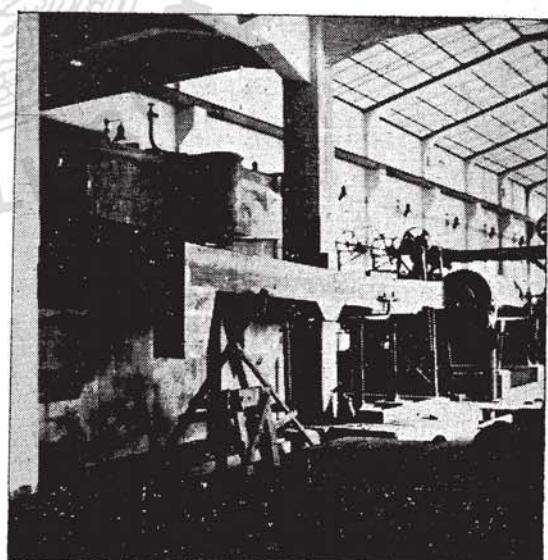
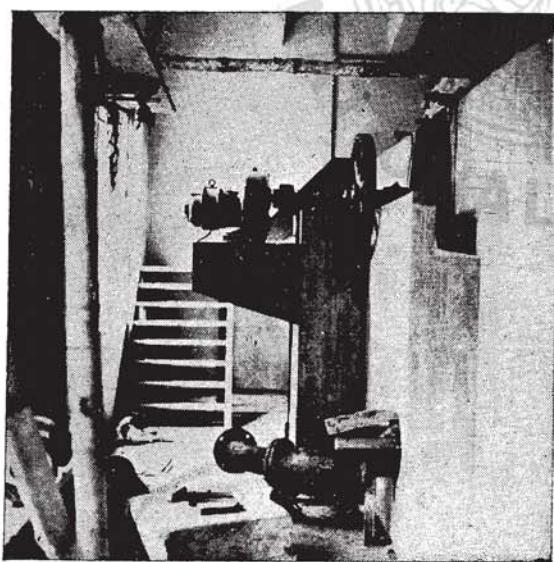


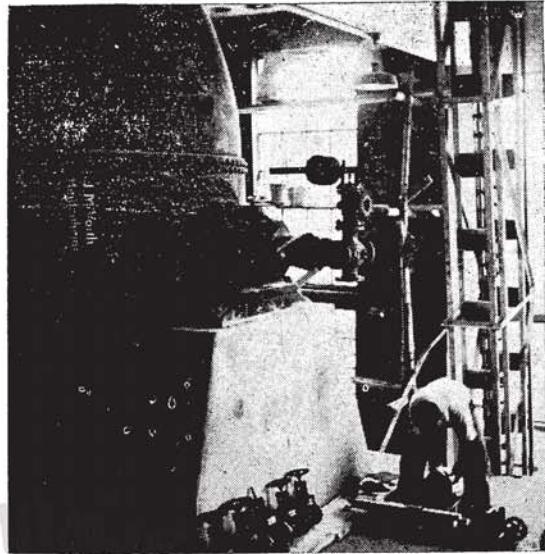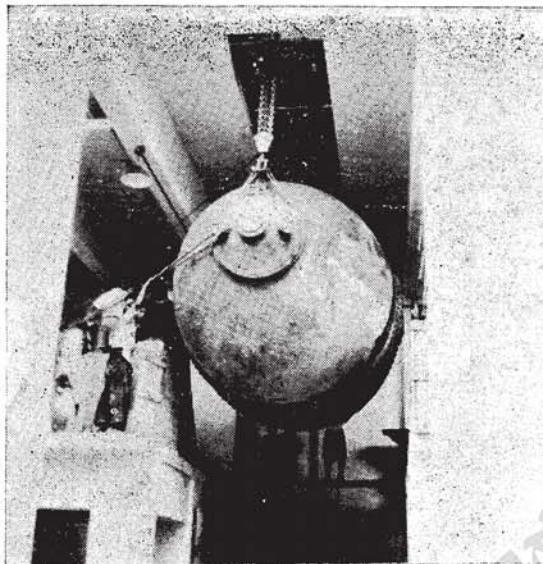



การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานท่าเบ่อ

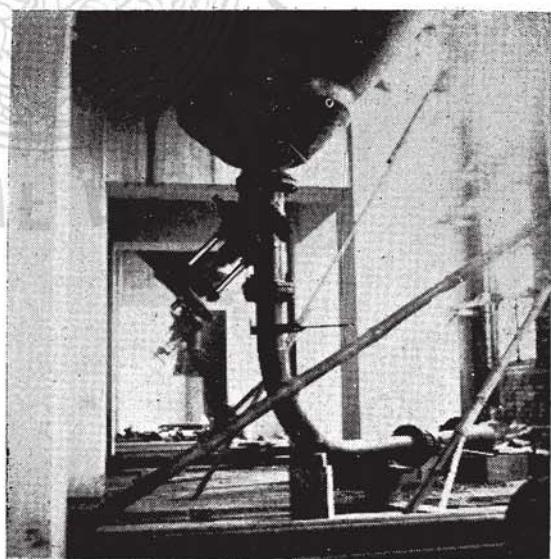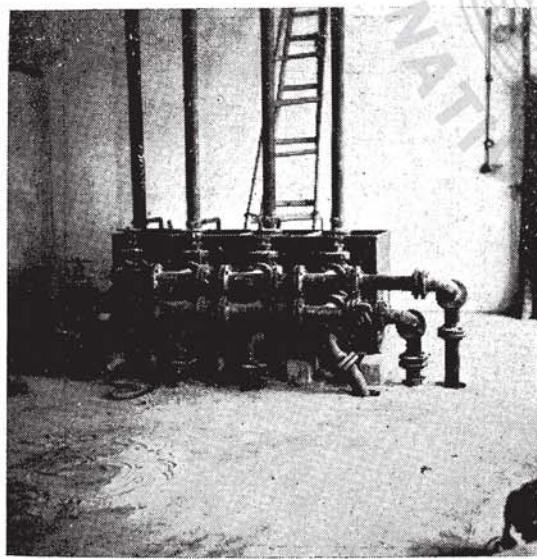

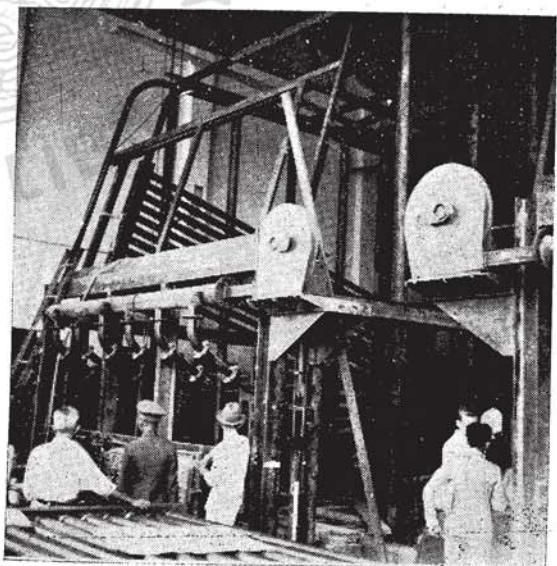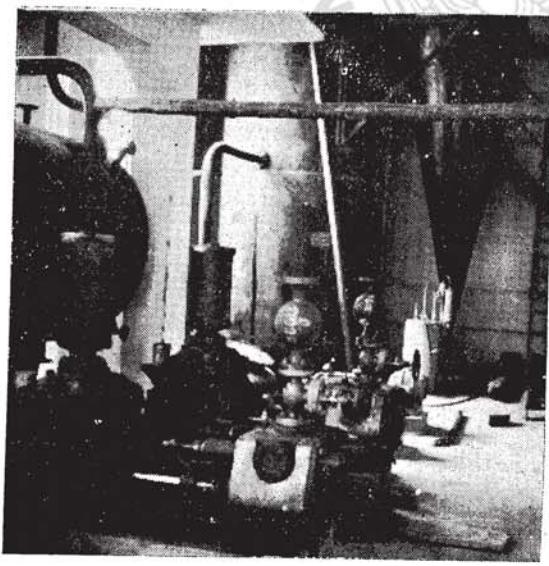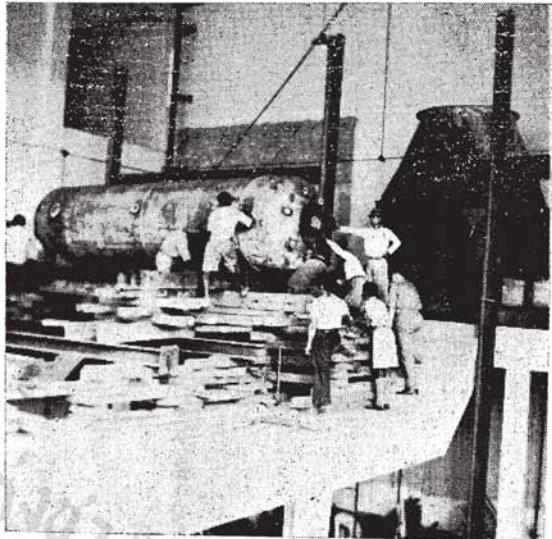
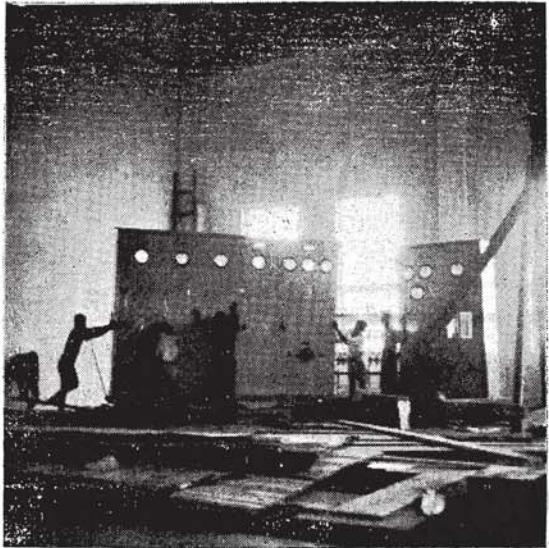


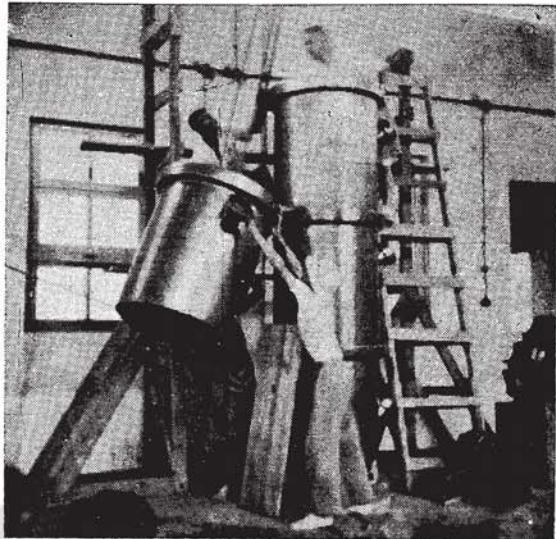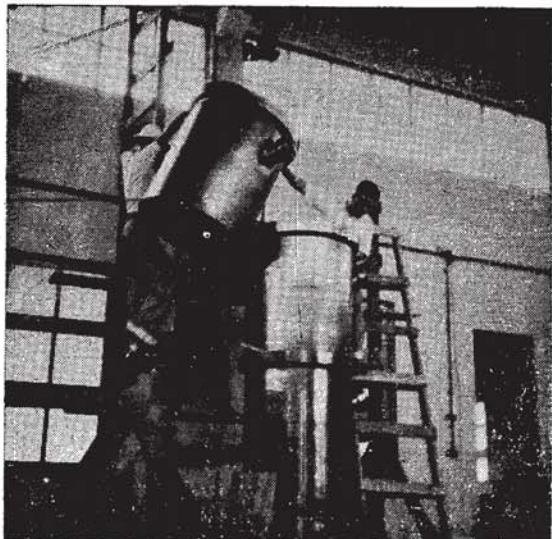

การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเคมี

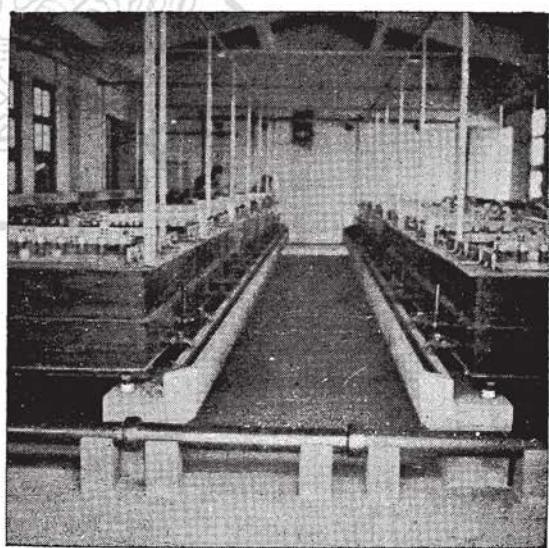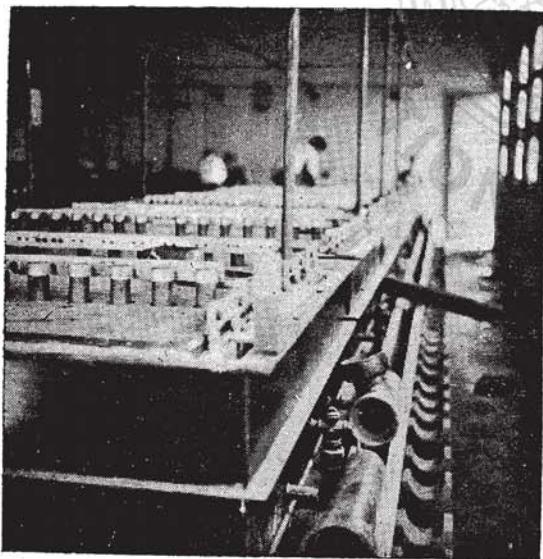

การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานทำโคลรีน


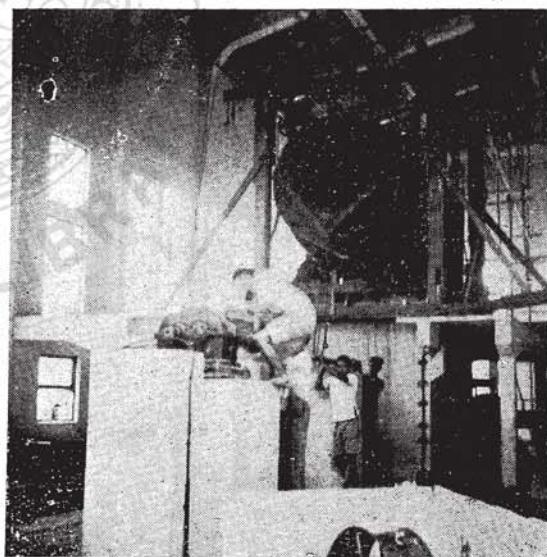
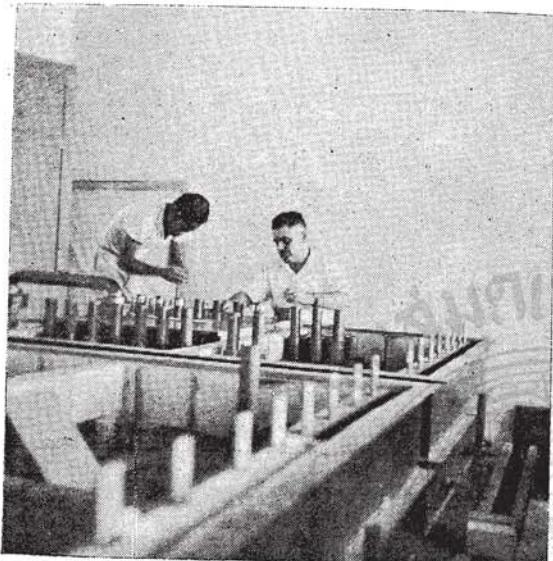


การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานทำโซดากลับคุณ

โรงกรองน้ำ





บ่ออนามัยน้ำ

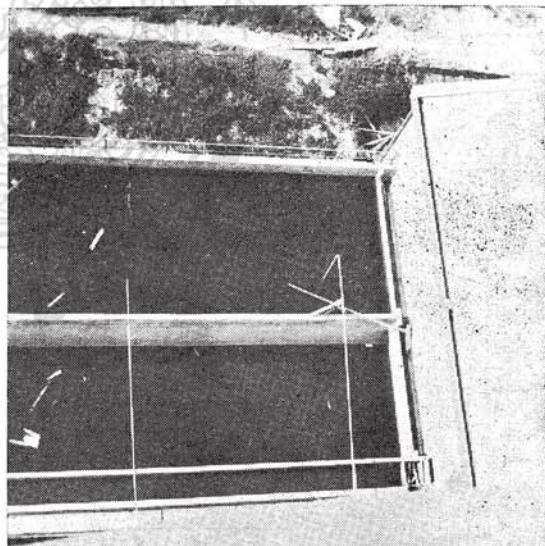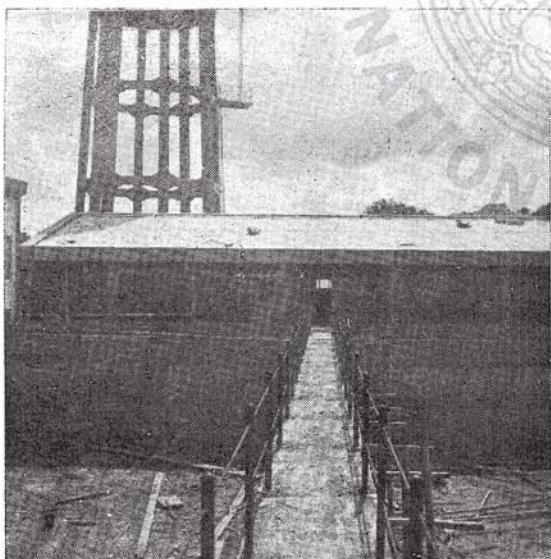
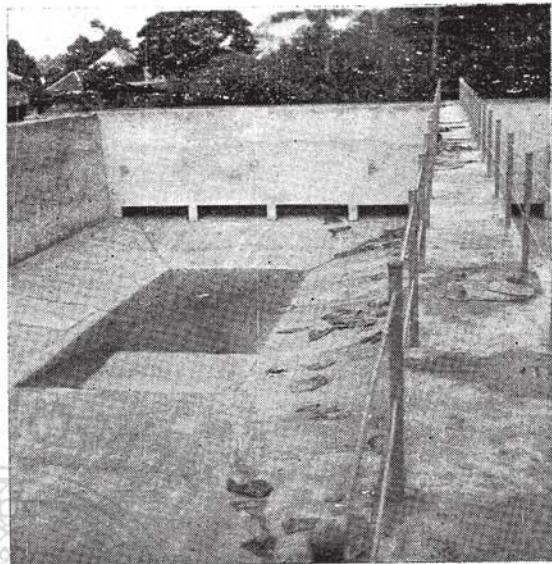


บ่ออนามัยส

ເປົດເຕີລິດ

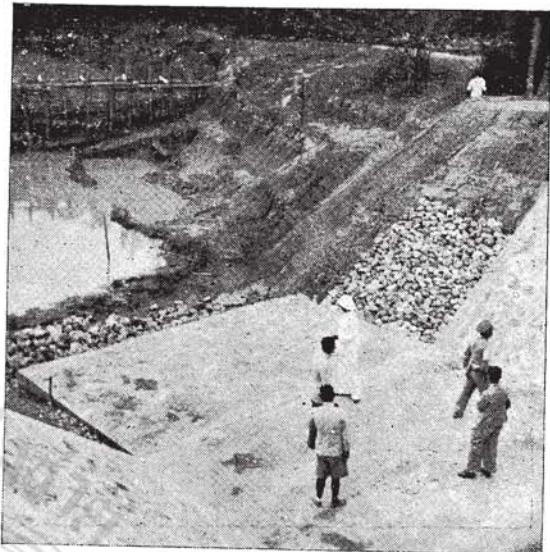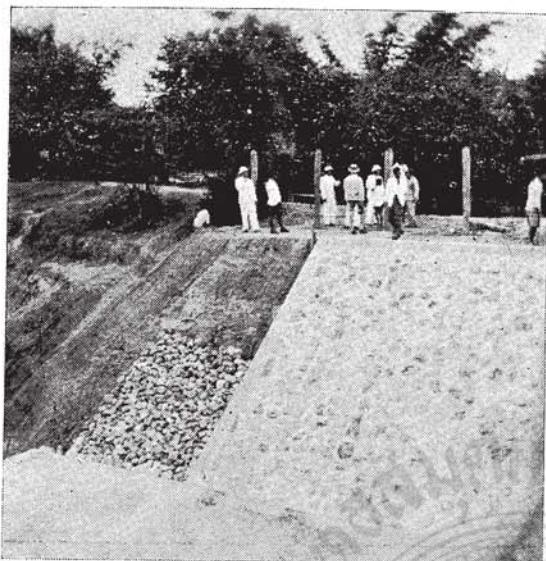



ປະຕຸນ້າທ່າຄາລເມືອສຮ້າງ

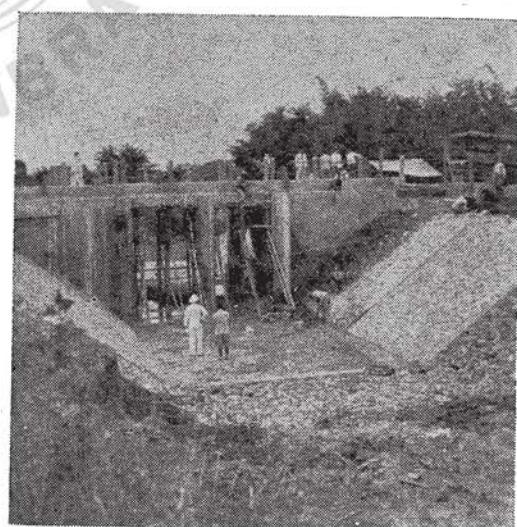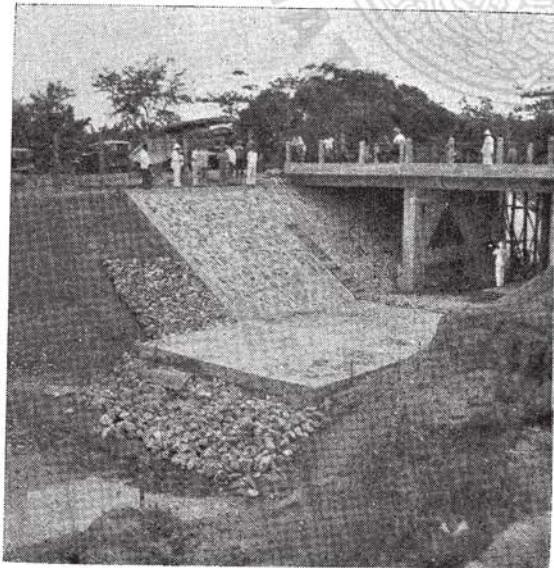





ประทุมท่าศาลาดุกน้ำชาะพัง เมือง ๓๐ ต. ค. ๘๐

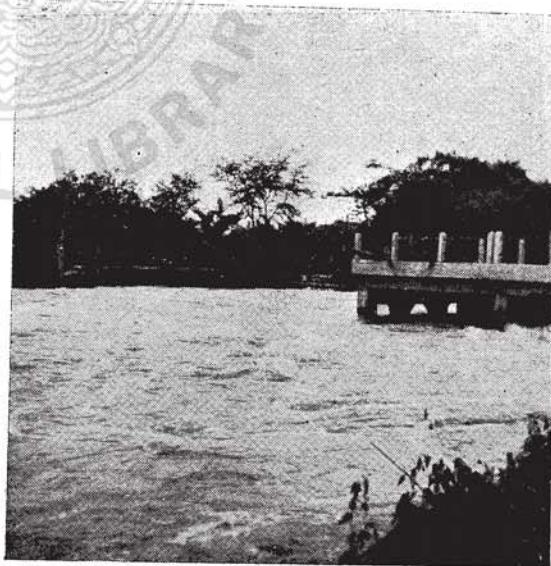

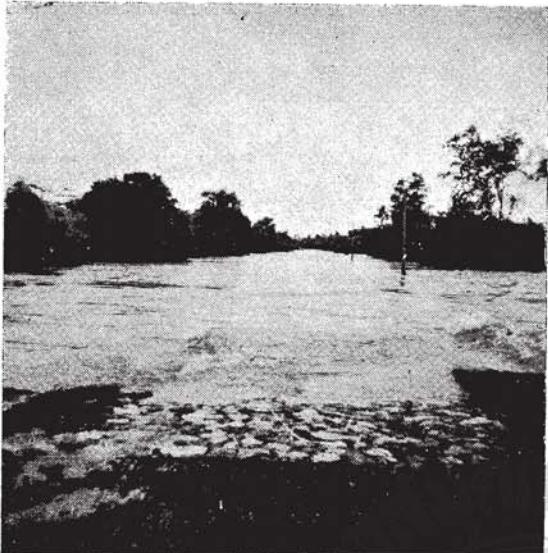


ถนนตอนท่าศาลาถูกกันน้ำเข้าและพัง เมื่อ ๑๐ สค. ๙๐


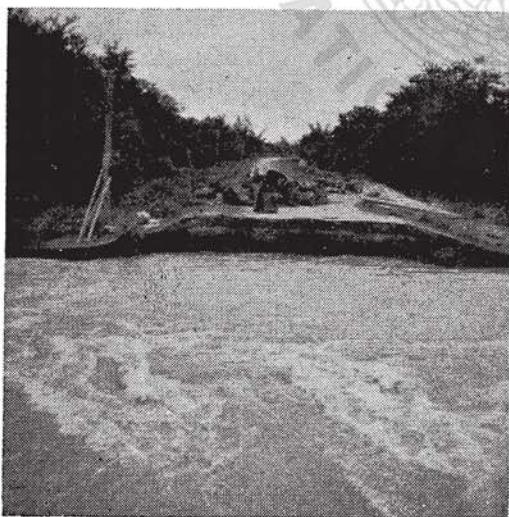


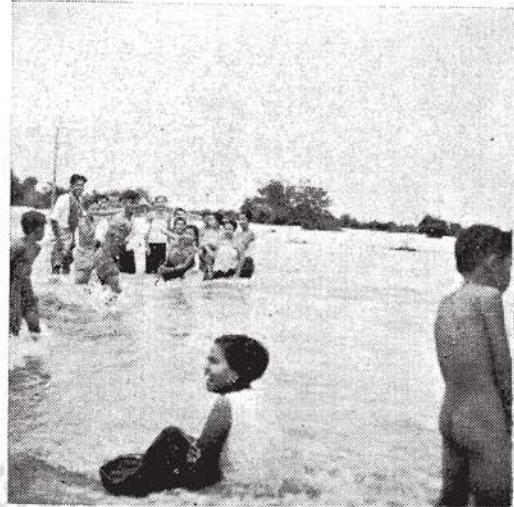

ภาพน้ำท่วมถนนตอนท่าศาลาเมื่อ ๑๐ ส.ค. ๕๐


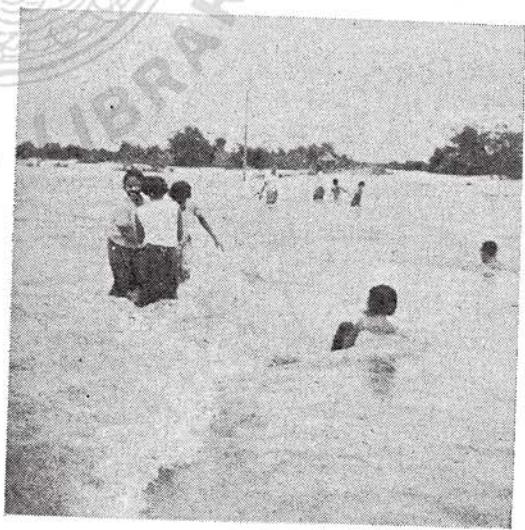


ตลาดบ้านโนีง

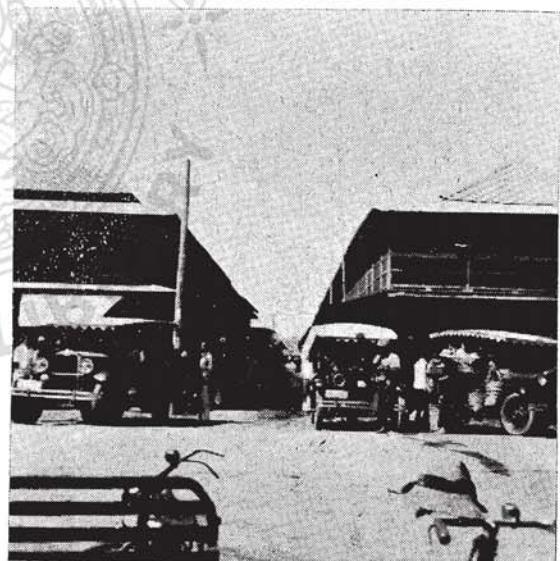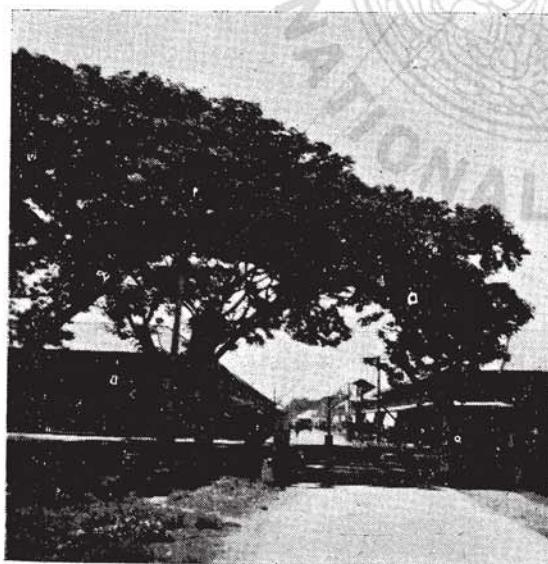



ตลาดลูกแกะ

ตลาดท่ามະกา


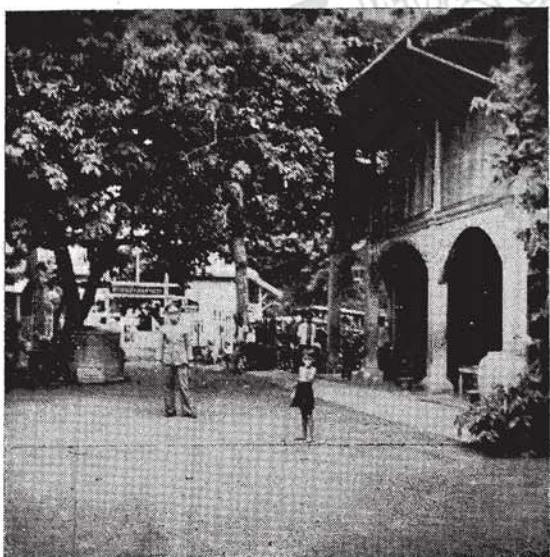
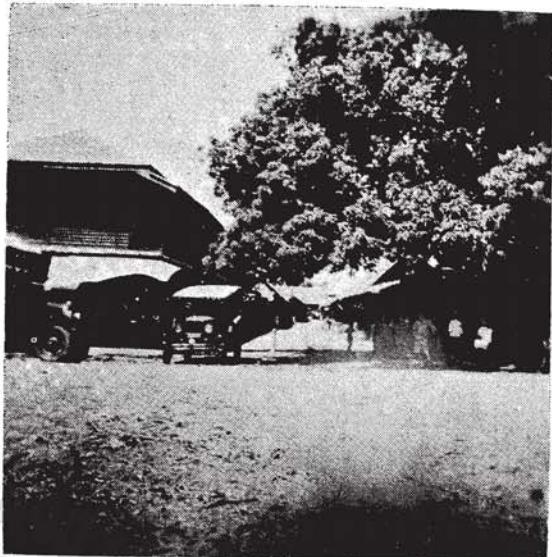




ตลาดท่าเรือ

ตลาดท่าม่วง

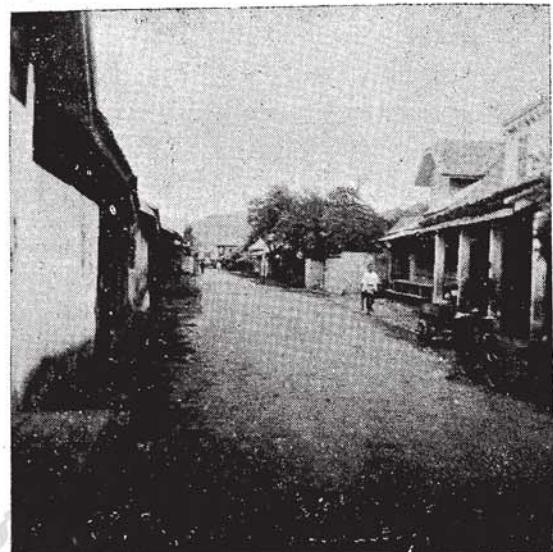
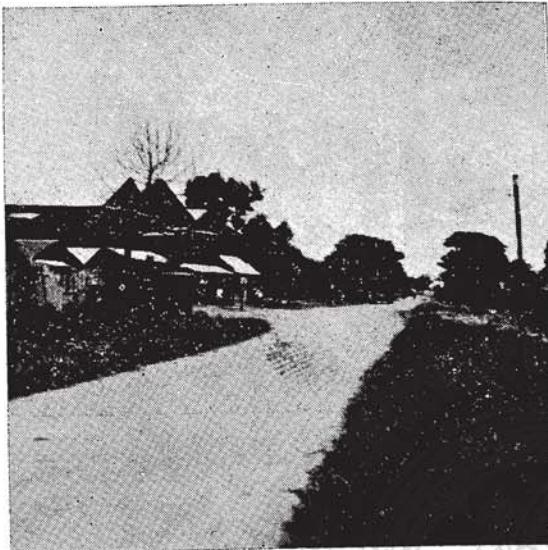



ตลาดกาญจนบุรี

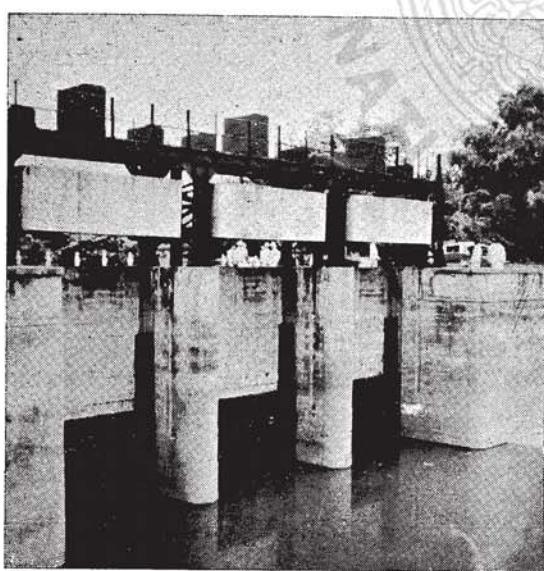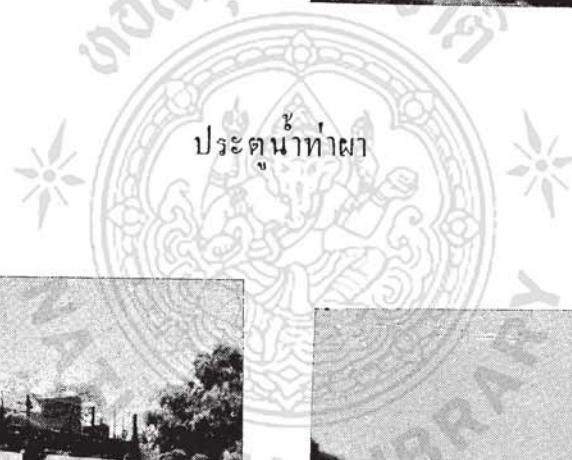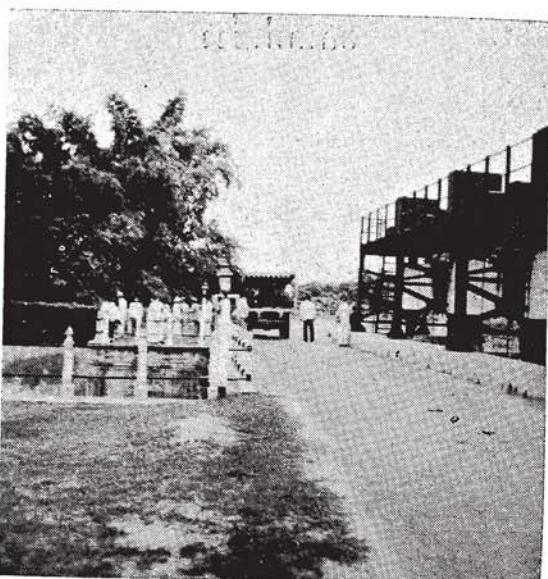

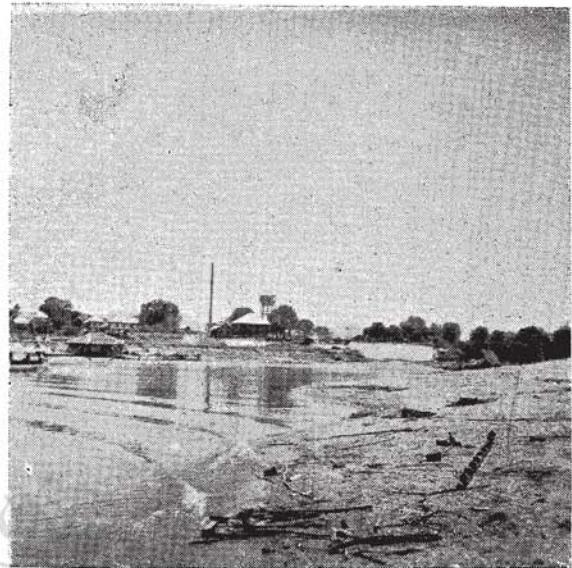
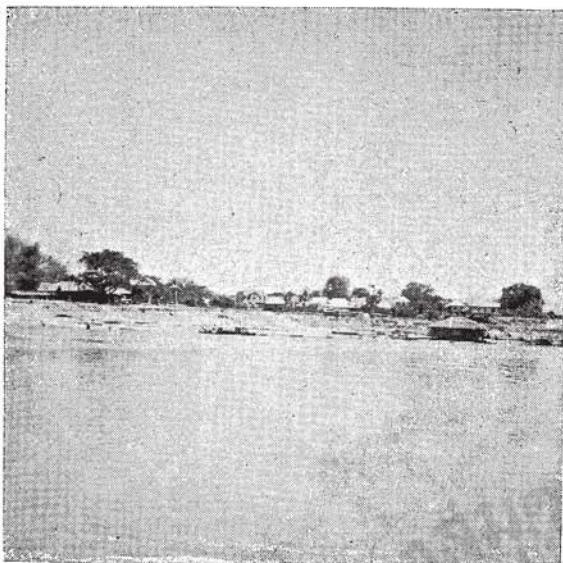


ภาพลักษณะน้ำกาญจนบุรี

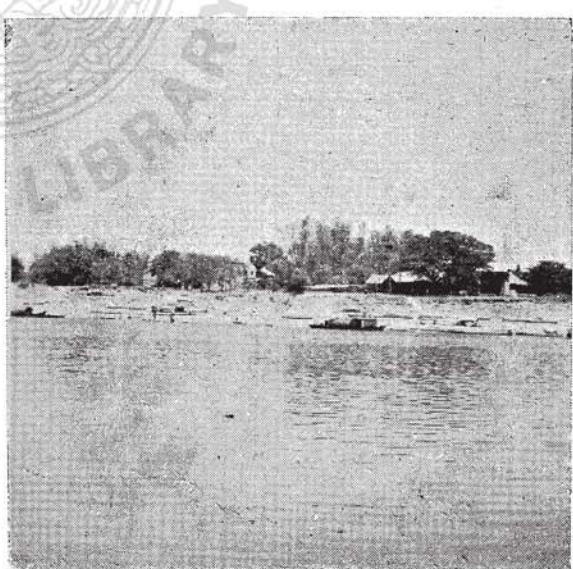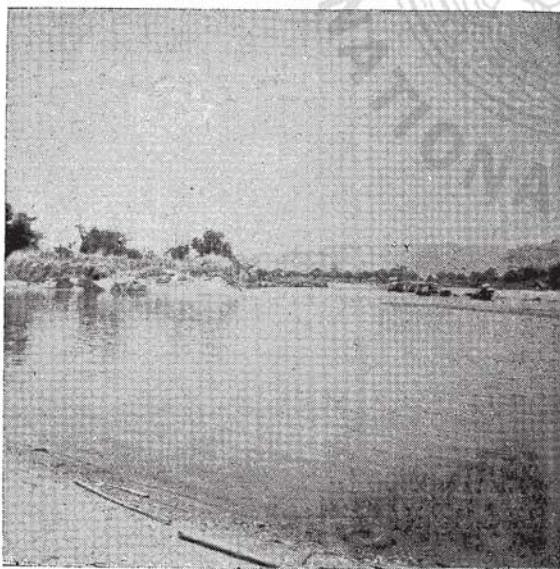

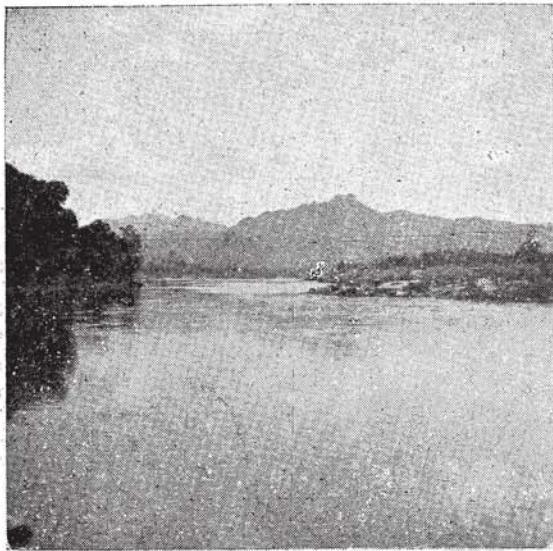

រាជក្រឹងនាកាយុជនប្រ

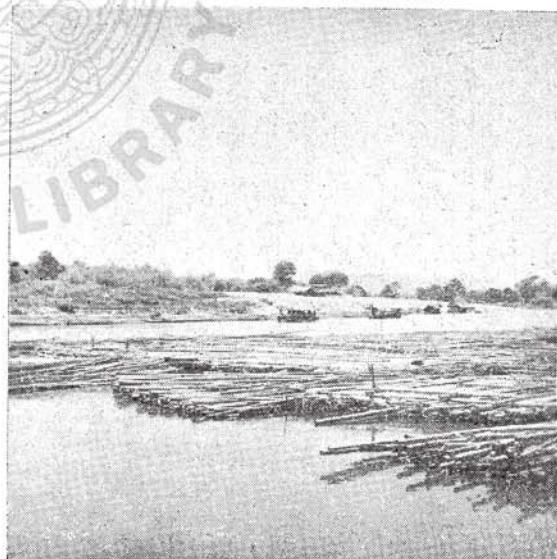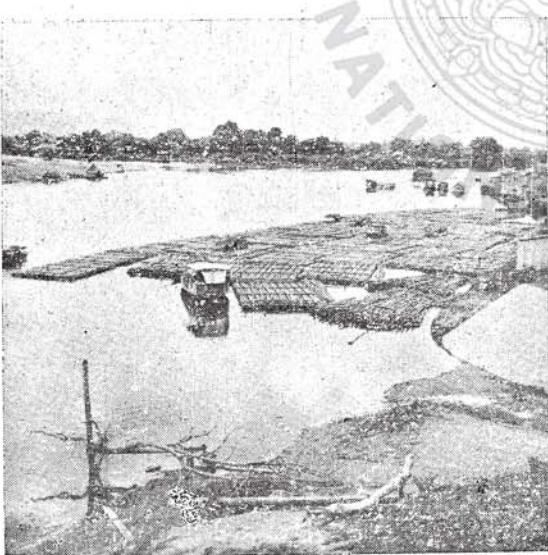



ภาพถ่ายแม่น้ำกาญจนบุรี

